



OBRA: PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA SEDE DE RORAINOPOLIS

TRECHO: BAIRRO VITÓRIA

SUBTRECHO: RUAS E AVIDAS

ESTUDO TECNOLÓGICO DE SOLO

PROJETO	DE URBANIZAÇÃO NA CIDADE DE RORAINÓPOLIS / RR
ESTUDO	SOMDAGEM DE SUBLEITO DE JAZIDA
VERIFICAÇÃO DOS ENSAIOS	ENSAIO DE PENEIRAMENTO DNER-ME 080 ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ DNER-ME 122 ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE DNER-ME 082 ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DNER-ME 216 ENSAIO DE RESISTÊNCIA (ISC) DNER-ME 049 ENSAIO DE UMIDADE HIGROSCÓPICA DNER-ME 052, 088 ENSAIO DE EXPANSÃO DNER-ME 228/94
PERÍODO	JUNHO /2025

ALEX FABIAN FERREIRA DA SILVA
Assinado de forma digital por ALEX FABIAN FERREIRA DA SILVA
Dados: 2025.09.22 11:07:31 -04'00'

PROJETO DE SONDAGEM DE SUBLEITO

PERIODO

JULHO 2025


RESUMO DE ENSAIOS DNIT - 108 / 2009 - ES

D / X

SOLO ARGILA ARENOSO SILTE AMARELO

SONDAGEM DE SUBLEITO

RUA	FURO Nº	POSICÃO	PROFUND. (m)	GRANULOMETRIA											ENSAIO DE LABORATÓRIO				CAMPO			
				ÍNDICES FÍSICOS (%)		MATERIAL QUE PASSA NAS PENEIRAS (%)								CLASSIFICAÇÃO		COMPACTAÇÃO				COMPACTAÇÃO		
																HÓT %	D.MAX kg/cm³	EXP. %	ISC %	H.NAT %	D.MAX kg/cm³	G.COMP. %
				LL	IP	2"	1"	3/8"	Nº 4	Nº 10	Nº 40	Nº 200	IG (%)	HRB								
RUA AYRTO SENA	1	LIX	0,75	29,7	10,8	100	100	100	100	99	98	46	11	0	A2-6	11,5	1,784	0,10	15,1			
RUA A	2	LIX	0,80	31,2	10,3	100	100	100	100	99	98	87	46	2	A4	12,2	1,803	0,11	13,0			
RUA B	3	LIX	0,80	30,2	10,7	100	100	100	99	98	67	26	0	A2-6	11,1	1,752	0,13	12,8				
RUA C	4	LIX	0,82	34,9	13,7	100	100	100	99	97	81	39	2	A6	12,6	1,877	0,17	19,7				
RUA D	5	LIX	0,75	32,8	11,5	100	100	100	100	99	58	16	0	A2-6	11,3	1,742	0,10	13,3				
RUA E	6	LIX	0,78	31,1	12,5	100	100	100	100	99	57	37	1	A6	11,2	1,826	0,09	11,3				
RUA F	7	LIX	0,71	29,7	9,5	100	100	100	100	99	65	13	0	A2-4	11,7	1,716	0,11	13,8				
RUA G	8	LIX	0,75	29,0	11,8	100	100	100	100	100	68	12	0	A2-6	12,5	1,676	0,10	16,7				
RUA H	9	LIX	0,50	30,7	10,1	100	100	100	100	100	60	28	0	A2-4	11,1	1,887	0,11	11,1				
RUA I	10	LIX	0,61	30,5	10,4	100	100	100	98	96	86	40	1	A4	11,6	1,841	0,10	16,4				
RUA J	11	LIX	0,78	32,7	11,7	100	100	100	99	89	53	25	0	A2-6	10,8	1,854	0,08	15,8				
RUA K 1	12	LIX	0,85	32,5	11,4	100	100	100	100	99	59	29	0	A2-6	11,2	1,825	0,12	11,1				
RUA K 2	13	LIX	0,68	30,2	9,1	100	100	100	99	98	45	14	0	A2-4	10,1	1,774	0,10	13,7				
RUA L 1	14	LIX	0,75	30,8	10,4	100	100	100	99	95	76	29	0	A2-4	11,0	1,874	0,10	14,4				
RUA L 2	15	LIX	0,87	30,4	9,6	100	100	100	100	99	43	15	0	A2-4	9,9	1,760	0,09	11,4				
RUA M	16	LIX	0,80	33,7	11,1	100	100	100	100	93	60	35	0	A2-6	12,1	1,624	0,14	14,3				
RUA N	17	LIX	0,55	38,7	15,4	100	100	100	100	99	59	13	0	A2-6	11,5	1,772	0,10	7,6				
RUA O	18	LIX	0,75	39,8	14,6	100	100	100	100	100	74	16	0	A2-6	10,7	1,829	0,15	16,0				
RUA P	19	LIX	0,70	30,6	11,2	100	100	100	100	99	78	43	2	A6	11,2	1,848	0,12	11,8				
RUA Q	20	LIX	0,85	31,6	10,4	100	100	100	99	98	61	22	0	A2-4	11,0	1,802	0,08	13,5				
RUA R	21	LIX	0,75	30,4	11,9	100	100	100	99	97	58	21	0	A2-6	11,2	1,788	0,12	13,0				
RUA S	22	LIX	0,60	26,6	9,9	100	100	100	99	98	78	30	0	A2-4	10,7	1,821	0,14	14,5				
RUA T	23	LIX	0,70	31,6	11,1	100	100	100	99	98	68	14	0	A2-6	12,5	1,733	0,10	11,6				
RUA U	24	LIX	0,86	32,8	11,7	100	100	100	100	99	70	15	0	A2-6	11,2	1,865	0,08	10,3				
RUA V	25	LIX	0,70	28,9	11,3	100	100	100	100	99	79	19	0	A2-6	11,3	1,683	0,12	15,6				
RUA W	26	LIX	0,62	29,8	9,9	100	100	100	100	99	77	29	0	A2-4	9,6	1,886	0,10	17,3				
RUA Y	27	LIX	0,75	31,2	10,4	100	100	100	100	99	75	15	0	A2-4	9,9	1,773	0,08	15,3				
											</											

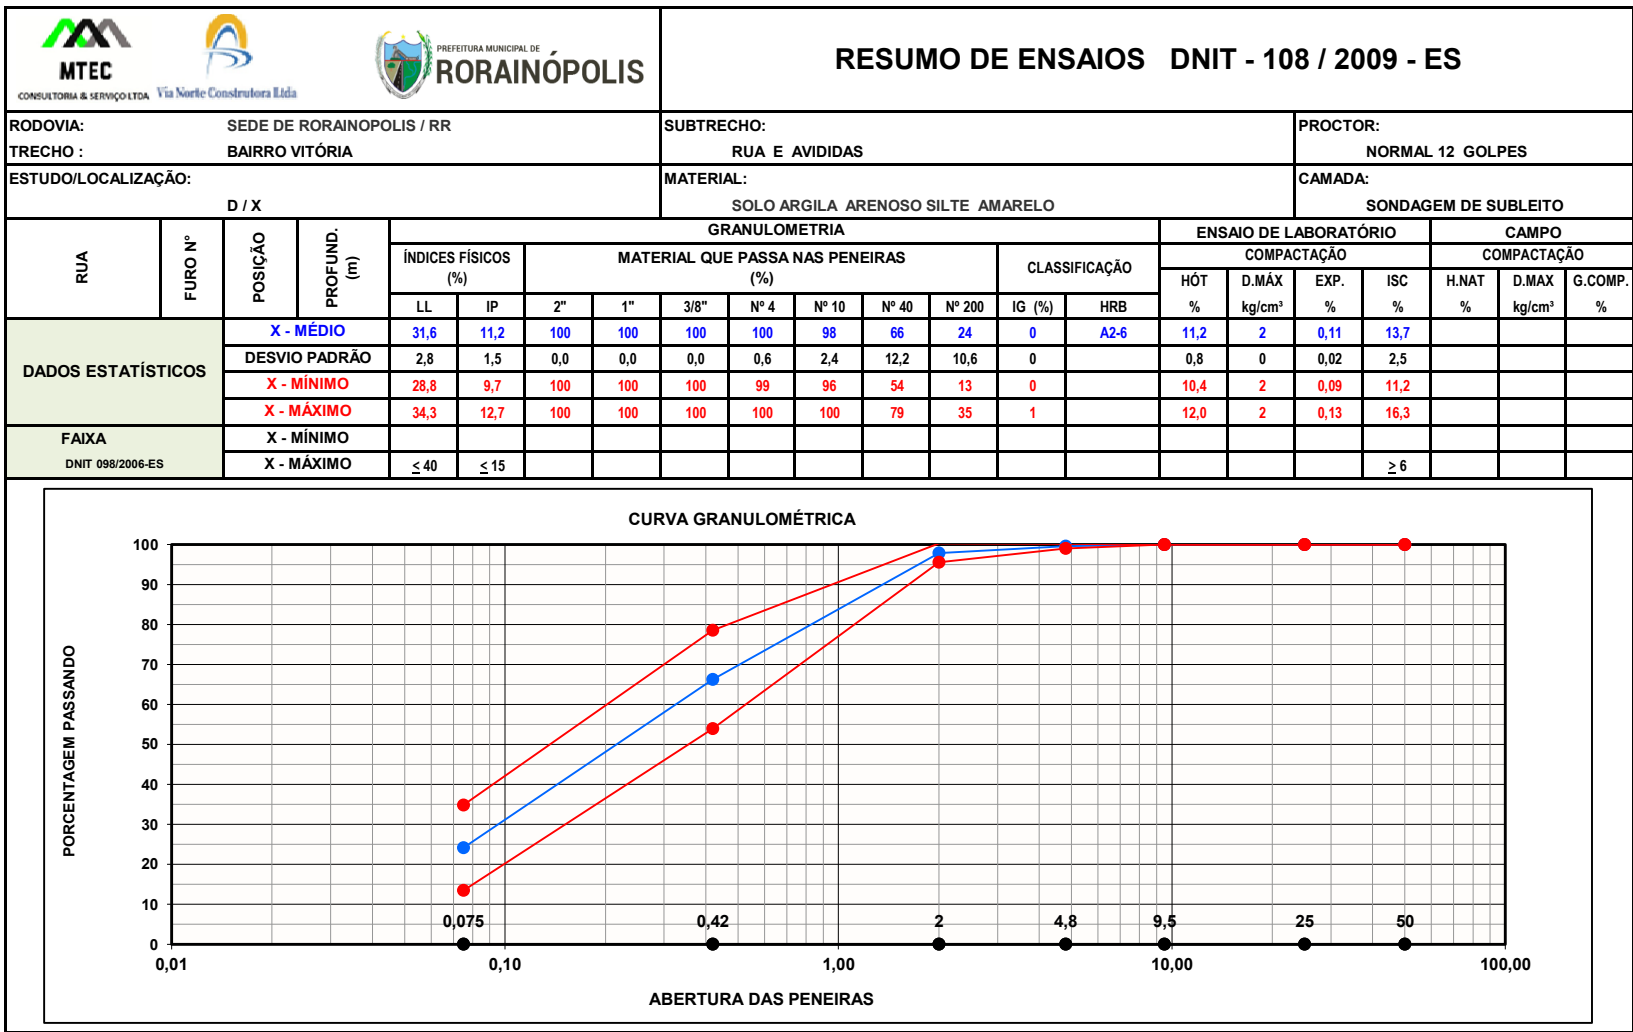



CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DNIT- 138/2010 - ES

E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE

RORAINÓPOLIS

Folha:


Única

Data:


07/07/2025

Rodovia: SEDE DE RORAINÓPOLIS		Trecho: BAIRRO VITÓRIA		Sub-trecho: AVENIDA . AYRTO SENA			Registro: SONDAGEM DE	
Estaca:	Furo: 28	Profundidade: 0,75		Material: Argila Silte Arenoso Amarela			SUBLEITO	
% Mat. Ret. # N° 4: 0,00%	Próctor: NORMAL		Golpes: 12		Operador: FERNANDO		Lado L / X	
Item	Unid.	1	2	3	4	5	6	Umidade Higroscópica
Cápsula N°	-							75 15
Peso Bruto Úmido	g							67,35 65,27
Peso Bruto Seco	g							66,00 64,00
Peso da Água	g							1,35 1,27
Peso da Cápsula	g							19,11 20,59
Peso do Solo Seco	g							46,89 43,41
Umidade	%							2,88% 2,93%
Umidade calculada	%	5,0%	7,1%	9,2%	11,2%	13,3%		2,9%
Água Total	g	294	414	534	654	774		Peso do Material
Água Adicionada	g	125	245	365	485	605		6.000,00
% Água Adicionada	%	2,08%	4,08%	6,08%	8,08%	10,08%		P. Mat. Seco Peso Água
Peso Bruto Úmido	g	7.790	7.740	8.690	8.075	8.050		5.831 169
Peos do Solo Úmido	g	3.390	3.655	4.022	3.877	3.825		Moldes
Dens. Solo Úmido	g / m³	1.623	1.822	1.933	1.933	1.845		N° Peso Volume
Dens. Solo Seco	g / m³	1.545	1.701	1.771	1.738	1.629		34 4.400 2.089
Resultados:		Observações: 						9 4.085 2.006
								60 4.668 2.081
								3 4.198 2.006
								15 4.225 2.073
H. Ótima 9,5 %	Dens. Máx 1.772	ISC 15,1	Expansão 0,10					


Análise Gráfica

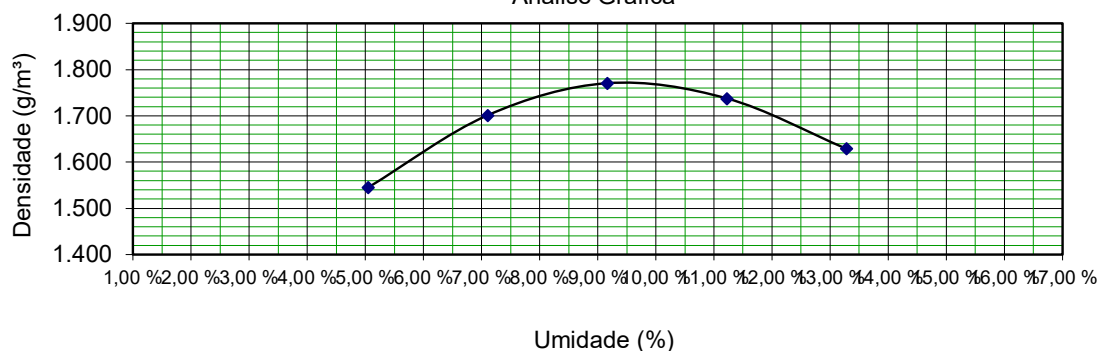

Índice de Suporte Califórnia

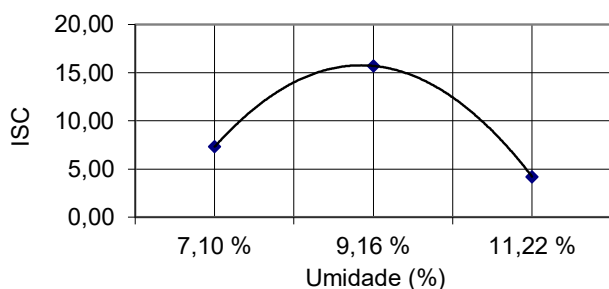

Expansão

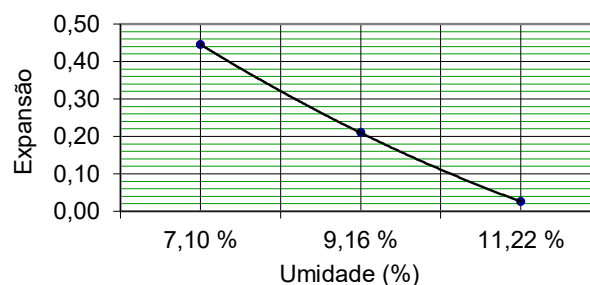



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE EXPANSÃO / I.S.C

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS

TRECHO:					DATA:				
BAIRRO VITÓRIA					07/07/2025				
RODOVIA:			SUB-TRECHO			OPERADO			
SEDE DE RORAINÓPOLIS			AVENIDA . AYRTO SENA			FERNANDO			
ESTACA:		LADO:	FURO:	PROFUNDIDADE:		GOLPES:		ESTUDO:	
0		L / X	28	0,75		12		SUBLEITO	
% MATERIAL RET. PEN. Nº 4			PROCTOR:			MATERIAL:			
0,00%			NORMAL			Argila Silte Arenoso Amarela			




ENSAIO DE EXPANSÃO NORMA DNER - ME 049/94

MOLDE Nº 9		ALTURA 114,5			MOLDE Nº 60		ALTURA 114,5		MOLDE Nº 3		ALTURA 114,5	
DATA	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%
07/07/25	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00	0,00	0,00
												
11/07/25	09:00	1,51	0,51	0,45	09:00	1,24	0,24	0,21	09:00	1,03	0,03	0,03



ENSAIO DE I.S.C NORMA DNIT 172/2016 - ME

MOLDE Nº 9			K-PRENSA = 0,110			MOLDE Nº 60				MOLDE Nº 3			
PENETR. mm	TEMPO min	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %
0.63	0.5	10	1,10			35	3,80			5	0,50		
1.27	1.0	20	2,20			50	5,50			10	1,10		
1.90	1.5	30	3,30			70	7,70			15	1,60		
2.54	2.0	45	4,90	70	7,00	100	11,00	70	15,70	20	2,20	70	3,10
3.81	3.0	60	6,60			125	13,70			35	3,80		
5.08	4.0	70	7,70	105	7,30	140	15,40	105	14,70	40	4,40	105	4,20
6.35	5.0	85	9,30			160	17,60			55	6,00		
7.62	6.0	105	11,50			200	22,00			70	7,70		
8.89	7.0	115	12,60			230	25,30			85	9,30		
10.16	8.0	125	13,70			255	28,00			100	11,00		
12.70	10.0	135	14,80			270	29,60			110	12,10		

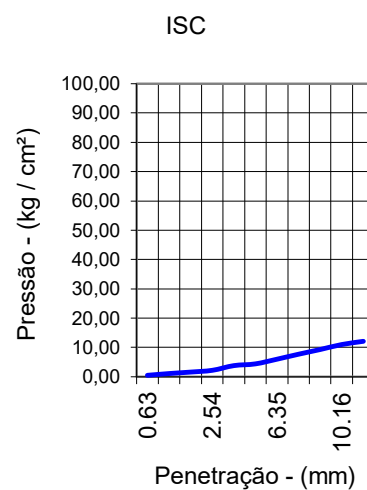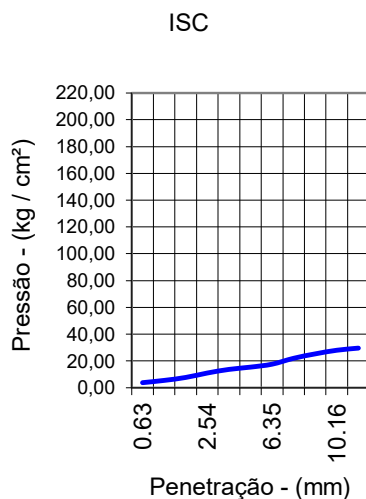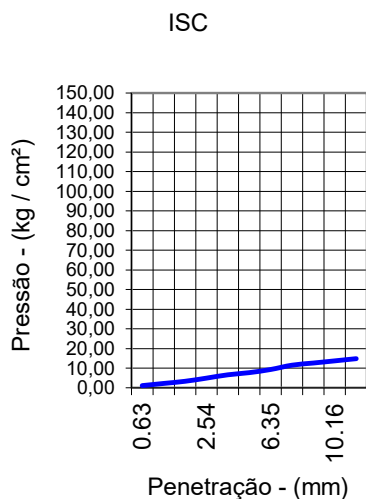

RESUMO


DENSIDADE MÁXIMA: 1772 g / cm³	ISC : 15,10 %
ÚMIDADE ÓTIMA: 9,53 %	EXPANSÃO : 0,10 %

Rodovia:	SEDE DE RORAINÓPOLIS	Profundidade:	0,75
Trecho:	BAIRRO VITÓRIA	Furo :	28
Procedência:	SONDAGEM DE	Estaca:	0
Camada:	SUBLEITO	OPERADO	FERNANDO
		Data:	07/07/25

UMIDADE HIDROSCÓPICA			DISCRIMINAÇÃO		AMOSTRA SECA	
					Total	Parcial
Cápsula (N°)	75	15	Cápsula (N°)		20	01
Peso Umido (g)	67,35	65,27	Peso Bruto Úmido (g)		1500,0	150,0
Peso Bruto Seco (g)	66,00	64,00	Peso Retido na # N° 10 (g)		18,40	
Peso da Água (g)	1,35	1,27	Peso Úmido Pass. na # N° 10 (g)		1481,60	
Peso da Cápsula (g)	19,11	20,59	Peso Seco Pass. na # N° 10 (g)		1439,80	
Peso do Solo Seco (g)	46,89	43,41	Peso da água (g)		41,80	
Umidade (%)	2,88	2,93	Peso da amostra Seca (g)		1458,2	145,8
Umidade Média (%)	2,9					

Peneiramento



Amostra Total	Peneiras		Peso Retido Parcial (g)	Peso que Passa Acumulado (g)	% que Passa Am. Total	FAIXA AASTHO		CONSTANTES
	Pol	mm				Mínimo	Máximo	
	2"	50,8	0,00	1458,2	100,0			K ₁ =100 = 0,069
	1 1/2"	38,1	0,00	1458,2	100,0			
	1"	25,4	0,00	1458,2	100,0			K ₂ = 4 = 0,679
	3/8"	9,5	0,00	1458,2	100,0			
	4	4,8	7,20	1451,0	100,0			
	10	2,0	11,20	1439,8	99,0			
Amostra Parcial	40	0,42	78,60	67,2	46,0			
	200	0,074	51,63	15,6	11,0			

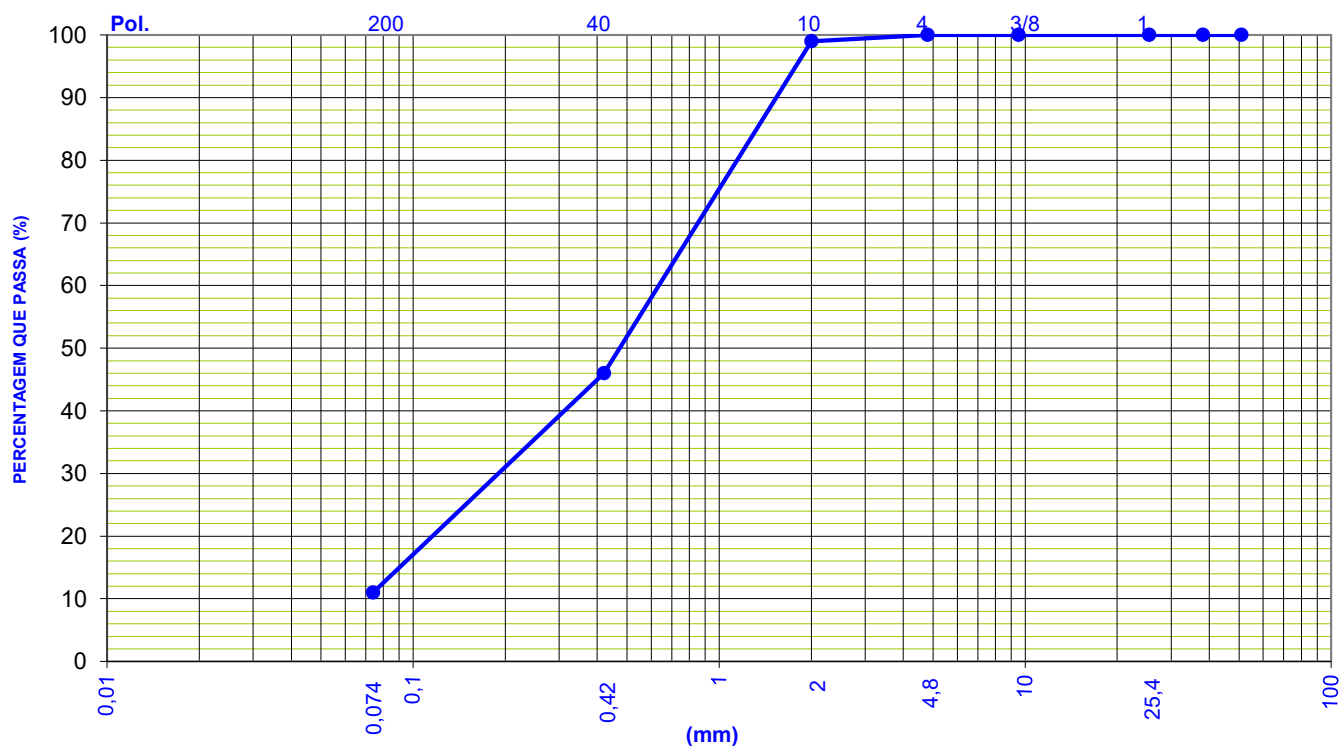

Resumo Granulometria (%)

Pedregulho (> 4,8 mm)	0,0
Areia Grossa (4,8 - 2,0 mm)	1,0
Areia Média (2,0 - 0,42 mm)	53,0
Areia Fina (0,42 - 0,074 mm)	35,0
Passando (0,074 mm)	11,0
Total	100,0

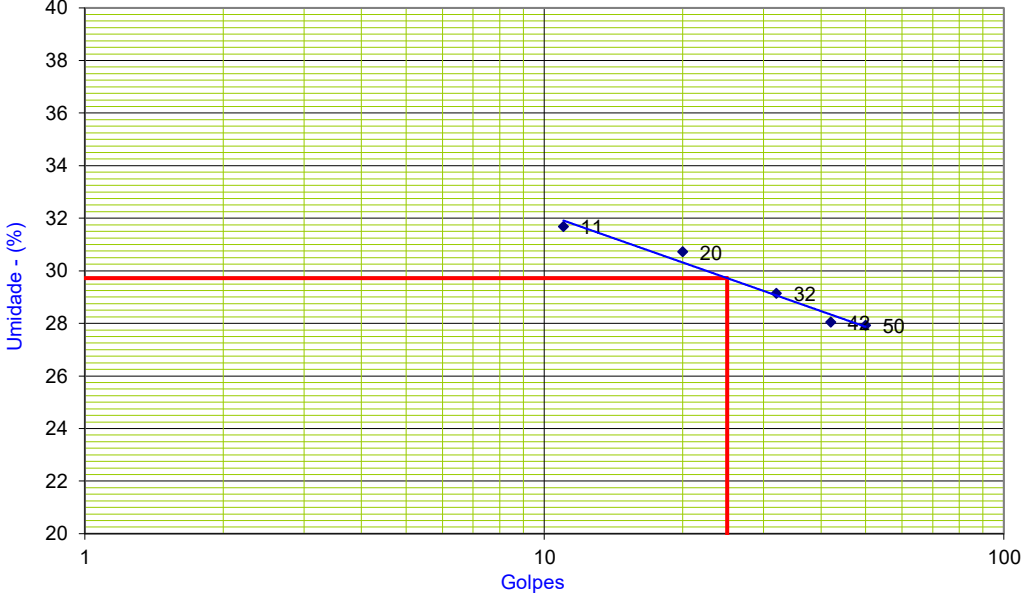

  MTEC CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda		LIMITES FÍSICOS  PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS					
Rodovia: SEDE DE RORAINÓPOLIS		Profund.: 0,75		OPERADO FERNANDO			
Trecho: BAIRRO VITÓRIA		Furo : 28					
Procedência: SONDAGEM DE		Estaca: 0					
Camada: SUBLEITO		Data: 08/07/2025		LADO L / X			
LIMITE DE LIQUIDEZ NORMA DNER ME - 122/94							
Cápsula	N.º	22	52	61	80	01	
Golpes	g	11	20	32	42	50	
Peso Bruto Úmido	g	33,10	30,75	32,58	30,00	31,94	
Peso Bruto Seco	g	26,60	25,43	26,60	24,72	26,65	
Peso da Cápsula	g	6,08	8,11	6,08	5,89	7,70	
Peso da Água	g	6,50	5,32	5,98	5,28	5,29	
Peso do Solo Seco	g	20,52	17,32	20,52	18,83	18,95	
Umidade	%	31,68	30,72	29,14	28,04	27,92	
LIMITE DE PLASTICIDADE NORMA DNER ME - 082/94							
Cápsula	N.º	32	85	91	27	25	
Peso Bruto Úmido	g	5,18	6,88	6,94	7,03	5,40	
Peso Bruto Seco	g	4,89	6,57	6,65	6,88	5,06	
Peso da Cápsula	g	3,32	4,90	5,11	6,10	3,31	
Peso da Água	g	0,29	0,31	0,29	0,15	0,34	
Peso do Solo Seco	g	1,57	1,67	1,54	0,78	1,75	
Umidade	%	18,47	18,56	18,83	19,23	19,43	
Índice de Plasticidade LL= 29,7% LP = 18,9% IP= 10,8%		Limite de Liquidez 					



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA. Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DNIT- 138/2010 - ES

E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS

Folha:


Única

Data:


07/07/2025

Rodovia:		Trecho:		Sub-trecho:		Registro:	
SEDE DE RORAINÓPOLIS		BAIRRO VITÓRIA		RUA A		SONDAGEM DE	
Estaca:	Furo:	Profundidade:		Material:		SUBLEITO	
	1	0,80		Argila Arenoso Silte Amarela			
% Mat. Ret. # N° 4:	Próctor:		Golpes:		Operador:		Lado
1,00%	NORMAL		12		FERNADO		L / X
Item	Unid.	1	2	3	4	5	6
Cápsula N°	-						
Peso Bruto Úmido	g						
Peso Bruto Seco	g						
Peso da Água	g						
Peso da Cápsula	g						
Peso do Solo Seco	g						
Umidade	%						
Umidade calculada	%	8,9%	10,5%	12,0%	13,6%	15,1%	
Água Total	g	521	611	701	791	881	
Água Adicionada	g	360	450	540	630	720	
% Água Adicionada	%	6,00%	7,50%	9,00%	10,50%	12,00%	
Peso Bruto Úmido	g	7.740	7.950	8.320	8.270	8.690	
Peos do Solo Úmido	g	3.615	3.865	4.213	4.035	3.976	
Dens. Solo Úmido	g / m³	1.729	1.927	2.019	2.011	1.903	
Dens. Solo Seco	g / m³	1.587	1.744	1.802	1.771	1.654	
Resultados:		Observações:					
H. Ótima	Dens. Máx	ISC	Expansão				
12,2 %	1.803	13,0	0,11				


Análise Gráfica

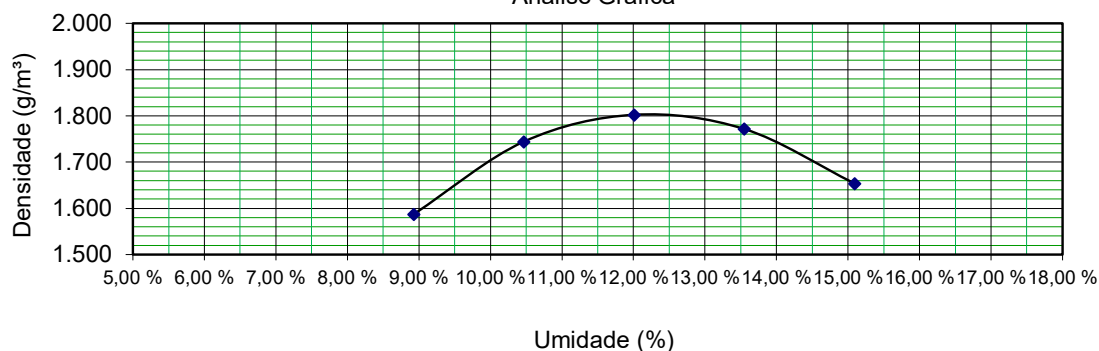

Índice de Suporte Califórnia

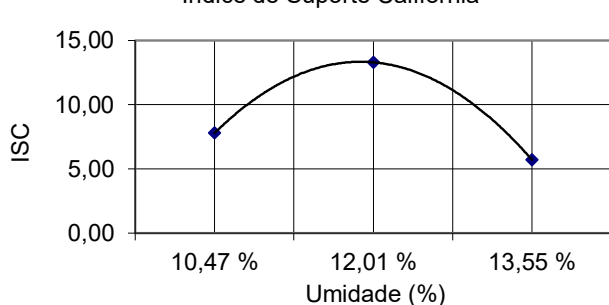

Expansão

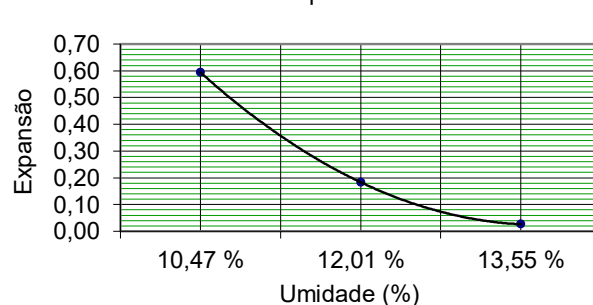



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda

ENSAIO DE EXPANSÃO / I.S.C



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS




TRECHO						DATA:					
BAIRRO VITÓRIA						07/07/2025					
RODOVIA:			SUBTRECHO:			OPERADO:					
SEDE DE RORAINÓPOLIS			RUA A			FERNADO					
ESTACA:		LADO:	FURO:	PROFUNDIDADE:	GOLPES:	ESTUDO:					
0		L / X	1	0,80	12	SUBLEITO					
% MATERIAL RET. PEN. Nº 4			PROCTOR:			MATERIAL:					
1,00%			NORMAL			Argila Arenoso Silte Amarela					

ENSAIO DE EXPANSÃO NORMA DNER - ME 049/94

MOLDE Nº		ALTURA			MOLDE Nº		ALTURA			MOLDE Nº		ALTURA		
21		114,5			23		114,5			61		114,5		
DATA	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA
07/07/25	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00
11/07/25	09:00	1,68	0,68	0,59	09:00	1,21	0,21	0,18	09:00	1,03	0,03	0,03	09:00	1,03

ENSAIO DE I.S.C NORMA DNIT 172/2016 - ME

MOLDE Nº			K-PRENSA =				MOLDE Nº				MOLDE Nº			
21			0,110				23				61			
PENETR. mm	TEMPO min	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	
0.63	0.5	15	1,60			50	5,50			5	0,50			
1.27	1.0	25	2,70			60	6,60			10	1,10			
1.90	1.5	35	3,80			70	7,70			15	1,60			
2.54	2.0	40	4,40	70	6,30	85	9,30	70	13,30	25	2,70	70	3,90	
3.81	3.0	60	6,60			105	11,50			35	3,80			
5.08	4.0	75	8,20	105	7,80	125	13,70	105	13,00	55	6,00	105	5,70	
6.35	5.0	90	9,90			150	16,50			65	7,10			
7.62	6.0	115	12,60			180	19,80			80	8,80			
8.89	7.0	125	13,70			205	22,50			105	11,50			
10.16	8.0	140	15,40			230	25,30			110	12,10			
12.70	10.0	155	17,00			250	27,50			120	13,20			

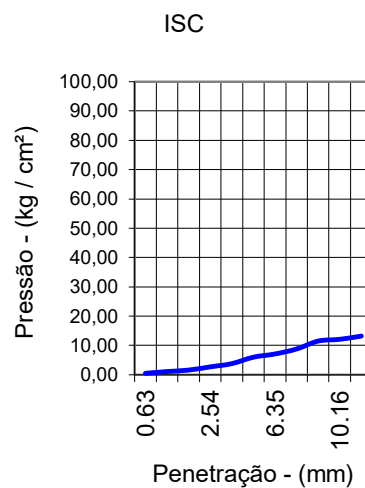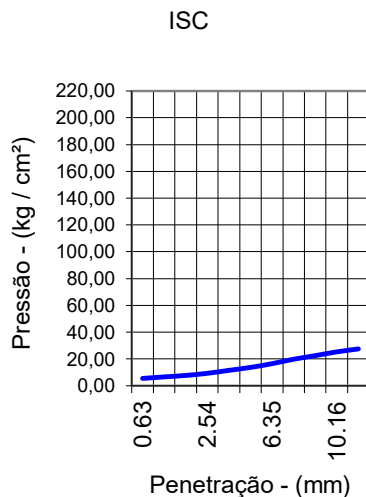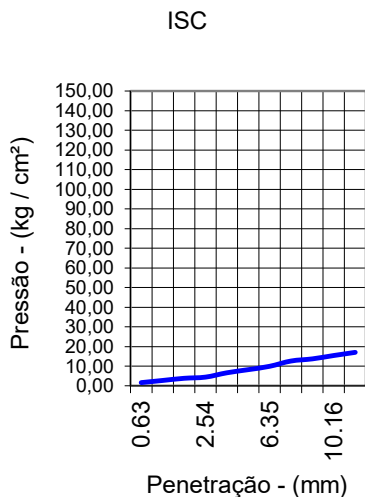

RESUMO

DENSIDADE MÁXIMA:	1803 g / cm³	ISC :	12,98 %
ÚMIDADE ÓTIMA:	12,25 %	EXPANSÃO :	0,11 %



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda

Análise Granulométrica NORMA DNER ME -080/94 (Simples)




PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

Rodovia:	SEDE DE RORAINÓPOLIS	Profundidade:	0,80
Trecho:	BAIRRO VITÓRIA	Furo :	1
Procedência:	SONDAGEM DE	Estaca:	0
Camada:	SUBLEITO	Operado:	FERNANDO
		Data:	07/07/25

UMIDADE HIDROSCÓPICA		DISCRIMINAÇÃO		AMOSTRA SECA	
				Total	Parcial
Cápsula (N°)	37	44	Cápsula (N°)	58	24
Peso Umido (g)	67,10	62,65	Peso Bruto Úmido (g)	1500,0	150,0
Peso Bruto Seco (g)	65,80	61,30	Peso Retido na # N° 10 (g)	20,20	
Peso da Água (g)	1,30	1,35	Peso Úmido Pass. na # N° 10 (g)	1479,80	
Peso da Cápsula (g)	15,06	15,67	Peso Seco Pass. na # N° 10 (g)	1440,10	
Peso do Solo Seco (g)	50,74	45,63	Peso da água (g)	39,70	
Umidade (%)	2,56	2,96	Peso da amostra Seca (g)	2 1460,3	3 146,0
Umidade Média (%)	2,8				

Peneiramento

Amostra Total	Peneiras		Peso Retido Parcial (g)	Peso que Passa Acumulado (g)	% que Passa Am.Total	FAIXA AASTHO		CONSTANTES
	Pol	mm				Mínimo	Máximo	
	2"	50,8	0,00	1460,3	100,0			$K_1=100 = 0,068$ 2
	1 1/2"	38,1	0,00	1460,3	100,0			
	1"	25,4	0,00	1460,3	100,0			$K_2= 4 = 0,671$ 3
	3/8"	9,5	0,00	1460,3	100,0			
	4	4,8	0,00	1460,3	99,0			
Amostra Parcial	10	2,0	20,20	1440,1	4 98,0			
	40	0,42	16,50	129,5	87,0			
	200	0,074	61,20	68,3	46,0			

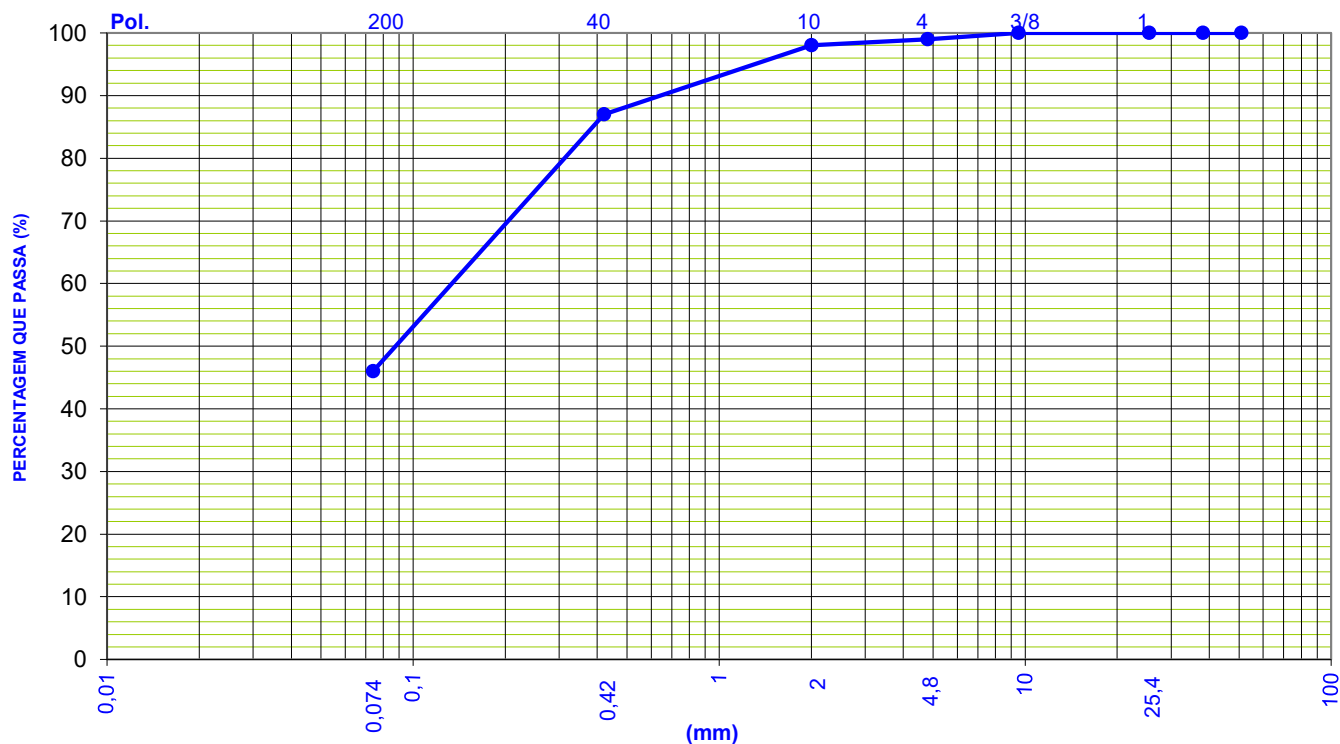

Resumo Granulometria (%)

Pedregulho (> 4,8 mm)	1,0
Areia Grossa (4,8 - 2,0 mm)	1,0
Areia Média (2,0 - 0,42 mm)	11,0
Areia Fina (0,42 - 0,074 mm)	41,0
Passando (0,074 mm)	46,0
Total	100,0




 		LIMITES FÍSICOS  PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	
Rodovia: SEDE DE RORAINÓPOLIS		Profund.: 0,80	LADO: L / X
Trecho: BAIRRO VITÓRIA		Furo : 1	
Procedência: SONDAGEM DE		Estaca: 0	
Camada: SUBLEITO		Data: 08/07/2025	OPERADO: FERNADO

LIMITE DE LIQUIDEZ NORMA DNER ME - 122/94						
Cápsula	N.º	54	21	35	98	79
Golpes	g	11	20	30	40	50
Peso Bruto Úmido	g	14,30	14,75	12,01	14,70	10,66
Peso Bruto Seco	g	12,29	12,71	10,49	12,79	9,52
Peso da Cápsula	g	6,33	6,33	5,53	6,40	5,53
Peso da Água	g	2,01	2,04	1,52	1,91	1,14
Peso do Solo Seco	g	5,96	6,38	4,96	6,39	3,99
Umidade	%	33,72	31,97	30,65	29,89	28,57

LIMITE DE PLASTICIDADE NORMA DNER ME - 082/94						
Cápsula	N.º	85	20	03	05	06
Peso Bruto Úmido	g	8,66	8,08	7,98	7,93	6,52
Peso Bruto Seco	g	8,27	7,67	7,56	7,56	6,30
Peso da Cápsula	g	6,43	5,68	5,54	5,81	5,33
Peso da Água	g	0,39	0,41	0,42	0,37	0,22
Peso do Solo Seco	g	1,84	1,99	2,02	1,75	0,97
Umidade	%	21,20	20,60	20,79	21,14	22,68

Índice de Plasticidade
LL= 31,2%
LP = 20,9%
IP= 10,3%

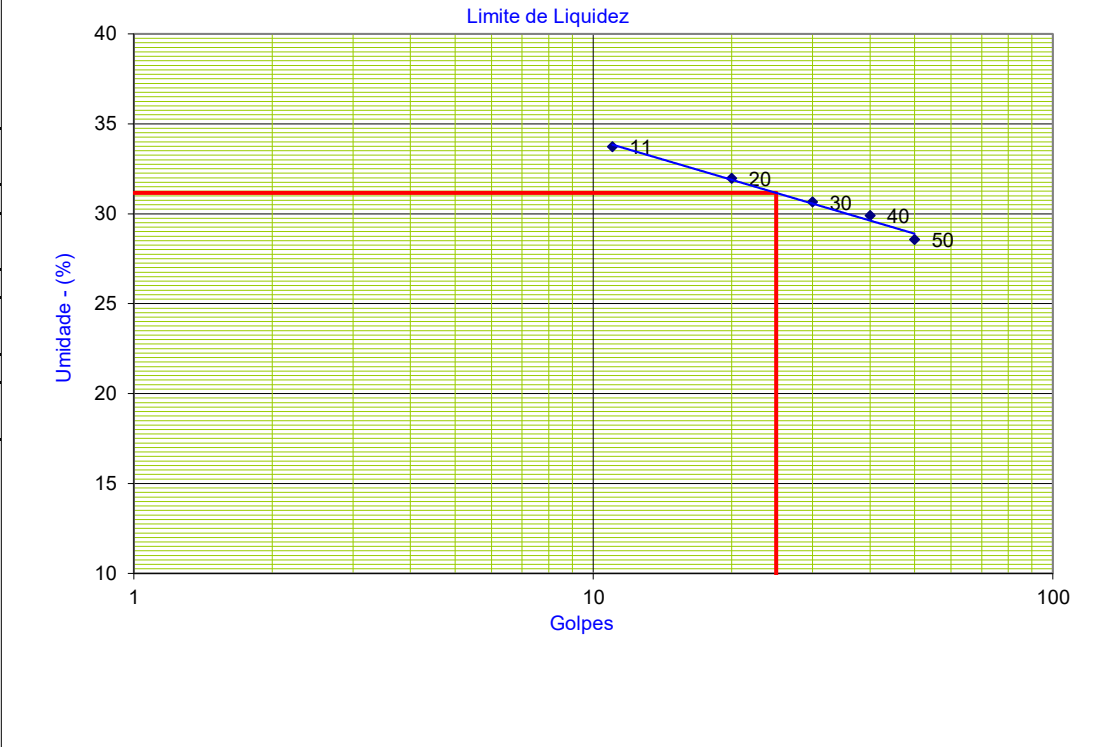



CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA



Via Norte Construtora Ltda

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DNIT- 138/2010 - ES

E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

Folha:


Única

Data:


07/07/2025

Rodovia: SEDE DE RORAINÓPOLIS		Trecho: BAIRRO VITÓRIA		Sub-trecho: RUA B		Registro: SONDAGEM DE				
Estaca:	Furo: 3	Profundidade: 0,80		Material: Argila Arenoso Amarela		SUBLEITO				
% Mat. Ret. # N° 4: 1,00%	Próctor: NORMAL		Golpes: 12		Operador: FERNADO		Lado L / X			
Item	Unid.	1	2	3	4	5	6	Umidade Higroscópica		
Cápsula N°	-							61	90	
Peso Bruto Úmido	g							67,50	65,75	
Peso Bruto Seco	g							66,00	64,00	
Peso da Água	g							1,50	1,75	
Peso da Cápsula	g							19,11	20,59	
Peso do Solo Seco	g							46,89	43,41	
Umidade	%							3,20%	4,03%	
Umidade calculada	%	6,6%	8,6%	10,7%	12,8%	14,8%		3,6%		
Água Total	g	379	499	619	739	859		Peso do Material		
Água Adicionada	g	170	290	410	530	650		6.000,00		
% Água Adicionada	%	2,83%	4,83%	6,83%	8,83%	10,83%		P. Mat. Seco	Peso Água	
Peso Bruto Úmido	g	7.790	7.754	8.120	8.250	8.060		5.791	209	
Peos do Solo Úmido	g	3.390	3.669	3.937	3.887	3.835		Moldes		
Dens. Solo Úmido	g / m³	1.623	1.829	1.938	1.938	1.850		N°	Peso	Volume
Dens. Solo Seco	g / m³	1.523	1.684	1.750	1.718	1.611		34	4.400	2.089
Resultados:				Observações:						
H. Ótima	Dens. Máx	ISC	Expansão							
11,1 %	1.752	12,8	0,13							


Análise Gráfica

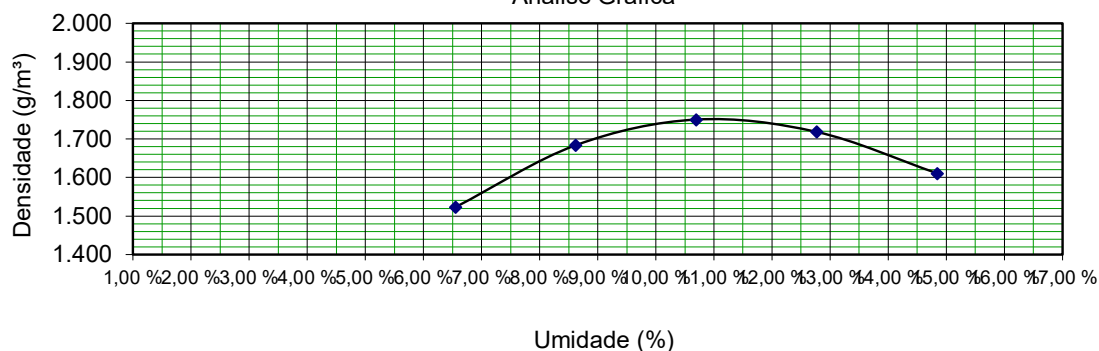

Índice de Suporte Califórnia

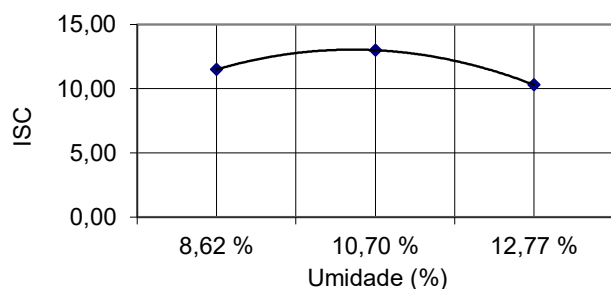

Expansão

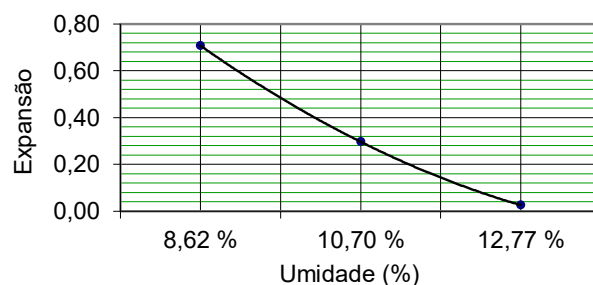



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE EXPANSÃO / I.S.C



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS




OBRA:						DATA:	
						07/07/2025	
RODOVIA:		TRECHO:				OPERADO:	
SEDE DE RORAINÓPOLIS		BAIRRO VITÓRIA				FERNADO	
ESTACA:	LADO:	FURO:	PROFUNDIDADE:	GOLPES:	ESTUDO:		
0	L / X	11	0,80	12	SUBLEITO		
% MATERIAL RET. PEN. Nº 4		PROCTOR:		MATERIAL:			
1,00%		NORMAL		Argila Arenoso Amarela			

ENSAIO DE EXPANSÃO NORMA DNER - ME 049/94

MOLDE Nº	43	ALTURA			114,5	MOLDE Nº	30	ALTURA			114,5	MOLDE Nº	29	ALTURA			114,5
DATA	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%		HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%			HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%		
07/07/25	10:00	1,00		0,00		10:00	1,00		0,00			10:00	1,00	0,00	0,00		
11/07/25	09:00	1,81	0,81	0,71		09:00	1,34	0,34	0,30			09:00	1,03	0,03	0,03		

ENSAIO DE I.S.C NORMA DNIT 172/2016 - ME

MOLDE Nº			K-PRENSA =				0,110	MOLDE Nº				30	MOLDE Nº				29
PENETR. mm	TEMPO min	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %			LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %		LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	
0.63	0.5	14	1,50					30	3,30				8	0,90			
1.27	1.0	25	2,70					45	4,90				17	1,90			
1.90	1.5	40	4,40					65	7,10				35	3,80			
2.54	2.0	65	7,10	70	10,10			80	8,80	70	12,60		45	4,90	70	7,00	
3.81	3.0	87	9,60					105	11,50				75	8,20			
5.08	4.0	110	12,10	105	11,50			125	13,70	105	13,00		98	10,80	105	10,30	
6.35	5.0	125	13,70					175	19,20				110	12,10			
7.62	6.0	145	15,90					195	21,40				125	13,70			
8.89	7.0	185	20,30					225	24,70				145	15,90			
10.16	8.0	210	23,10					250	27,50				165	18,10			
12.70	10.0	235	25,80					285	31,30				185	20,30			

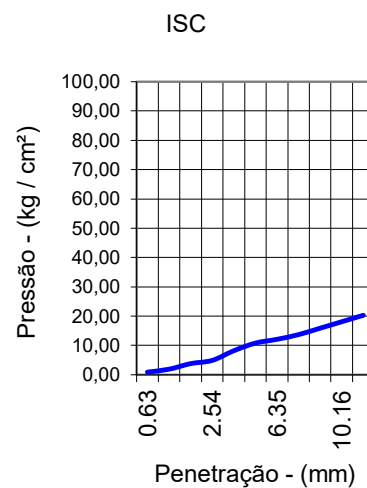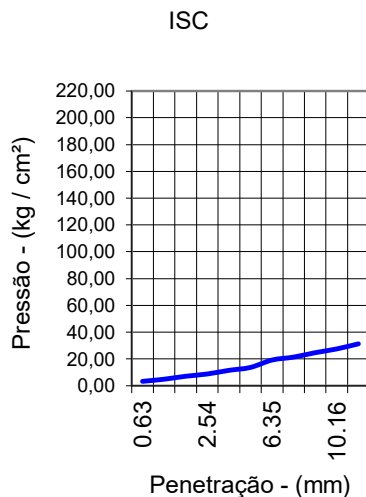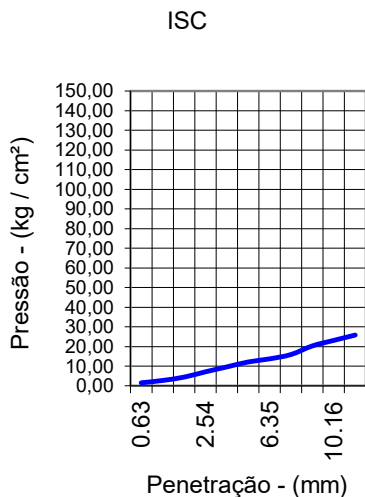

RESUMO

DENSIDADE MÁXIMA:	1752	g / cm³	ISC :	12,83	%
ÚMIDADE ÓTIMA:	11,06	%	EXPANSÃO :	0,13	%



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda

**Análise Granulométrica NORMA DNER ME -080/94 (Simples)**


PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

Rodovia:	SEDE DE RORAINÓPOLIS	Profundidade:	0,80
Trecho:	BAIRRO VITÓRIA	Furo :	3
Procedência:	SONDAGEM DE	Estaca:	0
Camada:	SUBLEITO	Operado:	FERNANDO
		Data:	07/07/25

UMIDADE HIDROSCÓPICA		DISCRIMINAÇÃO		AMOSTRA SECA	
				Total	Parcial
Cápsula (N°)	61	90	Cápsula (N°)	20	01
Peso Umido (g)	67,50	65,75	Peso Bruto Úmido (g)	1500,0	150,0
Peso Bruto Seco (g)	66,00	64,00	Peso Retido na # N° 10 (g)	33,30	
Peso da Água (g)	1,50	1,75	Peso Úmido Pass. na # N° 10 (g)	1466,70	
Peso da Cápsula (g)	19,11	20,59	Peso Seco Pass. na # N° 10 (g)	1415,50	
Peso do Solo Seco (g)	46,89	43,41	Peso da água (g)	51,20	
Umidade (%)	3,20	4,03	Peso da amostra Seca (g)	2 1448,8	3 144,8
Umidade Média (%)	3,6				



Peneiramento

Amostra Total	Peneiras		Peso Retido Parcial (g)	Peso que Passa Acumulado (g)	% que Passa Am.Total	FAIXA AASTHO		CONSTANTES
	Pol	mm				Mínimo	Máximo	
	2"	50,8	0,00	1448,8	100,0			K ₁ =100 = 0,069
	1 1/2"	38,1	0,00	1448,8	100,0			2
	1"	25,4	0,00	1448,8	100,0			K ₂ = 4 = 0,677
	3/8"	9,5	0,00	1448,8	100,0			3
	4	4,8	7,50	1441,3	99,0			
	10	2,0	25,80	1415,5	4 98,0			
Amostra Parcial	40	0,42	45,60	99,2	67,0			
	200	0,074	61,63	37,6	25,0			

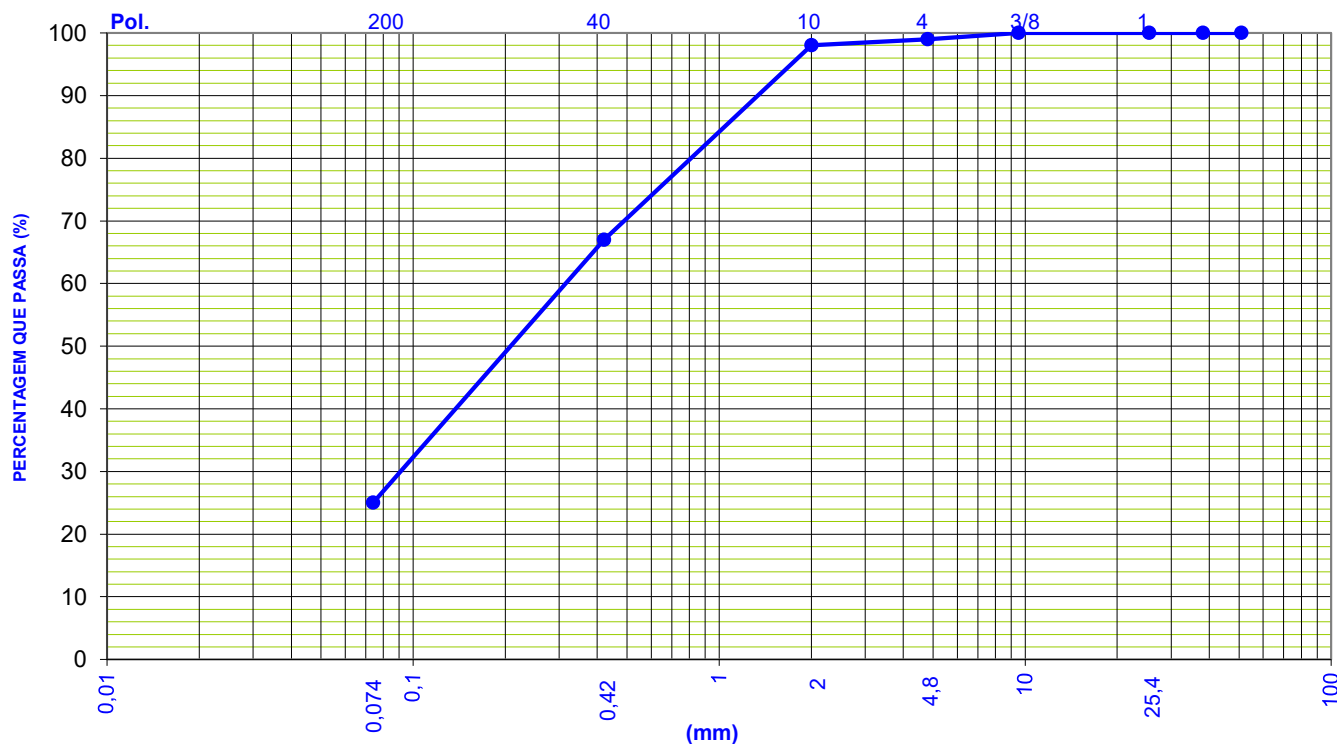**Resumo Granulometria (%)**

Pedregulho (> 4,8 mm)	1,0
Areia Grossa (4,8 - 2,0 mm)	1,0
Areia Média (2,0 - 0,42 mm)	31,0
Areia Fina (0,42 - 0,074 mm)	42,0
Passando (0,074 mm)	25,0
Total	100,0

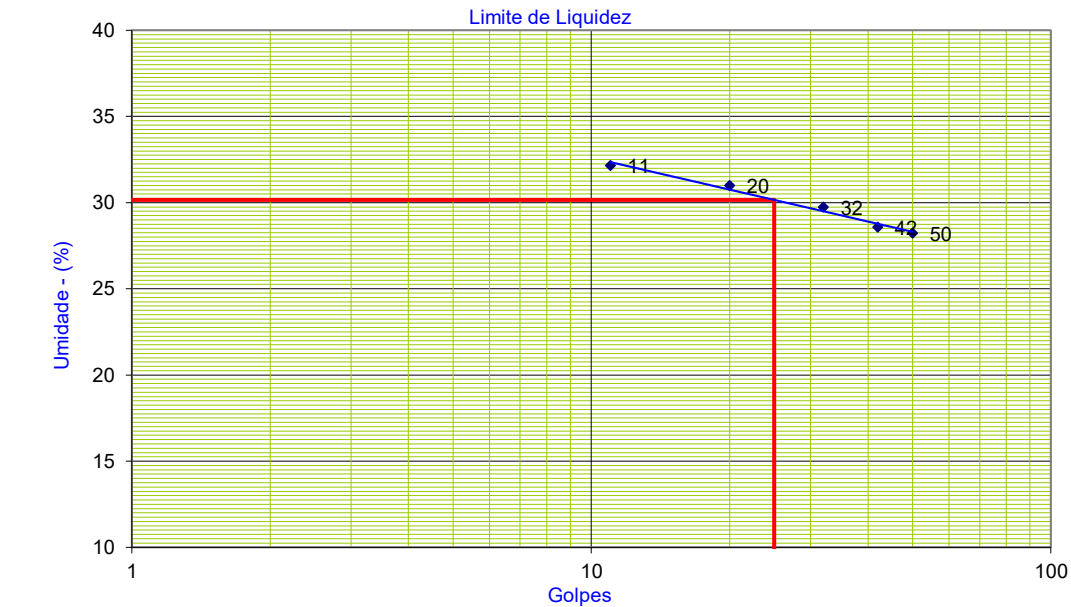

 		LIMITES FÍSICOS  PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS					
Rodovia: SEDE DE RORAINÓPOLIS		Profund.: 0,80		LADO: L / X			
Trecho: BAIRRO VITÓRIA		Furo : 3					
Procedência: SONDAGEM DE		Estaca: 0					
Camada: SUBLEITO		Data: 08/07/2025		OPERADOR: FERNADO			
LIMITE DE LIQUIDEZ NORMA DNER ME - 122/94							
Cápsula	N.º	84	59	37	15	48	
Golpes	g	11	20	32	42	50	
Peso Bruto Úmido	g	33,20	30,80	32,70	30,10	32,00	
Peso Bruto Seco	g	26,60	25,43	26,60	24,72	26,65	
Peso da Cápsula	g	6,08	8,11	6,08	5,89	7,70	
Peso da Água	g	6,60	5,37	6,10	5,38	5,35	
Peso do Solo Seco	g	20,52	17,32	20,52	18,83	18,95	
Umidade	%	32,16	31,00	29,73	28,57	28,23	
LIMITE DE PLASTICIDADE NORMA DNER ME - 082/94							
Cápsula	N.º	34	14	74	52	63	
Peso Bruto Úmido	g	5,22	6,90	6,95	7,03	5,40	
Peso Bruto Seco	g	4,89	6,57	6,65	6,88	5,06	
Peso da Cápsula	g	3,32	4,90	5,11	6,10	3,31	
Peso da Água	g	0,33	0,33	0,30	0,15	0,34	
Peso do Solo Seco	g	1,57	1,67	1,54	0,78	1,75	
Umidade	%	21,02	19,76	19,48	19,23	19,43	
Índice de Plasticidade LL= 30,2% LP = 19,5% IP = 10,7%							



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DNIT- 138/2010 - ES

E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

Folha:

Única


Data:

07/07/2025


Rodovia: SEDE DE RORAINOPÓLIS		Trecho: BAIRRO VITÓRIA		Sub-trecho: RUA C			Registro: SONDAGEM DE			
Estaca:	Furo: 4	Profundidade: 0,82		Material: Argila Silte Cinza			SUBLEITO			
% Mat. Ret. # N° 4: 1,00%	Próctor: NORMAL		Golpes: 12		Operador: FERNADO		Lado L / X			
Item	Unid.	1	2	3	4	5	6	Umidade Higroscópica		
Cápsula N°	-							23	8	
Peso Bruto Úmido	g							63,10	59,80	
Peso Bruto Seco	g							61,90	58,20	
Peso da Água	g							1,20	1,60	
Peso da Cápsula	g							19,11	20,59	
Peso do Solo Seco	g							42,79	37,61	
Umidade	%							2,80%	4,25%	
Umidade calculada	%	9,4%	10,9%	12,5%	14,1%	15,6%		3,5%		
Água Total	g	545	635	725	815	905		Peso do Material		
Água Adicionada	g	340	430	520	610	700		6.000,00		
% Água Adicionada	%	5,67%	7,17%	8,67%	10,17%	11,67%		P. Mat. Seco	Peso Água	
Peso Bruto Úmido	g	7.730	7.984	8.600	8.450	7.960		5.795	205	
Peos do Solo Úmido	g	3.330	3.899	4.375	4.087	3.735		Moldes		
Dens. Solo Úmido	g / m³	1.594	1.944	2.110	2.037	1.802		N°	Peso	Volume
Dens. Solo Seco	g / m³	1.457	1.752	1.876	1.786	1.558		34	4.400	2.089
Resultados:				Observações:						
H. Ótima	Dens. Máx	ISC	Expansão							
12,6 %	1.877	19,7	0,17							




Análise Gráfica

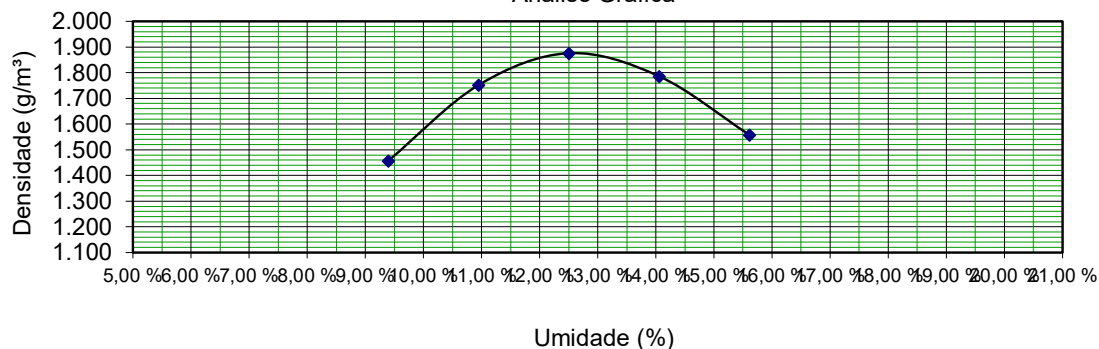

Índice de Suporte Califórnia

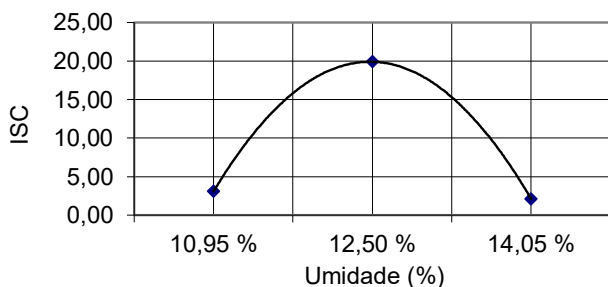

Expansão

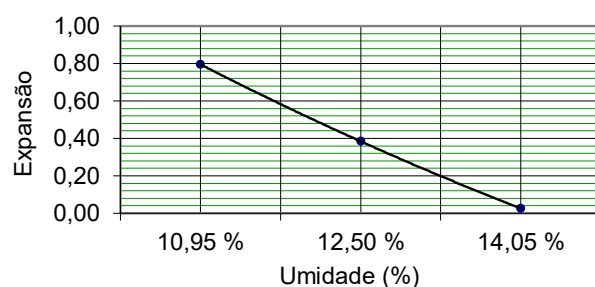



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE EXPANSÃO / I.S.C



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS


OBRA:					DATA:		
					07/07/2025		
RODOVIA:			TRECHO:			OPERADO:	
SEDE DE RORAINÓPOLIS			BAIRRO VITÓRIA			FERNADO	
ESTACA:		LADO:	FURO:	PROFUNDIDADE:		GOLPES:	ESTUDO:
0		L / X	4	0,82		12	SUBLEITO
% MATERIAL RET. PEN. Nº 4			PROCTOR:		MATERIAL:		
1,00%			NORMAL		Argila Silte Cinza		

ENSAIO DE EXPANSÃO NORMA DNER - ME 049/94


MOLDE Nº		ALTURA			MOLDE Nº		ALTURA		MOLDE Nº		ALTURA	
43		114,5			25		114,5		29		114,5	
DATA	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%
07/07/25	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00	0,00	0,00
												
11/07/25	09:00	1,91	0,91	0,79	09:00	1,44	0,44	0,38	09:00	1,03	0,03	0,03

ENSAIO DE I.S.C NORMA DNIT 172/2016 - ME


MOLDE Nº			43			K-PRENSA =			0,110		MOLDE Nº				25				MOLDE Nº				29			
PENETR. mm	TEMPO min	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %					
0.63	0.5	5	0,50			55	6,00			2	0,20															
1.27	1.0	10	1,10			80	8,80			4	0,40															
1.90	1.5	15	1,60			105	11,50			6	0,70															
2.54	2.0	20	2,20	70	3,10	125	13,70	70	19,60	10	1,10	70	1,60													
3.81	3.0	25	2,70			155	17,00			15	1,60															
5.08	4.0	30	3,30	105	3,10	190	20,90	105	19,90	20	2,20	105	2,10													
6.35	5.0	35	3,80			220	24,20			25	2,70															
7.62	6.0	40	4,40			240	26,40			30	3,30															
8.89	7.0	45	4,90			272	29,90			35	3,80															
10.16	8.0	50	5,50			300	32,90			40	4,40															
12.70	10.0	55	6,00			310	34,00			45	4,90															

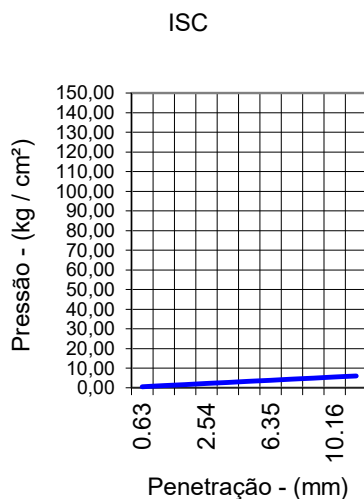

ISC = 3,10 %

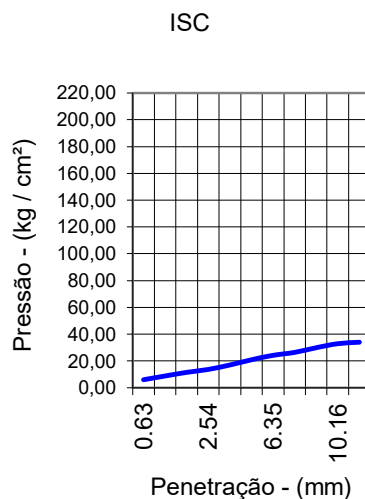

ISC = 19,90 %

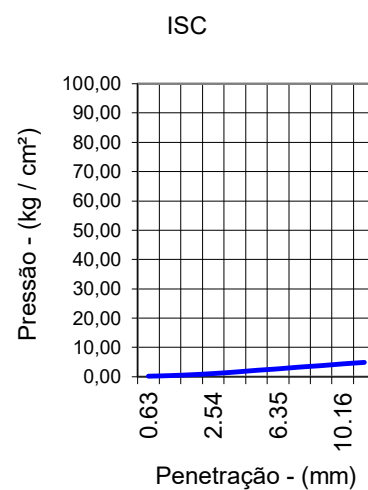

ISC = 2,10 %

RESUMO

DENSIDADE MÁXIMA:	1877 g / cm³	ISC :	19,75 %
ÚMIDADE ÓTIMA:	12,63 %	EXPANSÃO :	0,17 %



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda

Análise Granulométrica NORMA DNER ME -080/94 (Simples)




PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

Rodovia:	SEDE DE RORAINÓPOLIS	Profundidade:	0,82
Trecho:	BAIRRO VITÓRIA	Furo :	4
Procedência:	SONDAGEM DE	Estaca:	0
Camada:	SUBLEITO	Operado:	FERNANDO
		Data:	07/07/25

UMIDADE HIDROSCÓPICA		DISCRIMINAÇÃO		AMOSTRA SECA	
				Total	Parcial
Cápsula (N°)	23	08	Cápsula (N°)	20	01
Peso Umido (g)	63,10	59,80	Peso Bruto Úmido (g)	1500,0	150,0
Peso Bruto Seco (g)	61,90	58,20	Peso Retido na # N° 10 (g)	50,90	
Peso da Água (g)	1,20	1,60	Peso Úmido Pass. na # N° 10 (g)	1449,10	
Peso da Cápsula (g)	19,11	20,59	Peso Seco Pass. na # N° 10 (g)	1399,80	
Peso do Solo Seco (g)	42,79	37,61	Peso da água (g)	49,30	
Umidade (%)	2,80	4,25	Peso da amostra Seca (g)	2 1450,7	3 144,9
Umidade Média (%)	3,5				

Peneiramento



Amostra Total	Peneiras		Peso Retido Parcial (g)	Peso que Passa Acumulado (g)	% que Passa Am.Total	FAIXA AASTHO		CONSTANTES
	Pol	mm				Mínimo	Máximo	
	2"	50,8	0,00	1450,7	100,0			K ₁ =100 = 0,069
	1 1/2"	38,1	0,00	1450,7	100,0			2
	1"	25,4	0,00	1450,7	100,0			K ₂ = 4 = 0,669
	3/8"	9,5	4,50	1446,2	100,0			3
	4	4,8	13,60	1432,6	99,0			
	10	2,0	32,80	1399,8	4 97,0			
Amostra Parcial	40	0,42	23,70	121,2	81,0			
	200	0,074	62,90	58,3	39,0			

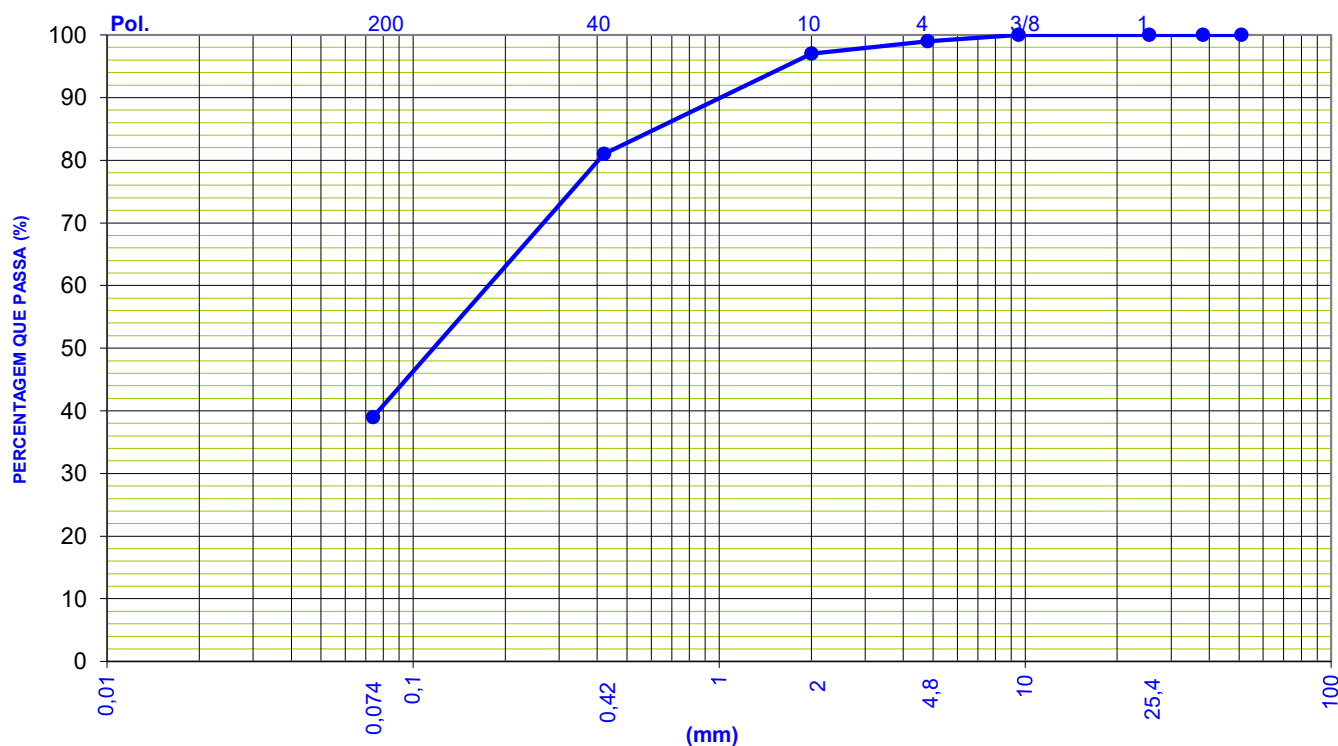

Resumo Granulometria (%)

Pedregulho (> 4,8 mm)	1,0
Areia Grossa (4,8 - 2,0 mm)	2,0
Areia Média (2,0 - 0,42 mm)	16,0
Areia Fina (0,42 - 0,074 mm)	42,0
Passando (0,074 mm)	39,0
Total	100,0

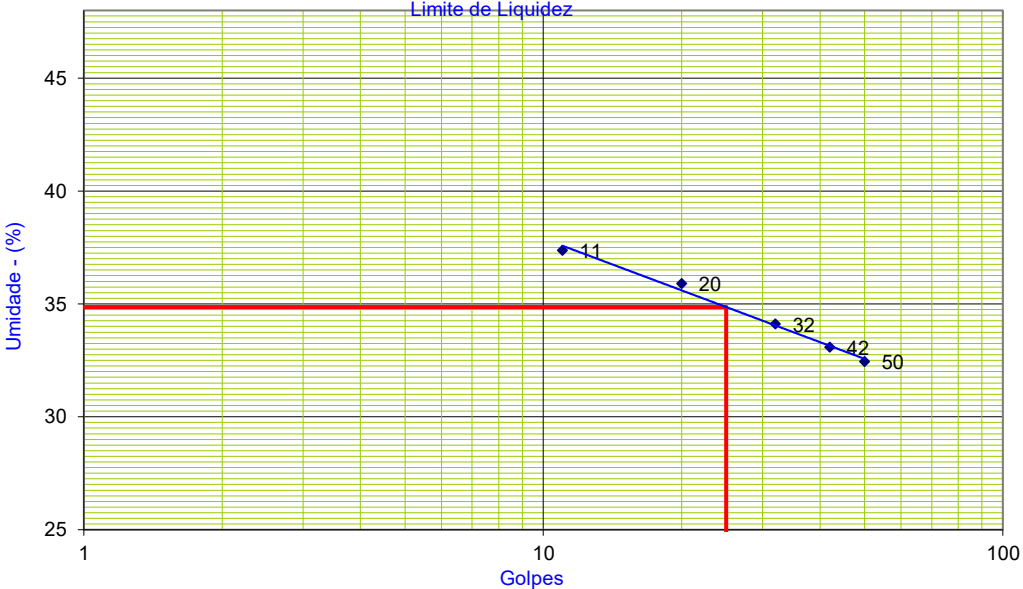

  CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA. Via Norte Construtora Ltda		LIMITES FÍSICOS					
Rodovia: SEDE DE RORAINÓPOLIS		Profund.: 0,82		LADO: L / X			
Trecho: BAIRRO VITÓRIA		Furo : 4					
Procedência: SONDAGEM DE		Estaca: 0					
Camada: SUBLEITO		Data: 08/07/2025		OPERADO: FERNADO			
LIMITE DE LIQUIDEZ NORMA DNER ME - 122/94							
Cápsula	N.º	25	74	64	82	46	
Golpes	g	11	20	32	42	50	
Peso Bruto Úmido	g	34,27	31,65	33,60	30,95	32,80	
Peso Bruto Seco	g	26,60	25,43	26,60	24,72	26,65	
Peso da Cápsula	g	6,08	8,11	6,08	5,89	7,70	
Peso da Água	g	7,67	6,22	7,00	6,23	6,15	
Peso do Solo Seco	g	20,52	17,32	20,52	18,83	18,95	
Umidade	%	37,38	35,91	34,11	33,09	32,45	
LIMITE DE PLASTICIDADE NORMA DNER ME - 082/94							
Cápsula	N.º	47	68	32	74	28	
Peso Bruto Úmido	g	5,20	6,95	7,00	7,05	5,42	
Peso Bruto Seco	g	4,89	6,57	6,65	6,88	5,06	
Peso da Cápsula	g	3,32	4,90	5,11	6,10	3,31	
Peso da Água	g	0,31	0,38	0,35	0,17	0,36	
Peso do Solo Seco	g	1,57	1,67	1,54	0,78	1,75	
Umidade	%	19,75	22,75	22,73	21,79	20,57	
Índice de Plasticidade LL= 34,9% LP = 21,2% IP= 13,7% 							



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DNIT- 138/2010 - ES

E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

Folha:


Única

Data:


08/07/2025

Rodovia: SEDE DE RORAINÓPOLIS		Trecho: BAIRRO VITÓRIA		Sub-trecho: RUA D			Registro: SONDAGEM DE			
Estaca:	Furo: 5	Profundidade: 0,75		Material: Argila Arenoso Cinza			SUBLEITO			
% Mat. Ret. # N° 4: 0,00%	Próctor: NORMAL		Golpes: 12		Operador: FERNANDO		Lado L / X			
Item	Unid.	1	2	3	4	5	6	Umidade Higroscópica		
Cápsula N°	-							20	19	
Peso Bruto Úmido	g							67,79	65,86	
Peso Bruto Seco	g							66,00	64,00	
Peso da Água	g							1,79	1,86	
Peso da Cápsula	g							19,11	20,59	
Peso do Solo Seco	g							46,89	43,41	
Umidade	%							3,82%	4,28%	
Umidade calculada	%	6,7%	8,8%	10,9%	13,0%	15,1%		4,1%		
Água Total	g	389	509	629	749	869		Peso do Material		
Água Adicionada	g	155	275	395	515	635		6.000,00		
% Água Adicionada	%	2,58%	4,58%	6,58%	8,58%	10,58%		P. Mat. Seco	Peso Água	
Peso Bruto Úmido	g	7.590	7.724	8.090	8.070	8.050		5.766	234	
Peos do Solo Úmido	g	3.374	3.639	3.965	3.872	3.815		Moldes		
Dens. Solo Úmido	g / m³	1.617	1.814	1.929	1.930	1.853		N°	Peso	Volume
Dens. Solo Seco	g / m³	1.515	1.667	1.740	1.708	1.610		37	4.216	2.086
Resultados:				Observações:						
H. Ótima	Dens. Máx	ISC	Expansão							
11,3 %	1.742	13,3	0,10							
								44	4.085	2.006
								8	4.125	2.055
								3	4.198	2.006
								22	4.235	2.059


Análise Gráfica

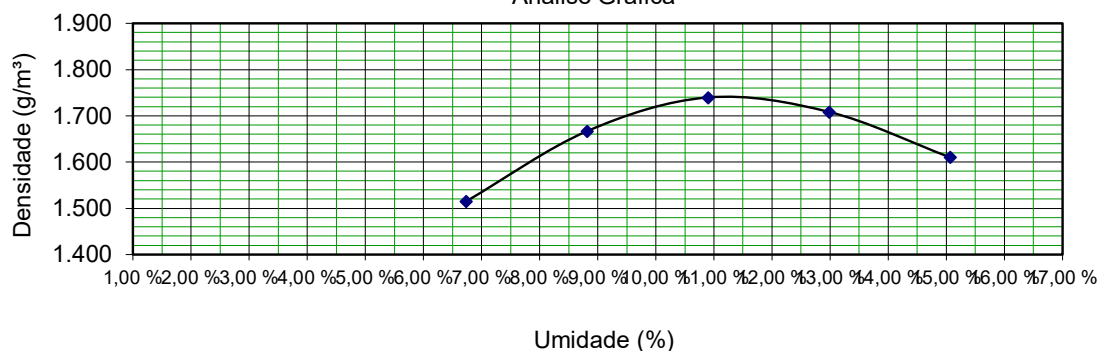

Índice de Suporte Califórnia

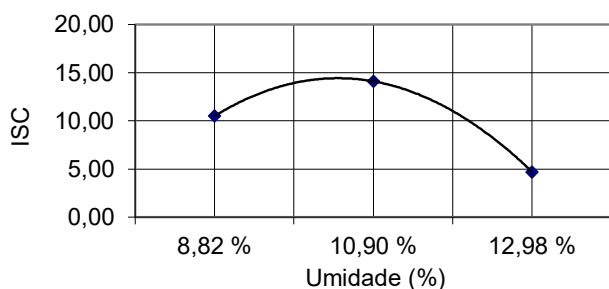

Expansão

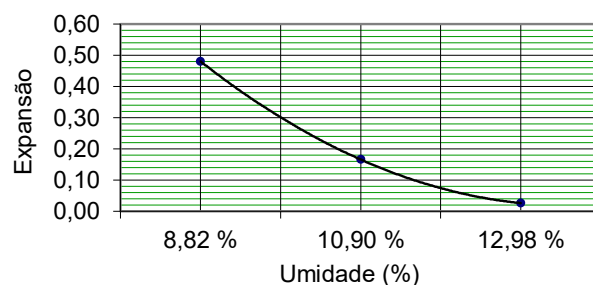



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE EXPANSÃO / I.S.C



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS




OBRA:		DATA:	08/07/2025
RODOVIA:	SEDE DE RORAINÓPOLIS	TRECHO:	BAIRRO VITÓRIA
ESTACA:	0	LADO:	L / X
FURO:	5	PROFUNDIDADE:	0,75
GOLPES:	12	ESTUDO:	SUBLEITO
% MATERIAL RET. PEN. Nº 4	0,00%	PROCTOR:	NORMAL
MATERIAL:	Argila Arenoso Cinza		

ENSAIO DE EXPANSÃO NORMA DNER - ME 049/94

MOLDE Nº 44		ALTURA 114,5			MOLDE Nº 8		ALTURA 114,5		MOLDE Nº 3		ALTURA 114,5	
DATA	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%
08/07/25	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00	0,00	0,00
												
12/07/25	09:00	1,55	0,55	0,48	09:00	1,19	0,19	0,17	09:00	1,03	0,03	0,03

ENSAIO DE I.S.C NORMA DNIT 172/2016 - ME

MOLDE Nº 44			K-PRENSA =			0,110	MOLDE Nº 8				MOLDE Nº 3			
PENETR. mm	TEMPO min	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	
0.63	0.5	10	1,10			35	3,80			5	0,50			
1.27	1.0	25	2,70			55	6,00			10	1,10			
1.90	1.5	40	4,40			70	7,70			15	1,60			
2.54	2.0	60	6,60	70	9,40	90	9,90	70	14,10	25	2,70	70	3,90	
3.81	3.0	75	8,20			115	12,60			35	3,80			
5.08	4.0	100	11,00	105	10,50	135	14,80	105	14,10	45	4,90	105	4,70	
6.35	5.0	110	12,10			160	17,60			65	7,10			
7.62	6.0	125	13,70			200	22,00			80	8,80			
8.89	7.0	140	15,40			220	24,20			90	9,90			
10.16	8.0	185	20,30			235	25,80			105	11,50			
12.70	10.0	210	23,10			250	27,50			110	12,10			

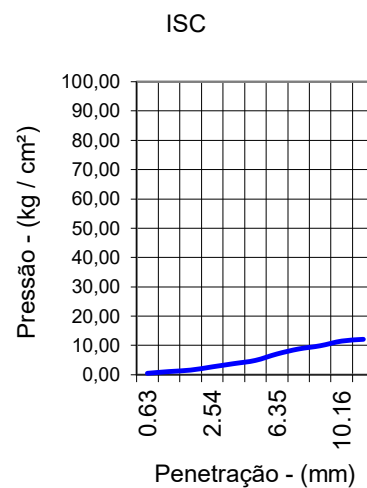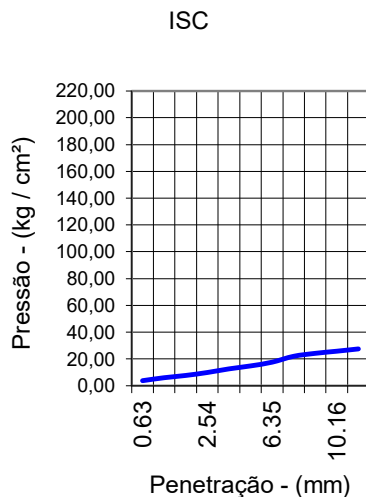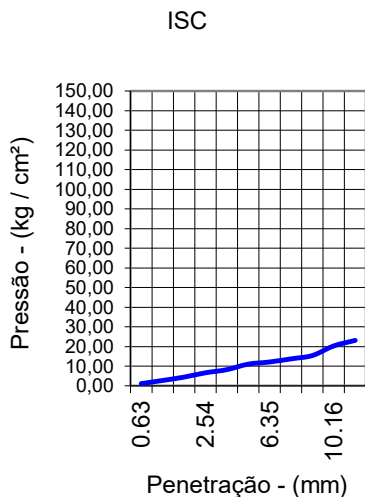

RESUMO

DENSIDADE MÁXIMA:	1742 g / cm³	ISC :	13,27 %
ÚMIDADE ÓTIMA:	11,31 %	EXPANSÃO :	0,10 %



CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA Via Norte Construtora Ltda

**Análise Granulométrica NORMA DNER ME -080/94 (Simples)**


PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

Rodovia:	SEDE DE RORAINÓPOLIS	Profundidade:	0,75
Trecho:	BAIRRO VITÓRIA	Furo :	5
Procedência:	SONDAGEM DE	Estaca:	0
Camada:	SUBLEITO	OPERADO	FERNADO
		Data:	08/07/25

UMIDADE HIDROSCÓPICA			DISCRIMINAÇÃO		AMOSTRA SECA	
					Total	Parcial
Cápsula (N°)	20	19	Cápsula (N°)		20	01
Peso Umido (g)	67,79	65,86	Peso Bruto Úmido (g)		1500,0	150,0
Peso Bruto Seco (g)	66,00	64,00	Peso Retido na # N° 10 (g)		12,30	
Peso da Água (g)	1,79	1,86	Peso Úmido Pass. na # N° 10 (g)		1487,70	
Peso da Cápsula (g)	19,11	20,59	Peso Seco Pass. na # N° 10 (g)		1429,80	
Peso do Solo Seco (g)	46,89	43,41	Peso da água (g)		57,90	
Umidade (%)	3,82	4,28	Peso da amostra Seca (g)		1442,1	144,2
Umidade Média (%)	4,1					

Peneiramento

Amostra Total	Peneiras		Peso Retido Parcial (g)	Peso que Passa Acumulado (g)	% que Passa Am.Total	FAIXA AASTHO		CONSTANTES
	Pol	mm				Mínimo	Máximo	
	2"	50,8	0,00	1442,1	100,0			K ₁ =100 = 0,069
	1 1/2"	38,1	0,00	1442,1	100,0			
	1"	25,4	0,00	1442,1	100,0			K ₂ = 4 = 0,687
	3/8"	9,5	0,00	1442,1	100,0			
	4	4,8	0,00	1442,1	100,0			
	10	2,0	12,30	1429,8	99,0			
Amostra Parcial	40	0,42	59,60	84,6	58,0			
	200	0,074	60,60	24,0	16,0			

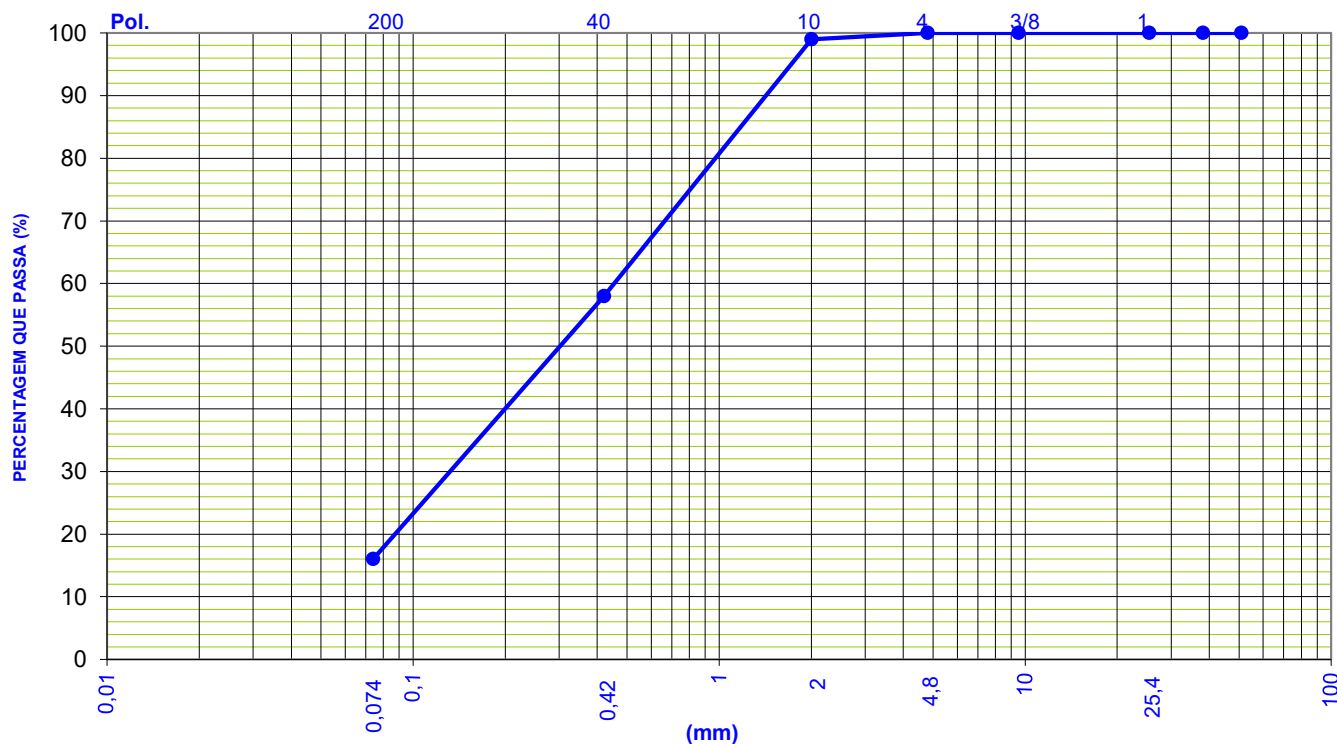**Resumo Granulometria (%)**

Pedregulho (> 4,8 mm)	0,0
Areia Grossa (4,8 - 2,0 mm)	1,0
Areia Média (2,0 - 0,42 mm)	41,0
Areia Fina (0,42 - 0,074 mm)	42,0
Passando (0,074 mm)	16,0
Total	100,0





CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



LIMITES FÍSICOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

Rodovia: SEDE DE RORAINÓPOLIS

Profund.: 0,75

OPERADO: FERNANDO

Trecho: BAIRRO VITÓRIA

Furo : 5

Procedência: SONDAGEM DE

Estaca: 0

Camada: SUBLEITO

Data: 09/07/2025

LADO: L / X

LIMITE DE LIQUIDEZ NORMA DNER ME - 122/94

Cápsula	N.º	41	11	25	22	04
Golpes	g	11	20	32	42	50
Peso Bruto Úmido	g	33,78	31,25	33,25	30,61	32,43
Peso Bruto Seco	g	26,60	25,43	26,60	24,72	26,65
Peso da Cápsula	g	6,08	8,11	6,08	5,89	7,70
Peso da Água	g	7,18	5,82	6,65	5,89	5,78
Peso do Solo Seco	g	20,52	17,32	20,52	18,83	18,95
Umidade	%	34,99	33,60	32,41	31,28	30,50



LIMITE DE PLASTICIDADE NORMA DNER ME - 082/94

Cápsula	N.º	51	47	14	39	44
Peso Bruto Úmido	g	5,23	6,93	6,98	7,04	5,40
Peso Bruto Seco	g	4,89	6,57	6,65	6,88	5,06
Peso da Cápsula	g	3,32	4,90	5,11	6,10	3,31
Peso da Água	g	0,34	0,36	0,33	0,16	0,34
Peso do Solo Seco	g	1,57	1,67	1,54	0,78	1,75
Umidade	%	21,66	21,56	21,43	20,51	19,43




Índice de Plasticidade

LL= 32,8%

LP = 21,3%

IP= 11,5%

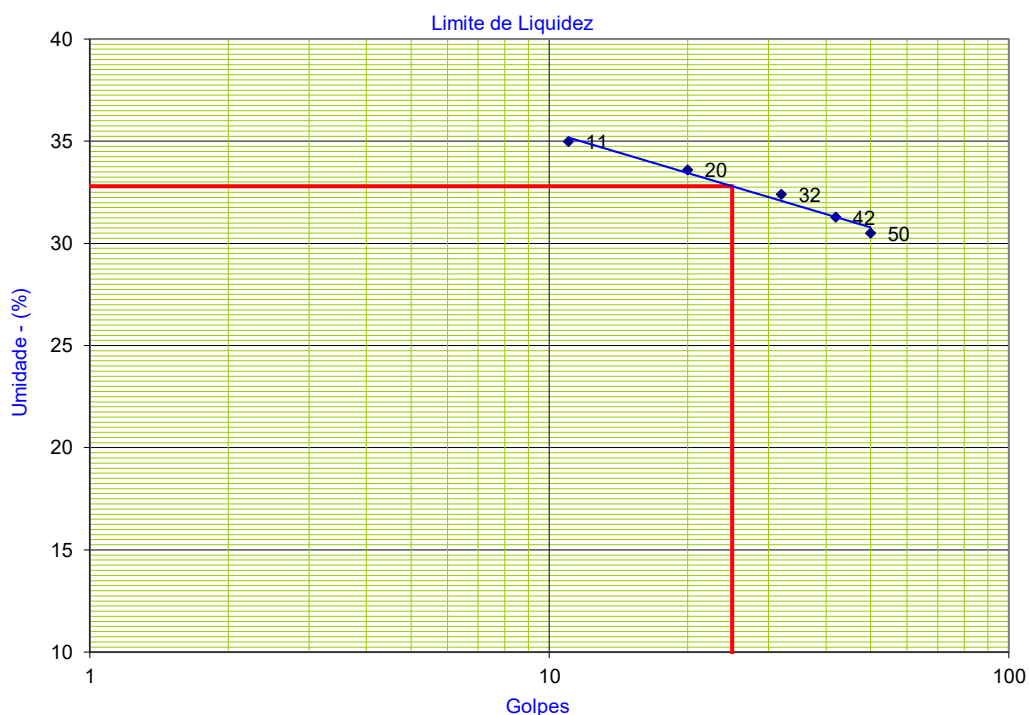



MTEC
CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DNIT- 138/2010 - ES

E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS

Folha:

Única


Data:

08/07/2025


Rodovia: SEDE DE RORAINÓPOLIS		Trecho: BAIRRO VITÓRIA		Sub-trecho: RUA E			Registro: SONDAGEM DE					
Estaca:	Furo: 6	Profundidade: 0,78		Material: Argila Arenoso Cinza			SUBLEITO					
% Mat. Ret. # N° 4: 1,00%	Próctor: NORMAL		Golpes: 12		Operador: FERNADO		Lado L / X					
Item	Unid.	1	2	3	4	5	6	Umidade Higroscópica				
Cápsula N°	-							31	45			
Peso Bruto Úmido	g							58,07	62,02			
Peso Bruto Seco	g							57,00	61,00			
Peso da Água	g							1,07	1,02			
Peso da Cápsula	g							19,11	20,59			
Peso do Solo Seco	g							37,89	40,41			
Umidade	%							2,82%	2,52%			
Umidade calculada	%	6,6%	8,7%	10,7%	12,8%	14,8%		2,7%				
Água Total	g	386	506	626	746	866		Peso do Material				
Água Adicionada	g	230	350	470	590	710		6.000,00				
% Água Adicionada	%	3,83%	5,83%	7,83%	9,83%	11,83%		P. Mat. Seco	Peso Água			
Peso Bruto Úmido	g	7.750	7.920	8.256	8.400	8.850		5.844	156			
Peos do Solo Úmido	g	3.625	3.835	4.181	4.068	4.136		Moldes				
Dens. Solo Úmido	g / m³	1.734	1.912	2.019	2.028	1.980		N°	Peso			
Dens. Solo Seco	g / m³	1.626	1.759	1.823	1.798	1.724		20	4.125			
Resultados:		Observações:								66	4.085	2.006
										2	4.075	2.071
										27	4.332	2.006
										42	4.714	2.089
H. Ótima	Dens. Máx	ISC	Expansão									
11,2 %	1.826	11,3	0,09									




Análise Gráfica

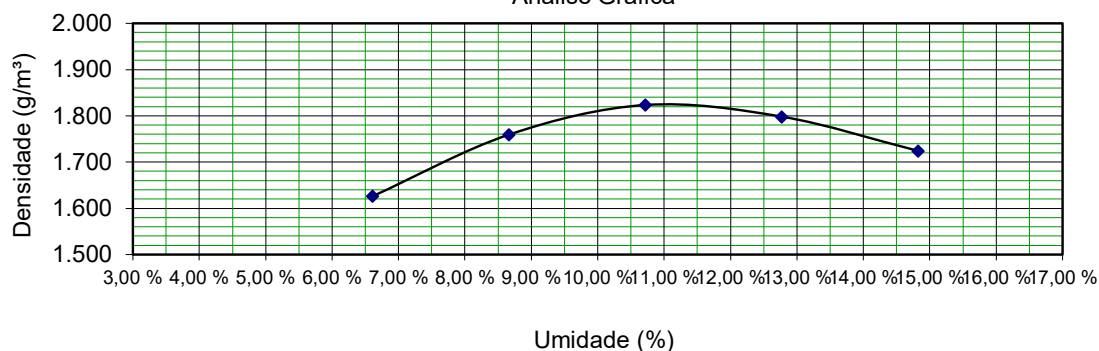

Índice de Suporte Califórnia

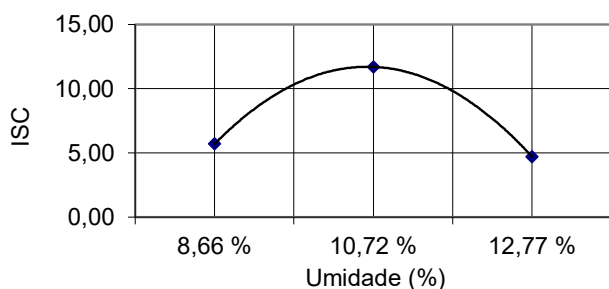

Expansão

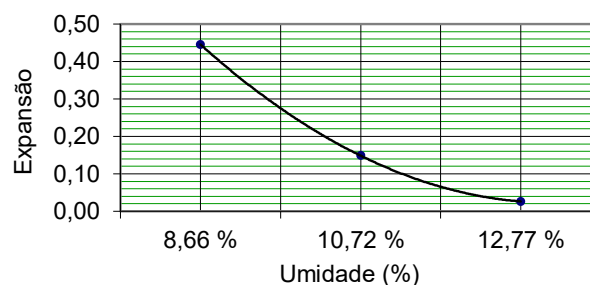



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE EXPANSÃO / I.S.C



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS




OBRA:		DATA:	08/07/2025
RODOVIA:	SEDE DE RORAINÓPOLIS	TRECHO:	BAIRRO VITÓRIA
ESTACA:	0	FURO:	6
LADO:	L / X	PROFUNDIDADE:	0,78
GOLPES:	12	ESTUDO:	SUBLEITO
% MATERIAL RET. PEN. N° 4	1,00%	PROCTOR:	NORMAL
MATERIAL:	Argila Arenoso Cinza		

ENSAIO DE EXPANSÃO NORMA DNER - ME 049/94

MOLDE Nº 66		ALTURA 114,5			MOLDE Nº 2		ALTURA 114,5		MOLDE Nº 27		ALTURA 114,5	
DATA	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%
08/07/25	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00	0,00	0,00
												
12/07/25	09:00	1,51	0,51	0,45	09:00	1,17	0,17	0,15	09:00	1,03	0,03	0,03

ENSAIO DE I.S.C NORMA DNIT 172/2016 - ME

MOLDE N° 66			K-PRENSA = 0,110			MOLDE N° 2				MOLDE N° 27			
PENETR. mm	TEMPO min	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %
0.63	0.5	11	1,20			30	3,30			5	0,50		
1.27	1.0	15	1,60			45	4,90			8	0,90		
1.90	1.5	25	2,70			60	6,60			15	1,60		
2.54	2.0	35	3,80	70	5,40	75	8,20	70	11,70	20	2,20	70	3,10
3.81	3.0	45	4,90			85	9,30			30	3,30		
5.08	4.0	55	6,00	105	5,70	100	11,00	105	10,50	45	4,90	105	4,70
6.35	5.0	70	7,70			117	12,80			50	5,50		
7.62	6.0	85	9,30			135	14,80			65	7,10		
8.89	7.0	100	11,00			165	18,10			75	8,20		
10.16	8.0	105	11,50			200	22,00			90	9,90		
12.70	10.0	115	12,60			230	25,30			100	11,00		

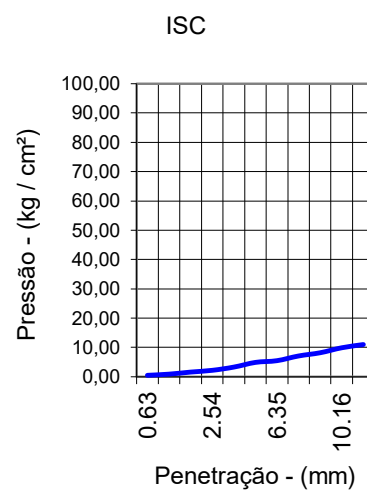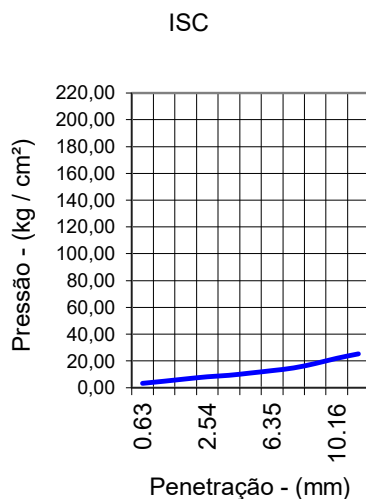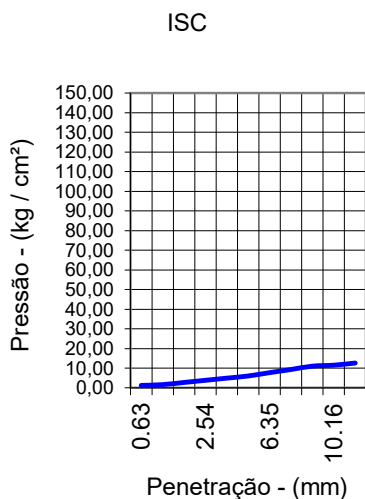

RESUMO

DENSIDADE MÁXIMA: 1826 g / cm³

ISC : 11,28 %

ÚMIDADE ÓTIMA: 11,16 %

EXPANSÃO : 0,09 %



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda

**Análise Granulométrica NORMA DNER ME -080/94 (Simples)**


PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

Rodovia:	SEDE DE RORAINÓPOLIS	Profundidade:	0,78
Trecho:	BAIRRO VITÓRIA	Furo :	6
Procedência:	SONDAGEM DE	Estaca:	0
Camada:	SUBLEITO	Operado	FERNADO
		Data:	08/07/25

UMIDADE HIDROSCÓPICA			DISCRIMINAÇÃO		AMOSTRA SECA	
					Total	Parcial
Cápsula (N°)	31	45	Cápsula (N°)		33	31
Peso Umido (g)	58,07	62,02	Peso Bruto Úmido (g)		1500,0	150,0
Peso Bruto Seco (g)	57,00	61,00	Peso Retido na # N° 10 (g)		12,40	
Peso da Água (g)	1,07	1,02	Peso Úmido Pass. na # N° 10 (g)		1487,60	
Peso da Cápsula (g)	19,11	20,59	Peso Seco Pass. na # N° 10 (g)		1448,90	
Peso do Solo Seco (g)	37,89	40,41	Peso da água (g)		38,70	
Umidade (%)	2,82	2,52	Peso da amostra Seca (g)		2 1461,3	3 146,1
Umidade Média (%)	2,7					



Peneiramento

Amostra Total	Peneiras		Peso Retido Parcial (g)	Peso que Passa Acumulado (g)	% que Passa Am.Total	FAIXA AASTHO		CONSTANTES
	Pol	mm				Mínimo	Máximo	
	2"	50,8	0,00	1461,3	100,0			K ₁ =100 = 0,068 2
	1 1/2"	38,1	0,00	1461,3	100,0			
	1"	25,4	0,00	1461,3	99,0			K ₂ = 4 = 0,678 3
	3/8"	9,5	0,00	1461,3	99,0			
	4	4,8	0,00	1461,3	99,0			
	10	2,0	12,40	1448,9	4 99,0			
Amostra Parcial	40	0,42	61,60	84,5	57,0			
	200	0,074	30,30	54,2	37,0			

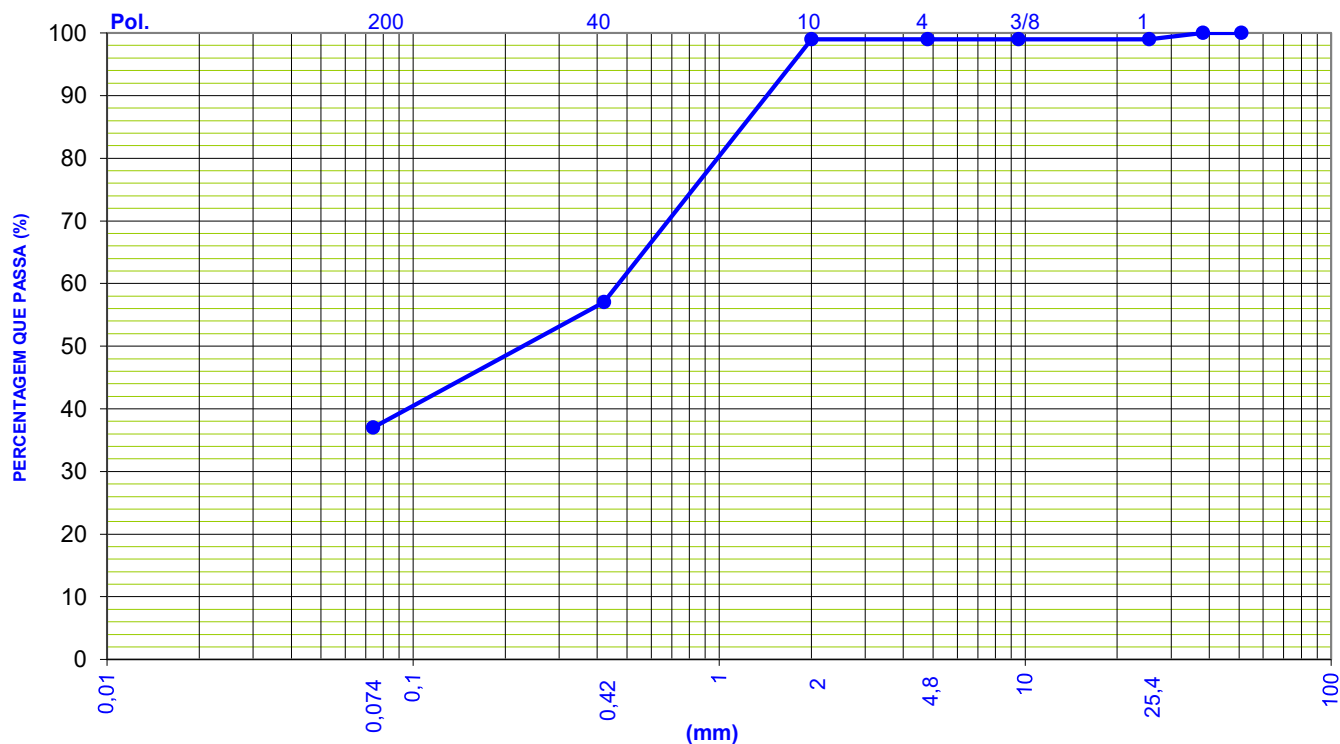**Resumo Granulometria (%)**

Pedregulho (> 4,8 mm)	1,0
Areia Grossa (4,8 - 2,0 mm)	0,0
Areia Média (2,0 - 0,42 mm)	42,0
Areia Fina (0,42 - 0,074 mm)	20,0
Passando (0,074 mm)	37,0
Total	100,0

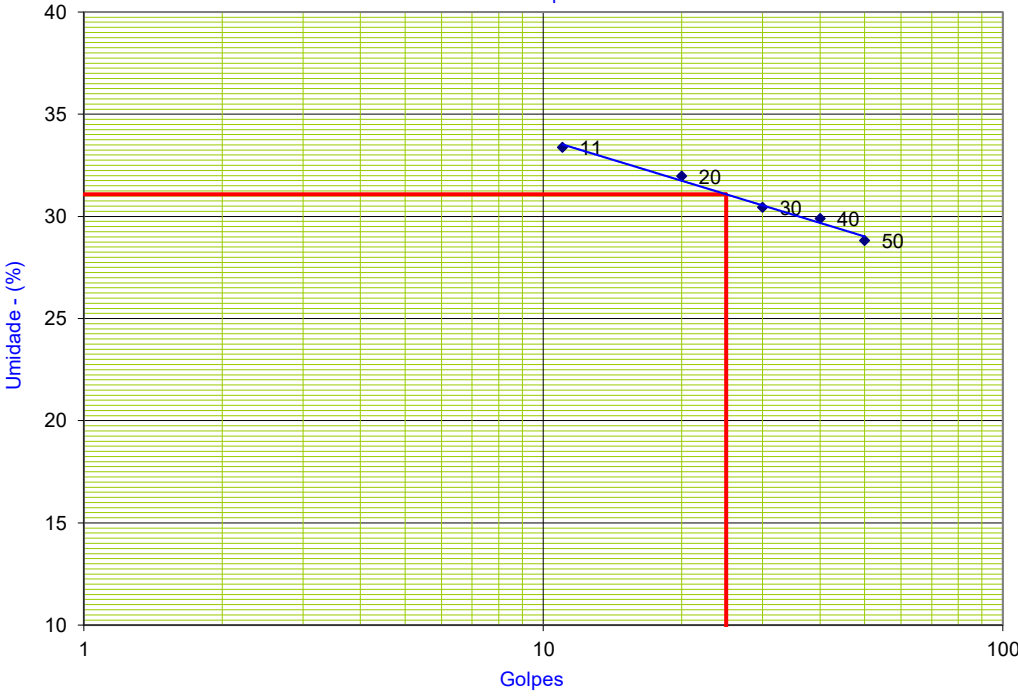

 		LIMITES FÍSICOS  PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS					
Rodovia: SEDE DE RORAINÓPOLIS		Profund.: 0,78		OPERADO FERNANDO			
Trecho: BAIRRO VITÓRIA		Furo : 6					
Procedência: SONDAGEM DE		Estaca: 0					
Camada: SUBLEITO		Data: 09/07/2025		LADO: L / X			
LIMITE DE LIQUEDEZ NORMA DNER ME - 122/94							
Cápsula	N.º	20	45	25	32	71	
Golpes	g	11	20	30	40	50	
Peso Bruto Úmido	g	14,28	14,75	12,00	14,70	10,67	
Peso Bruto Seco	g	12,29	12,71	10,49	12,79	9,52	
Peso da Cápsula	g	6,33	6,33	5,53	6,40	5,53	
Peso da Água	g	1,99	2,04	1,51	1,91	1,15	
Peso do Solo Seco	g	5,96	6,38	4,96	6,39	3,99	
Umidade	%	33,39	31,97	30,44	29,89	28,82	
LIMITE DE PLASTICIDADE NORMA DNER ME - 082/94							
Cápsula	N.º	23	61	60	55	08	
Peso Bruto Úmido	g	8,62	8,04	7,93	7,88	6,48	
Peso Bruto Seco	g	8,27	7,67	7,56	7,56	6,30	
Peso da Cápsula	g	6,43	5,68	5,54	5,81	5,33	
Peso da Água	g	0,35	0,37	0,37	0,32	0,18	
Peso do Solo Seco	g	1,84	1,99	2,02	1,75	0,97	
Umidade	%	19,02	18,59	18,32	18,29	18,56	
Índice de Plasticidade LL= 31,1% LP = 18,6% IP= 12,5%		Limite de Liqueidez 					



MTEC
CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DNIT- 138/2010 - ES

E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS

Folha:


Única

Data:


08/07/2025

Rodovia: SEDE DE RORAINÓPOLIS		Trecho: BAIRRO VITÓRIA		Sub-trecho: RUA F			Registro: SONDAGEM DE						
Estaca:	Furo: 7	Profundidade: 0,71		Material: Argila Silte Arenoso Cinza			SUBLEITO						
% Mat. Ret. # N° 4: 0,00%	Próctor: NORMAL		Golpes: 12		Operador: FERNADO		Lado L / X						
Item	Unid.	1	2	3	4	5	6	Umidade Higroscópica					
Cápsula N°	-							8	10				
Peso Bruto Úmido	g							55,21	67,27				
Peso Bruto Seco	g							54,00	66,03				
Peso da Água	g							1,21	1,24				
Peso da Cápsula	g							19,11	20,59				
Peso do Solo Seco	g							34,89	45,44				
Umidade	%							3,47%	2,73%				
Umidade calculada	%	7,2%	9,3%	11,3%	13,4%	15,5%		3,1%					
Água Total	g	420	540	660	780	900		Peso do Material					
Água Adicionada	g	240	360	480	600	720		6.000,00					
% Água Adicionada	%	4,00%	6,00%	8,00%	10,00%	12,00%		P. Mat. Seco	Peso Água				
Peso Bruto Úmido	g	7.620	7.640	8.820	7.910	8.350		5.820	180				
Peos do Solo Úmido	g	3.220	3.555	4.012	3.785	3.636		Moldes					
Dens. Solo Úmido	g / m³	1.541	1.772	1.909	1.887	1.741		N°	Peso	Volume			
Dens. Solo Seco	g / m³	1.438	1.622	1.714	1.664	1.507		34	4.400	2.089			
Resultados:			Observações:								23	4.085	2.006
											50	4.808	2.102
H. Ótima	Dens. Máx	ISC	Expansão	71	4.125	2.006							
11,7 %	1.716	13,8	0,11	42	4.714	2.089							


Análise Gráfica

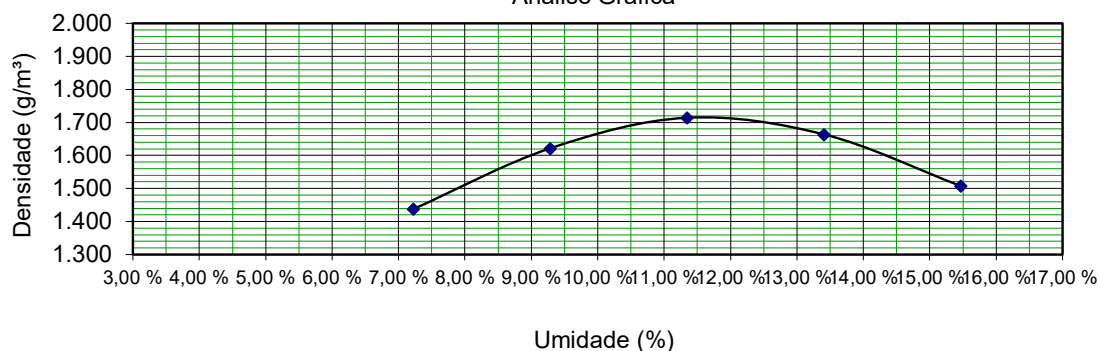

Índice de Suporte Califórnia

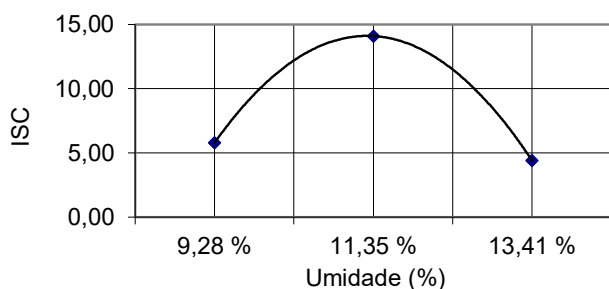

Expansão

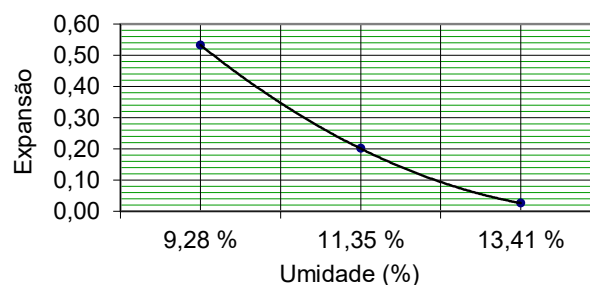



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE EXPANSÃO / I.S.C



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS

OBRA:

DATA:

08/07/2025

RODOVIA:

TRECHO:

OPERADO:

SEDE DE RORAINÓPOLIS

BAIRRO VITÓRIA

FERNADO

ESTACA:

LADO:

FURO:

PROFUNDIDADE:

GOLPES:

ESTUDO:

0

L / X

7

0,71

12

SUBLEITO

% MATERIAL RET. PEN. N° 4

PROCTOR:

MATERIAL:

0,00%

NORMAL

Argila Silte Arenoso Cinza


ENSAIO DE EXPANSÃO NORMA DNER - ME 049/94

MOLDE Nº 23		ALTURA 114,5			MOLDE Nº 50		ALTURA 114,5		MOLDE Nº 71		ALTURA 114,5	
DATA	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%
08/07/25	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00	0,00	0,00
												
12/07/25	09:00	1,61	0,61	0,53	09:00	1,23	0,23	0,20	09:00	1,03	0,03	0,03

ENSAIO DE I.S.C NORMA DNIT 172/2016 - ME


MOLDE N° 23			K-PRENSA = 0,110			MOLDE N° 50				MOLDE N° 71			
PENETR. mm	TEMPO min	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %
0.63	0.5	15	1,60			32	3,50			10	1,10		
1.27	1.0	20	2,20			57	6,30			15	1,60		
1.90	1.5	25	2,70			68	7,50			20	2,20		
2.54	2.0	33	3,60	70	5,10	90	9,90	70	14,10	25	2,70	70	3,90
3.81	3.0	45	4,90			110	12,10			31	3,40		
5.08	4.0	56	6,10	105	5,80	135	14,80	105	14,10	42	4,60	105	4,40
6.35	5.0	70	7,70			155	17,00			56	6,10		
7.62	6.0	85	9,30			170	18,70			68	7,50		
8.89	7.0	95	10,40			210	23,10			75	8,20		
10.16	8.0	110	12,10			245	26,90			90	9,90		
12.70	10.0	120	13,20			275	30,20			100	11,00		

ISC

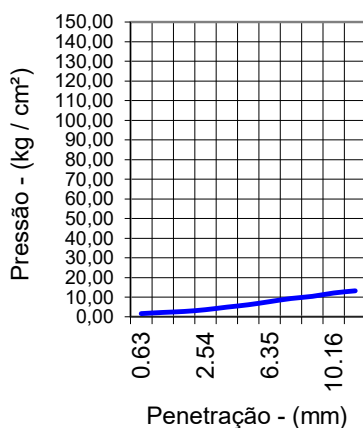


ISC = 5,80 %

ISC

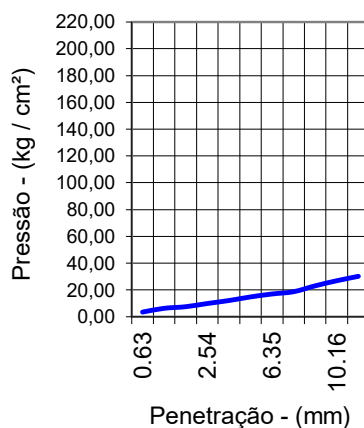

ISC = 14,10 %

ISC

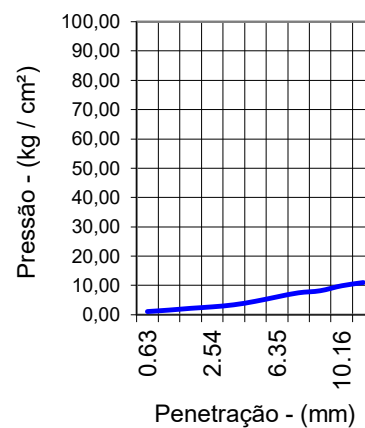

ISC = 4,40 %

RESUMO

DENSIDADE MÁXIMA: 1716 g / cm³

ISC : 13,80 %

ÚMIDADE ÓTIMA: 11,65 %

EXPANSÃO : 0,11 %



CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA Via Norte Construtora Ltda



Análise Granulométrica NORMA DNER ME -080/94 (Simples)




PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

Rodovia:	SEDE DE RORAINÓPOLIS	Profundidade:	0,71
Trecho:	BAIRRO VITÓRIA	Furo :	7
Procedência:	SONDAGEM DE	Estaca:	0
Camada:	SUBLEITO	Operado	FERNADO
		Data:	08/07/25

UMIDADE HIDROSCÓPICA			DISCRIMINAÇÃO		AMOSTRA SECA	
					Total	Parcial
Cápsula (N°)	08	10	Cápsula (N°)		31	11
Peso Umido (g)	55,21	67,27	Peso Bruto Úmido (g)		1500,0	150,0
Peso Bruto Seco (g)	54,00	66,03	Peso Retido na # N° 10 (g)		27,30	
Peso da Água (g)	1,21	1,24	Peso Úmido Pass. na # N° 10 (g)		1472,70	
Peso da Cápsula (g)	19,11	20,59	Peso Seco Pass. na # N° 10 (g)		1428,40	
Peso do Solo Seco (g)	34,89	45,44	Peso da água (g)		44,30	
Umidade (%)	3,47	2,73	Peso da amostra Seca (g)		2 1455,7	3 145,5
Umidade Média (%)	3,1					

Peneiramento



Amostra Total	Peneiras		Peso Retido Parcial (g)	Peso que Passa Acumulado (g)	% que Passa Am.Total	FAIXA AASTHO		CONSTANTES
	Pol	mm				Mínimo	Máximo	
	2"	50,8	0,00	1455,7	100,0			K ₁ =100 = 0,069
	1 1/2"	38,1	0,00	1455,7	100,0			2
	1"	25,4	0,00	1455,7	100,0			K ₂ = 4 = 0,680
	3/8"	9,5	0,00	1455,7	100,0			3
	4	4,8	0,00	1455,7	100,0			
	10	2,0	27,30	1428,4	4 99,0			
Amostra Parcial	40	0,42	50,00	95,5	65,0			
	200	0,074	75,85	19,7	13,0			

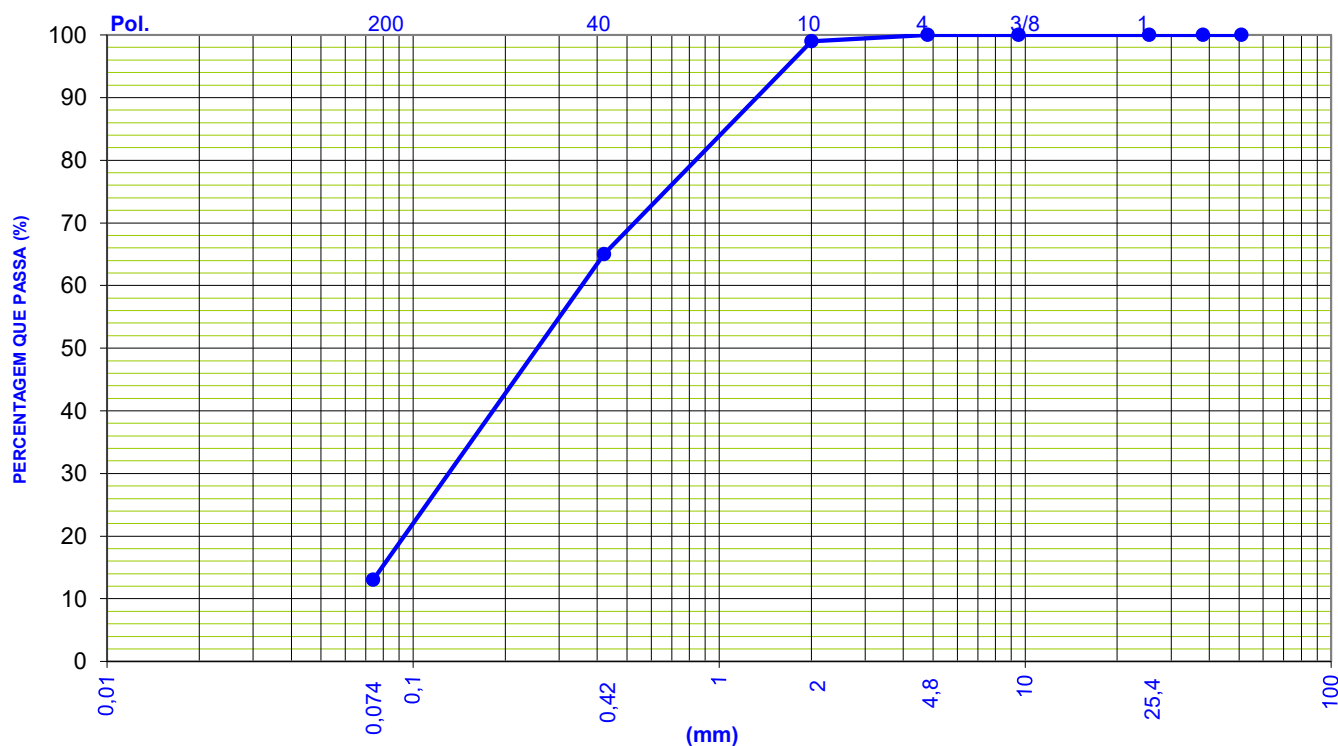

Resumo Granulometria (%)

Pedregulho (> 4,8 mm)	0,0
Areia Grossa (4,8 - 2,0 mm)	1,0
Areia Média (2,0 - 0,42 mm)	34,0
Areia Fina (0,42 - 0,074 mm)	52,0
Passando (0,074 mm)	13,0
Total	100,0

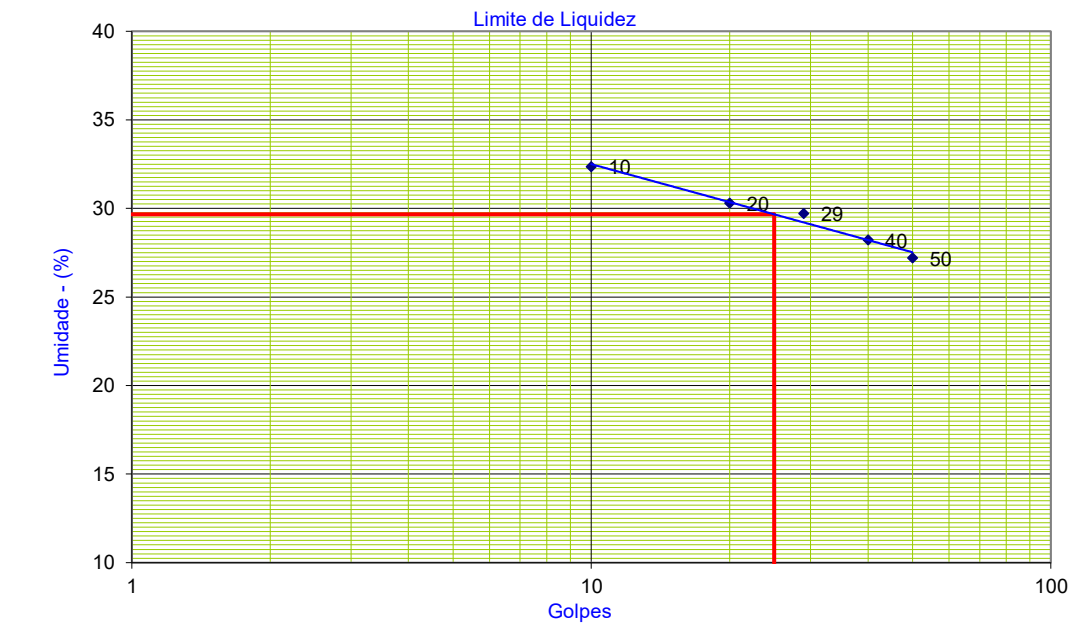

 		LIMITES FÍSICOS  PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS					
Rodovia: SEDE DE RORAINÓPOLIS		Profund.: 0,71		OPERADO FERNADO			
Trecho: BAIRRO VITÓRIA		Furo : 7					
Procedência: SONDAGEM DE		Estaca: 0					
Camada: SUBLEITO		Data: 09/07/2025		LADO: L / X			
LIMITE DE LIQUIDEZ NORMA DNER ME - 122/94							
Cápsula	N.º	31	95	85	77	41	
Golpes	g	10	20	29	40	50	
Peso Bruto Úmido	g	25,15	34,96	20,90	24,35	25,35	
Peso Bruto Seco	g	20,43	28,30	17,42	20,19	21,14	
Peso da Cápsula	g	5,84	6,33	5,71	5,45	5,66	
Peso da Água	g	4,72	6,66	3,48	4,16	4,21	
Peso do Solo Seco	g	14,59	21,97	11,71	14,74	15,48	
Umidade	%	32,35	30,31	29,72	28,22	27,20	
LIMITE DE PLASTICIDADE NORMA DNER ME - 082/94							
Cápsula	N.º	10	03	18	54	32	
Peso Bruto Úmido	g	8,13	8,11	7,69	7,30	7,59	
Peso Bruto Seco	g	7,80	7,75	7,34	7,01	7,28	
Peso da Cápsula	g	6,15	5,96	5,61	5,52	5,80	
Peso da Água	g	0,33	0,36	0,35	0,29	0,31	
Peso do Solo Seco	g	1,65	1,79	1,73	1,49	1,48	
Umidade	%	20,00	20,11	20,23	19,46	20,95	
Índice de Plasticidade LL= 29,7% LP = 20,2% IP= 9,5%							



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DNIT- 138/2010 - ES

E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA



Folha:

Única

Data:

08/07/2025

Rodovia:		Trecho:		Sub-trecho:		Registro:	
SEDE DE RORAINÓPOLIS		BAIRRO VITÓRIA		RUA G		SONDAGEM DE	
Estaca:	Furo:	Profundidade:		Material:		SUBLEITO	
	8	0,75		Argila Silte Arenoso Cinza			
% Mat. Ret. # N° 4:	Próctor:		Golpes:		Operador:		Lado
0,00%	NORMAL		12		FERNADO		L / X
Item	Unid.	1	2	3	4	5	6
Cápsula N°	-						
Peso Bruto Úmido	g						
Peso Bruto Seco	g						
Peso da Água	g						
Peso da Cápsula	g						
Peso do Solo Seco	g						
Umidade	%						
Umidade calculada	%	9,0%	10,6%	12,2%	13,8%	15,3%	
Água Total	g	513	603	693	783	873	
Água Adicionada	g	200	290	380	470	560	
% Água Adicionada	%	3,33%	4,83%	6,33%	7,83%	9,33%	
Peso Bruto Úmido	g	7.350	7.620	8.186	8.070	8.340	
Peos do Solo Úmido	g	3.225	3.535	3.942	3.738	3.626	
Dens. Solo Úmido	g / m³	1.542	1.762	1.877	1.863	1.736	
Dens. Solo Seco	g / m³	1.415	1.593	1.673	1.638	1.505	
Resultados:		Observações:					
H. Ótima	Dens. Máx	ISC	Expansão				
12,5 %	1.676	16,7	0,10				



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE EXPANSÃO / I.S.C



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS




OBRA:					DATA:	
					08/07/2025	
RODOVIA:			TRECHO:			OPERADO:
SEDE DE RORAINÓPOLIS			BAIRRO VITÓRIA			FERNADO
ESTACA:		LADO:	FURO:	PROFUNDIDADE:	GOLPES:	ESTUDO:
0		L / X	8	0,75	12	SUBLEITO
% MATERIAL RET. PEN. Nº 4			PROCTOR:		MATERIAL:	
0,00%			NORMAL		Argila Silte Arenoso Cinza	

ENSAIO DE EXPANSÃO NORMA DNER - ME 049/94

MOLDE Nº	22	ALTURA			114,5	MOLDE Nº	35	ALTURA			114,5	MOLDE Nº	27	ALTURA			114,5
DATA	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%		HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%			HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%		
08/07/25	10:00	1,00		0,00		10:00	1,00		0,00			10:00	1,00	0,00	0,00		
12/07/25	09:00	1,51	0,51	0,45		09:00	1,25	0,25	0,22			09:00	1,03	0,03	0,03		

ENSAIO DE I.S.C NORMA DNIT 172/2016 - ME

MOLDE Nº 22			K-PRENSA =			0,110	MOLDE Nº 35				MOLDE Nº 27			
PENETR. mm	TEMPO min	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	
0.63	0.5	5	0,50			35	3,80			3	0,30			
1.27	1.0	10	1,10			55	6,00			7	0,80			
1.90	1.5	15	1,60			80	8,80			11	1,20			
2.54	2.0	20	2,20	70	3,10	110	12,10	70	17,30	16	1,80	70	2,60	
3.81	3.0	25	2,70			135	14,80			21	2,30			
5.08	4.0	30	3,30	105	3,10	160	17,60	105	16,80	27	3,00	105	2,90	
6.35	5.0	35	3,80			210	23,10			31	3,40			
7.62	6.0	40	4,40			240	26,40			35	3,80			
8.89	7.0	45	4,90			255	28,00			40	4,40			
10.16	8.0	50	5,50			275	30,20			43	4,70			
12.70	10.0	55	6,00			300	32,90			48	5,30			

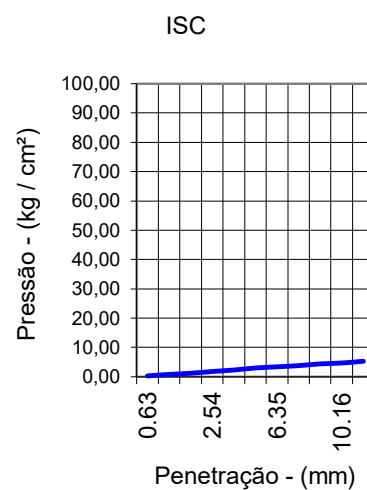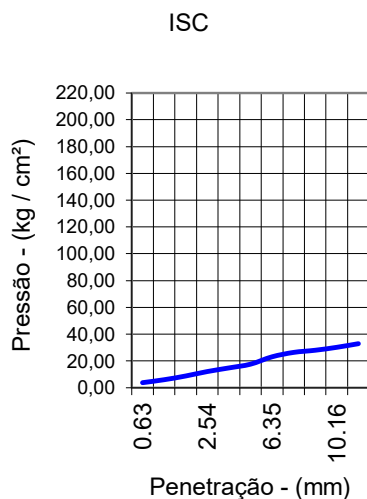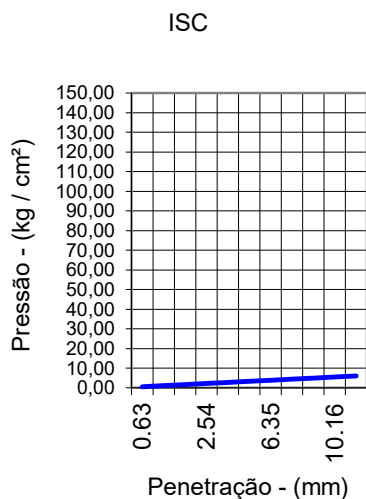

RESUMO

DENSIDADE MÁXIMA:	1676	g / cm³	ISC :	16,75	%
ÚMIDADE ÓTIMA:	12,48	%	EXPANSÃO :	0,10	%



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda


**Análise Granulométrica NORMA DNER ME -080/94
(Simples)**PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS

Rodovia:	SEDE DE RORAINÓPOLIS	Profundidade:	0,75
Trecho:	BAIRRO VITÓRIA	Furo :	8
Procedência:	SONDAGEM DE	Estaca:	0
Camada:	SUBLEITO	Operado	FERNADO
		Data:	08/07/25

UMIDADE HIDROSCÓPICA			DISCRIMINAÇÃO		AMOSTRA SECA	
					Total	Parcial
Cápsula (N°)	02	31	Cápsula (N°)		33	31
Peso Umido (g)	60,20	64,21	Peso Bruto Úmido (g)		1500,0	150,0
Peso Bruto Seco (g)	58,00	62,00	Peso Retido na # N° 10 (g)		0,00	
Peso da Água (g)	2,20	2,21	Peso Úmido Pass. na # N° 10 (g)		1500,00	
Peso da Cápsula (g)	19,11	20,59	Peso Seco Pass. na # N° 10 (g)		1421,80	
Peso do Solo Seco (g)	38,89	41,41	Peso da água (g)		78,20	
Umidade (%)	5,66	5,34	Peso da amostra Seca (g)		2 1421,8	3 142,2
Umidade Média (%)	5,5					


Peneiramento

Amostra Total	Peneiras		Peso Retido Parcial (g)	Peso que Passa Acumulado (g)	% que Passa Am. Total	FAIXA AASTHO		CONSTANTES
	Pol	mm				Mínimo	Máximo	
	2"	50,8	0,00	1421,8	100,0			K ₁ =100 = 0,070 2
	1 1/2"	38,1	0,00	1421,8	100,0			K ₂ = 4 = 0,703 3
	1"	25,4	0,00	1421,8	100,0			
	3/8"	9,5	0,00	1421,8	100,0			
	4	4,8	0,00	1421,8	100,0			
	10	2,0	0,00	1421,8	100,0			
Amostra Parcial	40	0,42	45,60	96,6	68,0			
	200	0,074	78,88	17,7	12,0			

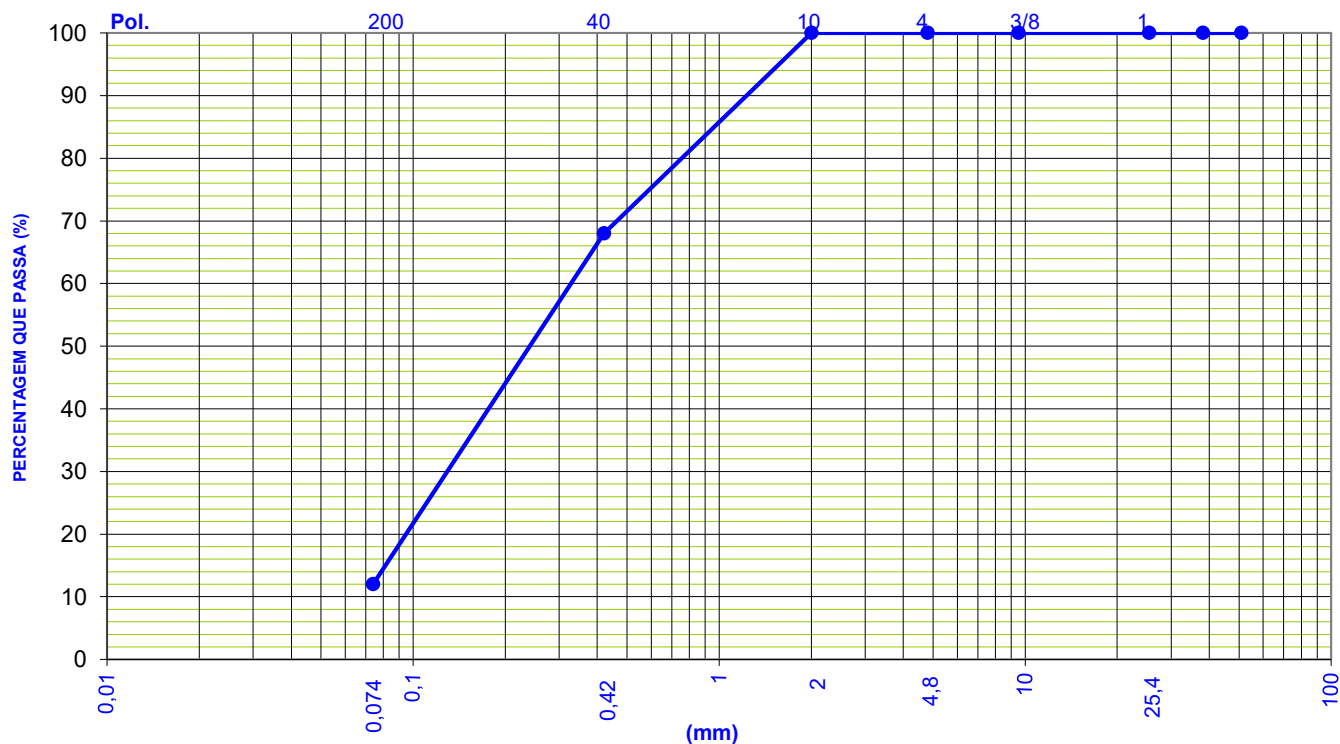**Resumo Granulometria (%)**

Pedregulho (> 4,8 mm)	0,0
Areia Grossa (4,8 - 2,0 mm)	0,0
Areia Média (2,0 - 0,42 mm)	32,0
Areia Fina (0,42 - 0,074 mm)	56,0
Passando (0,074 mm)	12,0
Total	100,0

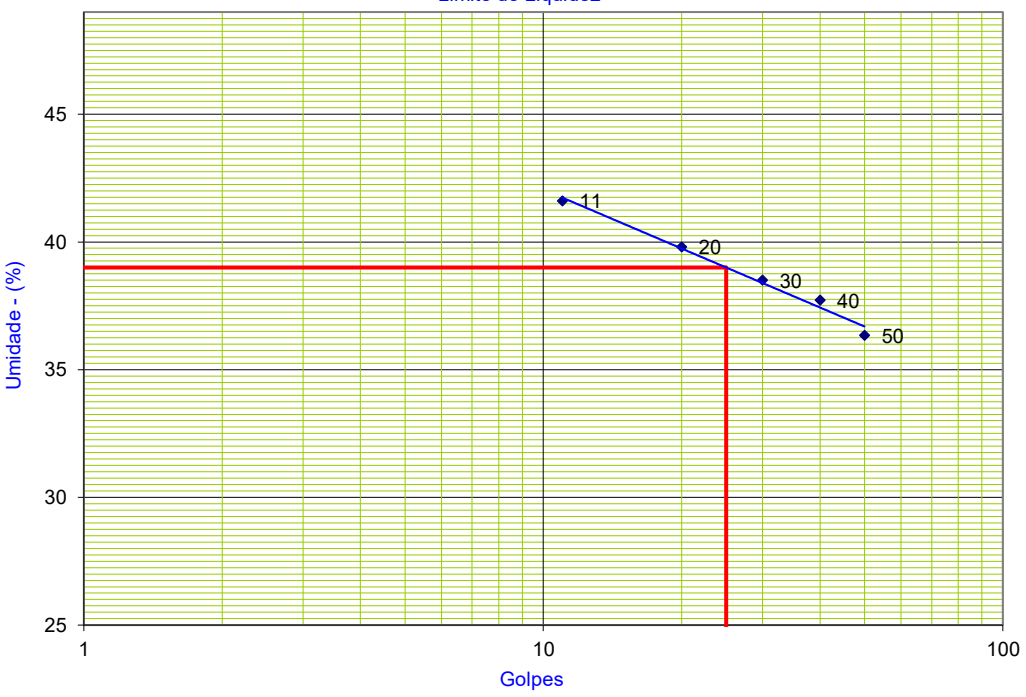

 		LIMITES FÍSICOS  RORAINÓPOLIS					
Rodovia: SEDE DE RORAINÓPOLIS		Profund.: 0,75		OPERADO FERNANDO			
Trecho: BAIRRO VITÓRIA		Furo : 8					
Procedência: SONDAGEM DE		Estaca: 0					
Camada: SUBLEITO		Data: 09/07/2025		LADO L / X			
LIMITE DE LIQUEDEZ NORMA DNER ME - 122/94							
Cápsula	N.º	10	71	91	86	82	
Golpes	g	11	20	30	40	50	
Peso Bruto Úmido	g	14,77	15,25	12,40	15,20	10,97	
Peso Bruto Seco	g	12,29	12,71	10,49	12,79	9,52	
Peso da Cápsula	g	6,33	6,33	5,53	6,40	5,53	
Peso da Água	g	2,48	2,54	1,91	2,41	1,45	
Peso do Solo Seco	g	5,96	6,38	4,96	6,39	3,99	
Umidade	%	41,61	39,81	38,51	37,72	36,34	
LIMITE DE PLASTICIDADE NORMA DNER ME - 082/94							
Cápsula	N.º	04	15	07	18	21	
Peso Bruto Úmido	g	8,79	8,22	8,09	8,03	6,56	
Peso Bruto Seco	g	8,27	7,67	7,56	7,56	6,30	
Peso da Cápsula	g	6,43	5,68	5,54	5,81	5,33	
Peso da Água	g	0,52	0,55	0,53	0,47	0,26	
Peso do Solo Seco	g	1,84	1,99	2,02	1,75	0,97	
Umidade	%	28,26	27,64	26,24	26,86	26,80	
Índice de Plasticidade LL= 39,0% LP = 27,2% IP= 11,8%		Limite de Liquedez 					



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DNIT- 138/2010 - ES

E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS

Folha:


Única

Data:


08/07/2025

Rodovia: SEDE DE RORAINÓPOLIS		Trecho: BAIRRO VITÓRIA			Sub-trecho: RUA H			Registro: SONDAGEM DE					
Estaca:	Furo: 9	Profundidade: 0,50		Material: Argila Silte Arenoso Cinza			SUBLEITO						
% Mat. Ret. # N° 4: 0,00%	Próctor: NORMAL		Golpes: 12		Operador: FERNADO		Lado L / X						
Item	Unid.	1	2	3	4	5	6	Umidade Higroscópica					
Cápsula N°	-							85	65				
Peso Bruto Úmido	g							58,42	62,55				
Peso Bruto Seco	g							57,00	61,00				
Peso da Água	g							1,42	1,55				
Peso da Cápsula	g							19,11	20,59				
Peso do Solo Seco	g							37,89	40,41				
Umidade	%							3,75%	3,84%				
Umidade calculada	%	7,8%	9,3%	10,9%	12,4%	14,0%		3,8%					
Água Total	g	449	539	629	719	809		Peso do Material					
Água Adicionada	g	230	320	410	500	590		6.000,00					
% Água Adicionada	%	3,83%	5,33%	6,83%	8,33%	9,83%		P. Mat. Seco	Peso Água				
Peso Bruto Úmido	g	7.650	7.830	8.240	8.140	8.690		5.781	219				
Peos do Solo Úmido	g	3.525	3.745	4.133	3.936	3.976		Moldes					
Dens. Solo Úmido	g / m³	1.686	1.867	1.980	1.962	1.903		N°	Peso	Volume			
Dens. Solo Seco	g / m³	1.564	1.708	1.786	1.745	1.670		20	4.125	2.091			
Resultados:			Observações:								62	4.085	2.006
											67	4.107	2.087
H. Ótima	Dens. Máx	ISC	Expansão	71	4.204	2.006							
11,1 %	1.787	11,1	0,11	42	4.714	2.089							


Análise Gráfica

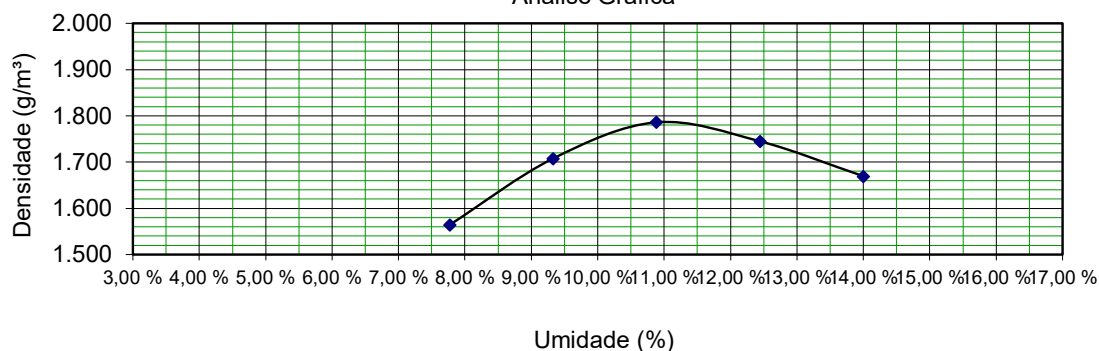

Índice de Suporte Califórnia

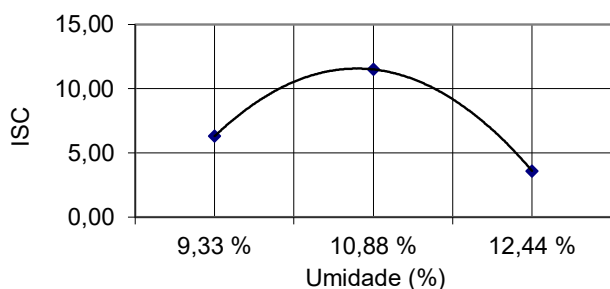

Expansão

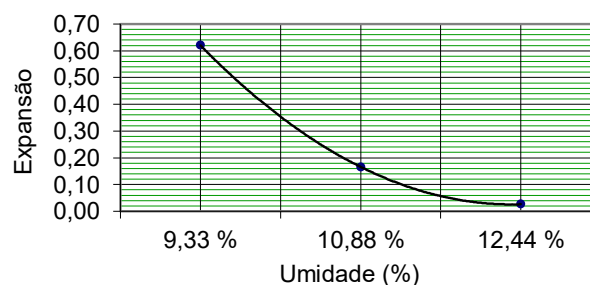



CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE EXPANSÃO / I.S.C



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS




OBRA:		DATA:	08/07/2025
RODOVIA:	SEDE DE RORAINÓPOLIS	TRECHO:	BAIRRO VITÓRIA
ESTACA:	0	LADO:	L / X
FURO:	9	PROFUNDIDADE:	0,50
GOLPES:	12	ESTUDO:	SUBLEITO
% MATERIAL RET. PEN. Nº 4	0,00%	PROCTOR:	NORMAL
MATERIAL:	Argila Silte Arenoso Cinza		

ENSAIO DE EXPANSÃO NORMA DNER - ME 049/94

MOLDE N° 62		ALTURA 114,5			MOLDE N° 67		ALTURA 114,5		MOLDE N° 71		ALTURA 114,5	
DATA	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%
08/07/25	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00	0,00	0,00
												
12/07/25	09:00	1,71	0,71	0,62	09:00	1,19	0,19	0,17	09:00	1,03	0,03	0,03

ENSAIO DE I.S.C NORMA DNIT 172/2016 - ME

MOLDE Nº 62			K-PRENSA = 0,110			MOLDE Nº 67				MOLDE Nº 71			
PENETR. mm	TEMPO min	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %
0.63	0.5	10	1,10			25	2,70			5	0,50		
1.27	1.0	18	2,00			38	4,20			10	1,10		
1.90	1.5	27	3,00			55	6,00			15	1,60		
2.54	2.0	37	4,10	70	5,90	65	7,10	70	10,10	20	2,20	70	3,10
3.81	3.0	49	5,40			80	8,80			27	3,00		
5.08	4.0	60	6,60	105	6,30	110	12,10	105	11,50	35	3,80	105	3,60
6.35	5.0	75	8,20			125	13,70			48	5,30		
7.62	6.0	90	9,90			150	16,50			55	6,00		
8.89	7.0	110	12,10			175	19,20			65	7,10		
10.16	8.0	125	13,70			200	22,00			80	8,80		
12.70	10.0	137	15,00			215	23,60			95	10,40		

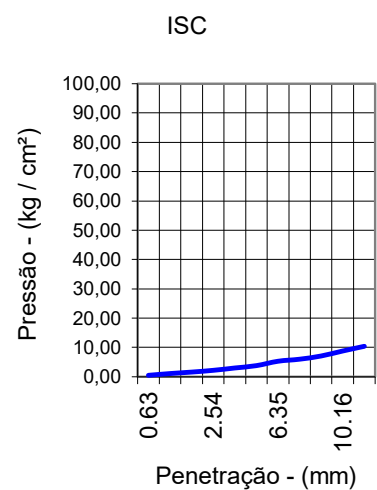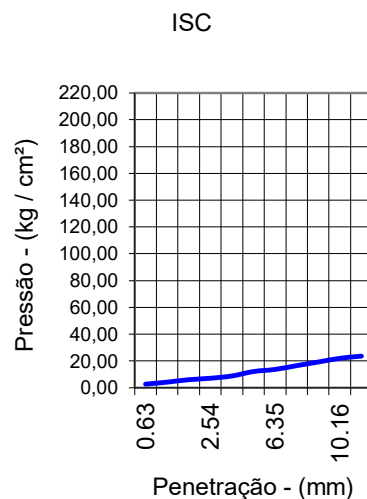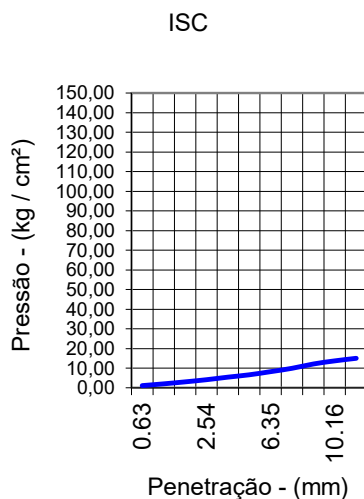

RESUMO

DENSIDADE MÁXIMA: 1787 g / cm³

ISC : 11,13 %

ÚMIDADE ÓTIMA: 11,13 %


EXPANSÃO : 0,11 %

Rodovia:	SEDE DE RORAINÓPOLIS	Profundidade:	0,50
Trecho:	BAIRRO VITÓRIA	Furo :	9
Procedência:	SONDAGEM DE	Estaca:	0
Camada:	SUBLEITO	OPERADO	FERNADO
		Data:	08/07/25

UMIDADE HIDROSCÓPICA		DISCRIMINAÇÃO		AMOSTRA SECA	
				Total	Parcial
Cápsula (N°)	85	65	Cápsula (N°)	33	31
Peso Umido (g)	58,42	62,55	Peso Bruto Úmido (g)	1500,0	150,0
Peso Bruto Seco (g)	57,00	61,00	Peso Retido na # N° 10 (g)	9,60	
Peso da Água (g)	1,42	1,55	Peso Úmido Pass. na # N° 10 (g)	1490,40	
Peso da Cápsula (g)	19,11	20,59	Peso Seco Pass. na # N° 10 (g)	1435,90	
Peso do Solo Seco (g)	37,89	40,41	Peso da água (g)	54,50	
Umidade (%)	3,75	3,84	Peso da amostra Seca (g)	2 1445,5	3 144,5
Umidade Média (%)	3,8				

Peneiramento



Amostra Total	Peneiras		Peso Retido Parcial (g)	Peso que Passa Acumulado (g)	% que Passa Am.Total	FAIXA AASTHO		CONSTANTES
	Pol	mm				Mínimo	Máximo	
	2"	50,8	0,00	1445,5	100,0			K ₁ =100 = 0,069 2
	1 1/2"	38,1	0,00	1445,5	100,0			
	1"	25,4	0,00	1445,5	100,0			K ₂ = 4 = 0,685 3
	3/8"	9,5	0,00	1445,5	100,0			
	4	4,8	0,00	1445,5	100,0			
	10	2,0	9,60	1435,9	4 99,0			
Amostra Parcial	40	0,42	57,60	86,9	60,0			
	200	0,074	45,30	41,6	28,0			

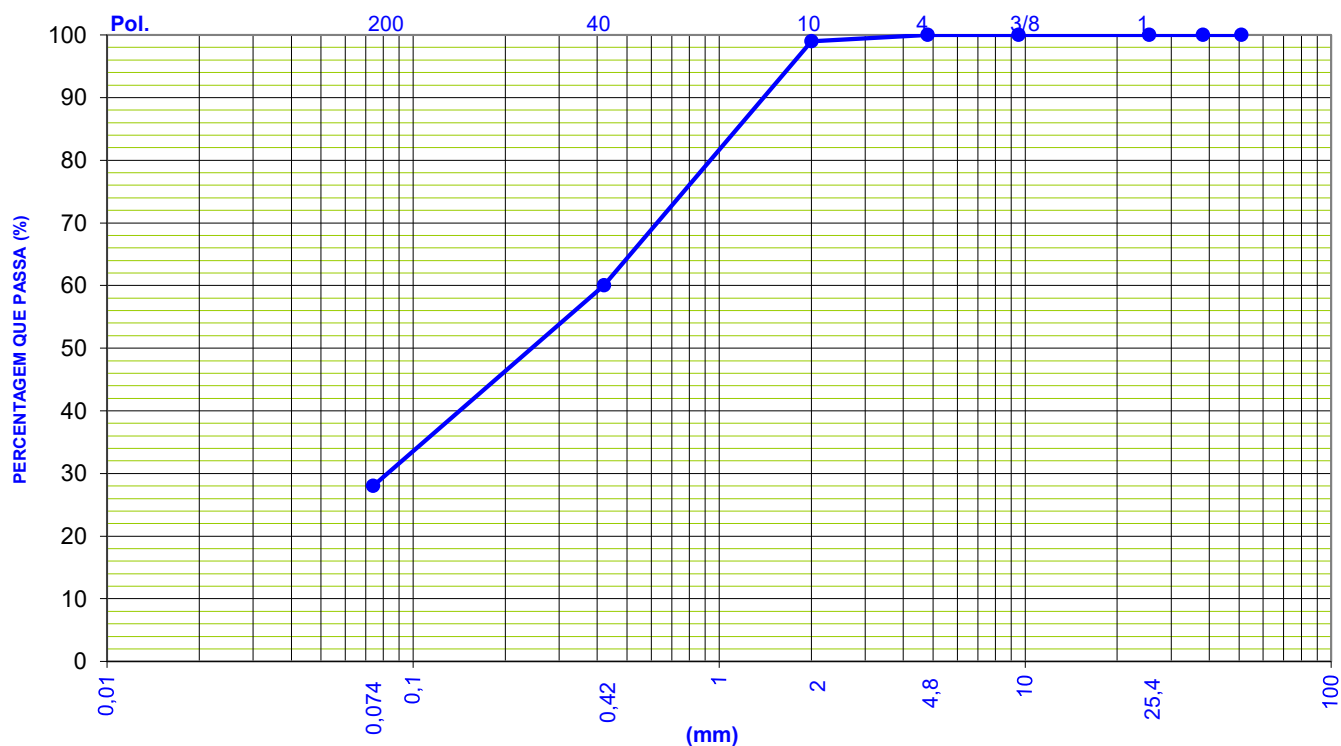

Resumo Granulometria (%)

Pedregulho (> 4,8 mm)	0,0
Areia Grossa (4,8 - 2,0 mm)	1,0
Areia Média (2,0 - 0,42 mm)	39,0
Areia Fina (0,42 - 0,074 mm)	32,0
Passando (0,074 mm)	28,0
Total	100,0

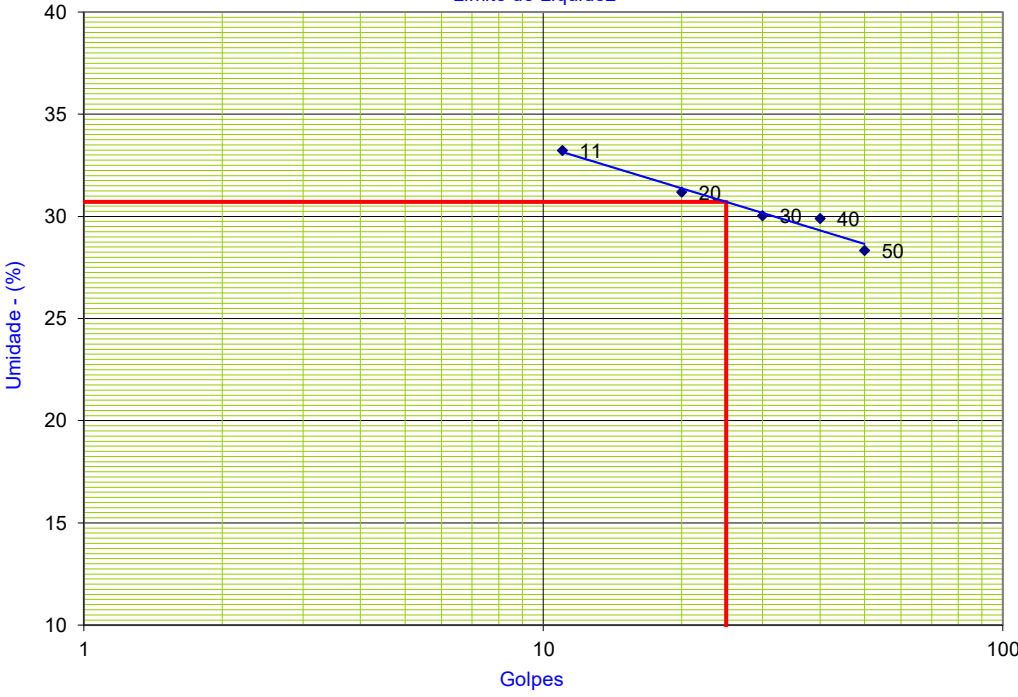

 		LIMITES FÍSICOS  PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS					
Rodovia: SEDE DE RORAINÓPOLIS		Profund.: 0,50		OPERADO FERNADO			
Trecho: BAIRRO VITÓRIA		Furo : 9					
Procedência: SONDAGEM DE		Estaca: 0					
Camada: SUBLEITO		Data: 09/07/2025		LADO: L / X			
LIMITE DE LIQUEDEZ NORMA DNER ME - 122/94							
Cápsula	N.º	10	65	23	40	74	
Golpes	g	11	20	30	40	50	
Peso Bruto Úmido	g	14,27	14,70	11,98	14,70	10,65	
Peso Bruto Seco	g	12,29	12,71	10,49	12,79	9,52	
Peso da Cápsula	g	6,33	6,33	5,53	6,40	5,53	
Peso da Água	g	1,98	1,99	1,49	1,91	1,13	
Peso do Solo Seco	g	5,96	6,38	4,96	6,39	3,99	
Umidade	%	33,22	31,19	30,04	29,89	28,32	
LIMITE DE PLASTICIDADE NORMA DNER ME - 082/94							
Cápsula	N.º	22	55	32	46	85	
Peso Bruto Úmido	g	8,62	8,08	7,98	7,92	6,50	
Peso Bruto Seco	g	8,27	7,67	7,56	7,56	6,30	
Peso da Cápsula	g	6,43	5,68	5,54	5,81	5,33	
Peso da Água	g	0,35	0,41	0,42	0,36	0,20	
Peso do Solo Seco	g	1,84	1,99	2,02	1,75	0,97	
Umidade	%	19,02	20,60	20,79	20,57	20,62	
Índice de Plasticidade LL= 30,7% LP = 20,6% IP= 10,1%							



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DNIT- 138/2010 - ES

E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA



Folha:


Única

Data:


08/07/2025

Rodovia: SEDE DE RORAINÓPOLIS		Trecho: BAIRRO VITÓRIA		Sub-trecho: RUA I			Registro: SONDAGEM DE					
Estaca:	Furo: 10	Profundidade: 0,61		Material: Argila Silte Arenoso Siltosa Cinza			SUBLEITO					
% Mat. Ret. # N° 4: 2,00%	Próctor: NORMAL		Golpes: 12		Operador: FERNADO		Lado L / X					
Item	Unid.	1	2	3	4	5	6	Umidade Higroscópica				
Cápsula N°	-							48	12			
Peso Bruto Úmido	g							60,30	59,20			
Peso Bruto Seco	g							59,00	57,80			
Peso da Água	g							1,30	1,40			
Peso da Cápsula	g							19,11	20,59			
Peso do Solo Seco	g							39,89	37,21			
Umidade	%							3,26%	3,76%			
Umidade calculada	%	7,1%	9,2%	11,3%	13,3%	15,4%		3,5%				
Água Total	g	413	533	653	773	893		Peso do Material				
Água Adicionada	g	210	330	450	570	690		6.000,00				
% Água Adicionada	%	3,50%	5,50%	7,50%	9,50%	11,50%		P. Mat. Seco	Peso Água			
Peso Bruto Úmido	g	8.100	7.960	8.600	8.240	8.820		5.797	203			
Peos do Solo Úmido	g	3.700	3.875	4.300	4.095	4.106		Moldes				
Dens. Solo Úmido	g / m³	1.771	1.932	2.048	2.041	1.966		N°	Peso	Volume		
Dens. Solo Seco	g / m³	1.653	1.769	1.840	1.801	1.703		34	4.400	2.089		
Resultados:				Observações:								
H. Ótima	Dens. Máx	ISC	Expansão									
11,6 %	1.841	16,4	0,10									


Análise Gráfica

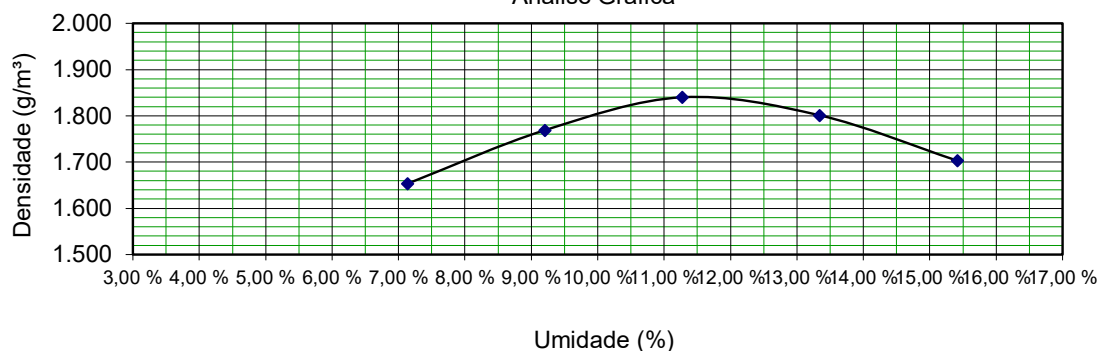

Índice de Suporte Califórnia

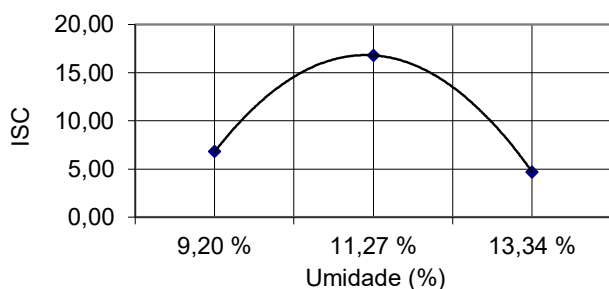

Expansão

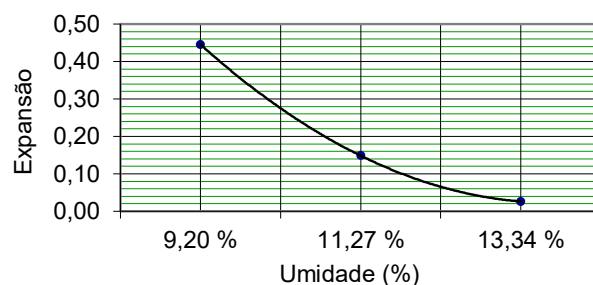



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE EXPANSÃO / I.S.C



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

OBRA:

DATA:

08/07/2025

RODOVIA:

TRECHO:

OPERADO:

SEDE DE RORAINÓPOLIS

BAIRRO VITÓRIA

FERNADO

ESTACA:

LADO:

FURO:

PROFUNDIDADE:

GOLPES:

ESTUDO:

0

L / X

10

0,61

12

SUBLEITO

% MATERIAL RET. PEN. N° 4

PROCTOR:

MATERIAL:

2,00%

NORMAL

Argila Silte Arenoso Siltosa Cinza


ENSAIO DE EXPANSÃO NORMA DNER - ME 049/94

MOLDE N° 81		ALTURA 114,5			MOLDE N° 16		ALTURA 114,5		MOLDE N° 10		ALTURA 114,5	
DATA	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%
08/07/25	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00	0,00	0,00
												
12/07/25	09:00	1,51	0,51	0,45	09:00	1,17	0,17	0,15	09:00	1,03	0,03	0,03

ENSAIO DE I.S.C NORMA DNIT 172/2016 - ME


MOLDE N° 81			K-PRENSA = 0,110			MOLDE N° 16				MOLDE N° 10			
PENETR. mm	TEMPO min	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %
0.63	0.5	20	2,20			45	4,90			15	1,60		
1.27	1.0	25	2,70			65	7,10			20	2,20		
1.90	1.5	30	3,30			85	9,30			25	2,70		
2.54	2.0	35	3,80	70	5,40	100	11,00	70	15,70	30	3,30	70	4,70
3.81	3.0	50	5,50			120	13,20			40	4,40		
5.08	4.0	65	7,10	105	6,80	160	17,60	105	16,80	45	4,90	105	4,70
6.35	5.0	75	8,20			200	22,00			60	6,60		
7.62	6.0	95	10,40			230	25,30			65	7,10		
8.89	7.0	105	11,50			265	29,10			75	8,20		
10.16	8.0	115	12,60			325	35,70			95	10,40		
12.70	10.0	125	13,70			360	39,50			105	11,50		

ISC

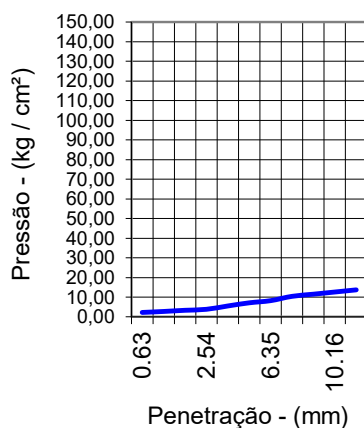


ISC = 6,80 %

ISC

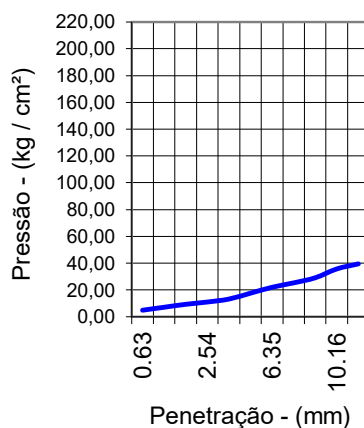

ISC = 16,80 %

ISC

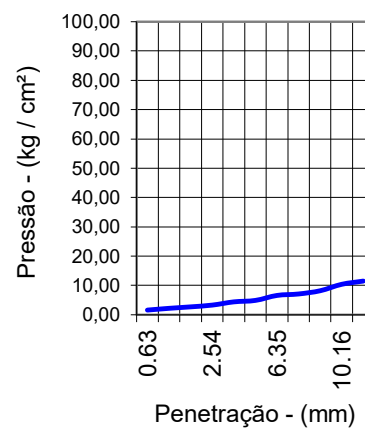

ISC = 4,70 %

RESUMO

DENSIDADE MÁXIMA: 1841 g / cm³

ISC : 16,41 %

ÚMIDADE ÓTIMA: 11,58 %

EXPANSÃO : 0,10 %



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA. Via Norte Construtora Ltda

**Análise Granulométrica NORMA DNER ME -080/94 (Simples)**


PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

Rodovia:	SEDE DE RORAINÓPOLIS	Profundidade:	0,61
Trecho:	BAIRRO VITÓRIA	Furo :	10
Procedência:	SONDAGEM DE	Estaca:	0
Camada:	SUBLEITO	Operado	FERNADO
		Data:	08/07/25

UMIDADE HIDROSCÓPICA			DISCRIMINAÇÃO		AMOSTRA SECA	
					Total	Parcial
Cápsula (N°)	48	12	Cápsula (N°)		31	11
Peso Umido (g)	60,30	59,20	Peso Bruto Úmido (g)		1500,0	150,0
Peso Bruto Seco (g)	59,00	57,80	Peso Retido na # N° 10 (g)		62,10	
Peso da Água (g)	1,30	1,40	Peso Úmido Pass. na # N° 10 (g)		1437,90	
Peso da Cápsula (g)	19,11	20,59	Peso Seco Pass. na # N° 10 (g)		1389,10	
Peso do Solo Seco (g)	39,89	37,21	Peso da água (g)		48,80	
Umidade (%)	3,26	3,76	Peso da amostra Seca (g)		2 1451,2	3 144,9
Umidade Média (%)	3,5					



Peneiramento

Amostra Total	Peneiras		Peso Retido Parcial (g)	Peso que Passa Acumulado (g)	% que Passa Am.Total	FAIXA AASTHO		CONSTANTES
	Pol	mm				Mínimo	Máximo	
	2"	50,8	0,00	1451,2	100,0			K ₁ =100 = 0,069
	1 1/2"	38,1	0,00	1451,2	100,0			2
	1"	25,4	0,00	1451,2	100,0			K ₂ = 4 = 0,663
	3/8"	9,5	4,40	1446,8	100,0			3
	4	4,8	27,60	1419,2	98,0			
	10	2,0	30,10	1389,1	96,0			4
Amostra Parcial	40	0,42	15,10	129,8	86,0			
	200	0,074	69,60	60,2	40,0			

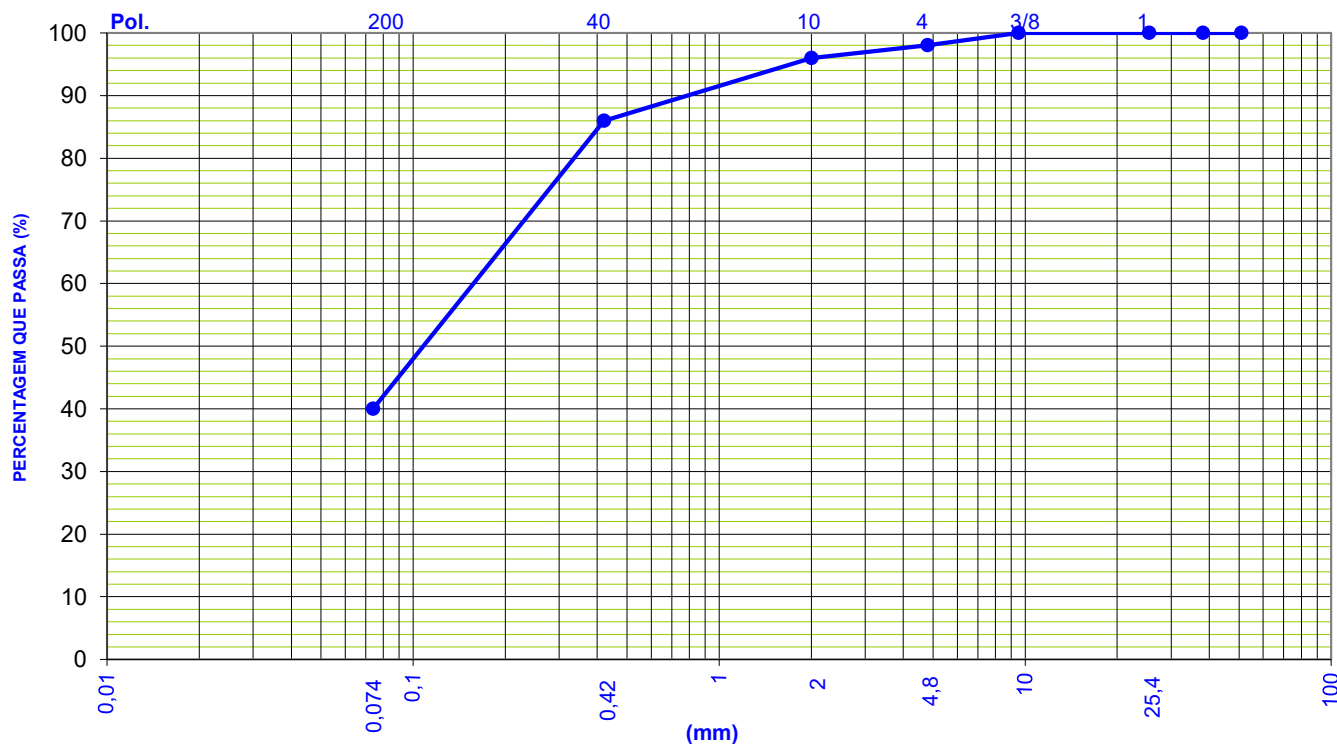**Resumo Granulometria (%)**

Pedregulho (> 4,8 mm)	2,0
Areia Grossa (4,8 - 2,0 mm)	2,0
Areia Média (2,0 - 0,42 mm)	10,0
Areia Fina (0,42 - 0,074 mm)	46,0
Passando (0,074 mm)	40,0
Total	100,0

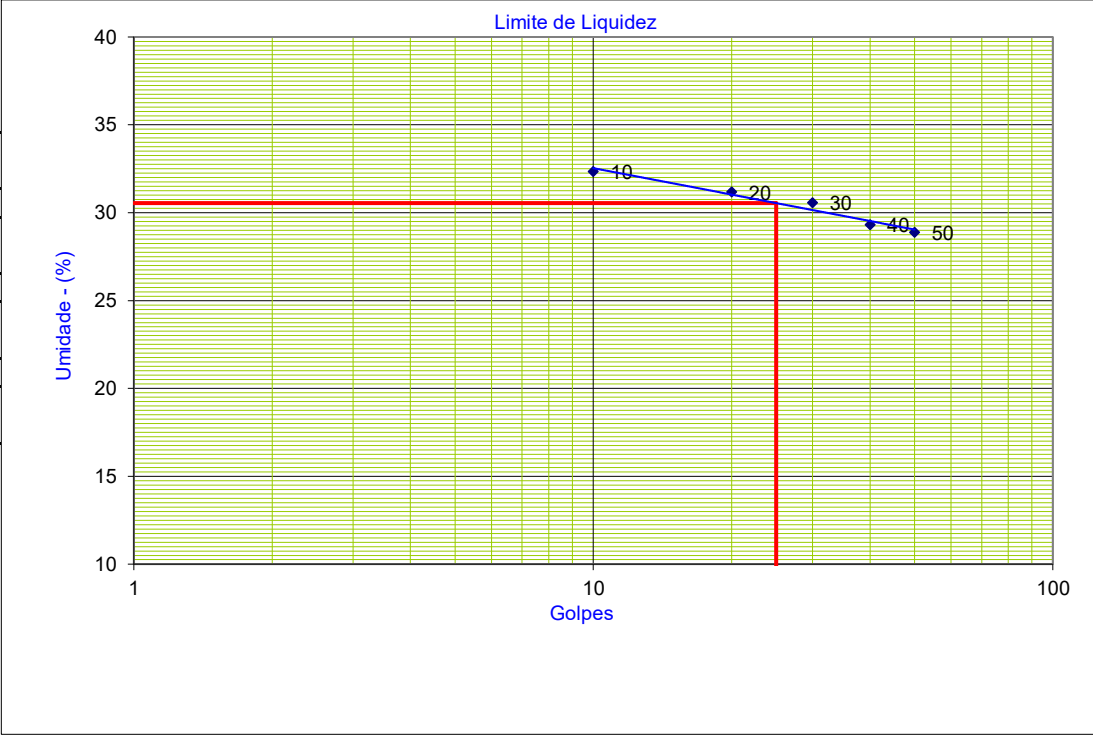

  MTEC CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA. Via Norte Construtora Ltda		LIMITES FÍSICOS  PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS					
Rodovia: SEDE DE RORAINÓPOLIS		Profund.: 0,61	LADO: L / X				
Trecho: BAIRRO VITÓRIA		Furo : 10					
Procedência: SONDAGEM DE		Estaca: 0					
Camada: SUBLEITO		Data: 09/07/2025 OPERADO: FERNADO					
LIMITE DE LIQUIDEZ NORMA DNER ME - 122/94							
Cápsula	N.º	50	10	63	81	95	
Golpes	g	10	20	30	40	50	
Peso Bruto Úmido	g	25,15	35,15	21,00	24,51	25,61	
Peso Bruto Seco	g	20,43	28,30	17,42	20,19	21,14	
Peso da Cápsula	g	5,84	6,33	5,71	5,45	5,66	
Peso da Água	g	4,72	6,85	3,58	4,32	4,47	
Peso do Solo Seco	g	14,59	21,97	11,71	14,74	15,48	
Umidade	%	32,35	31,18	30,57	29,31	28,88	
LIMITE DE PLASTICIDADE NORMA DNER ME - 082/94							
Cápsula	N.º	74	05	01	08	40	
Peso Bruto Úmido	g	8,13	8,11	7,72	7,32	7,57	
Peso Bruto Seco	g	7,80	7,75	7,34	7,01	7,28	
Peso da Cápsula	g	6,15	5,96	5,61	5,52	5,80	
Peso da Água	g	0,33	0,36	0,38	0,31	0,29	
Peso do Solo Seco	g	1,65	1,79	1,73	1,49	1,48	
Umidade	%	20,00	20,11	21,97	20,81	19,59	
Índice de Plasticidade LL= 30,5% LP = 20,1% IP= 10,4%		 Limite de Liquidez Umidade - (%) Golpes					



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA



Via Norte Construtora Ltda

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DNIT- 138/2010 - ES

E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS

Folha:

Única

Data:

09/07/2025

Rodovia:		Trecho:		Sub-trecho:		Registro:	
SEDE DE RORAINÓPOLIS		BAIRRO VITÓRIA		RUA J		SONDAGEM DE	
Estaca:	Furo:	Profundidade:		Material:		SUBLEITO	
	11	0,78		Argila Arenoso Siltosa Cinza			
% Mat. Ret. # N° 4:	Próctor:		Golpes:		Operador:		Lado
1,00%	NORMAL		12		FERNADO		L / X
Item	Unid.	1	2	3	4	5	6
Cápsula N°	-						
Peso Bruto Úmido	g						
Peso Bruto Seco	g						
Peso da Água	g						
Peso da Cápsula	g						
Peso do Solo Seco	g						
Umidade	%						
Umidade calculada	%	6,2%	8,3%	10,4%	12,4%	14,5%	
Água Total	g	363	483	603	723	843	
Água Adicionada	g	185	305	425	545	665	
% Água Adicionada	%	3,08%	5,08%	7,08%	9,08%	11,08%	
Peso Bruto Úmido	g	7.750	7.950	8.306	8.440	8.850	
Peos do Solo Úmido	g	3.625	3.865	4.231	4.108	4.136	
Dens. Solo Úmido	g / m³	1.734	1.927	2.043	2.048	1.980	
Dens. Solo Seco	g / m³	1.632	1.779	1.851	1.822	1.730	
Resultados:		Observações:					
H. Ótima	Dens. Máx	ISC	Expansão				
10,8 %	1.854	15,8	0,08				



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE EXPANSÃO / I.S.C



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS




OBRA:		DATA:	09/07/2025
RODOVIA:	SEDE DE RORAINÓPOLIS	TRECHO:	BAIRRO VITÓRIA
ESTACA:	0	LADO:	L / X
FURO:	11	PROFUNDIDADE:	0,78
GOLPES:	12	ESTUDO:	SUBLEITO
% MATERIAL RET. PEN. Nº 4	1,00%	PROCTOR:	NORMAL
MATERIAL:	Argila Arenoso Siltosa Cinza		

ENSAIO DE EXPANSÃO NORMA DNER - ME 049/94

MOLDE Nº 66		ALTURA 114,5			MOLDE Nº 2		ALTURA 114,5		MOLDE Nº 27		ALTURA 114,5	
DATA	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%
09/07/25	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00	0,00	0,00
												
13/07/25	09:00	1,51	0,51	0,45	09:00	1,14	0,14	0,12	09:00	1,03	0,03	0,03

ENSAIO DE I.S.C NORMA DNIT 172/2016 - ME

MOLDE Nº 66			K-PRENSA =			0,110	MOLDE Nº 2				MOLDE Nº 27			
PENETR. mm	TEMPO min	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	
0.63	0.5	20	2,20			35	3,80			15	1,60			
1.27	1.0	25	2,70			57	6,30			20	2,20			
1.90	1.5	30	3,30			85	9,30			25	2,70			
2.54	2.0	40	4,40	70	6,30	105	11,50	70	16,40	30	3,30	70	4,70	
3.81	3.0	50	5,50			120	13,20			35	3,80			
5.08	4.0	60	6,60	105	6,30	145	15,90	105	15,10	45	4,90	105	4,70	
6.35	5.0	85	9,30			165	18,10			55	6,00			
7.62	6.0	100	11,00			180	19,80			65	7,10			
8.89	7.0	110	12,10			210	23,10			75	8,20			
10.16	8.0	115	12,60			235	25,80			90	9,90			
12.70	10.0	120	13,20			270	29,60			100	11,00			

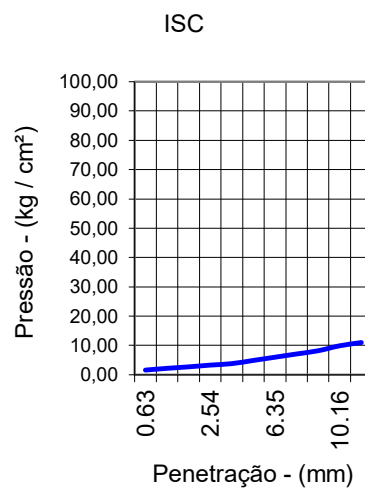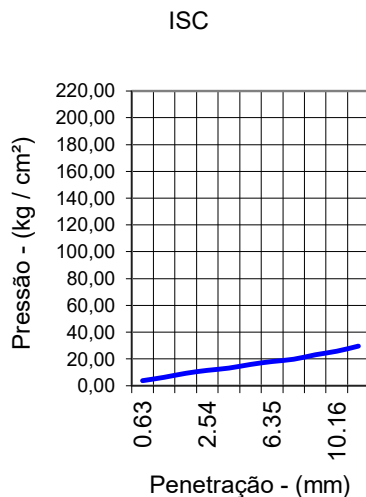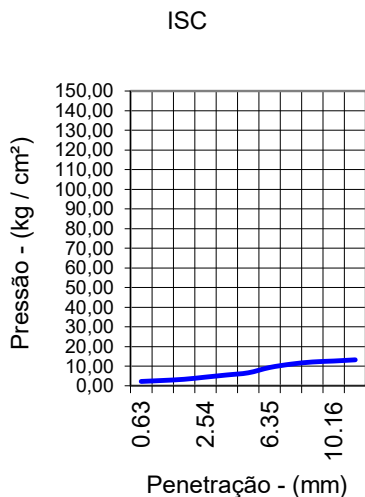

RESUMO

DENSIDADE MÁXIMA: 1854 g / cm³

ISC : 15,76 %

ÚMIDADE ÓTIMA: 10,78 %

EXPANSÃO : 0,08 %



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda


**Análise Granulométrica NORMA DNER ME -080/94
(Simples)**PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS

Rodovia:	SEDE DE RORAINÓPOLIS	Profundidade:	0,78
Trecho:	BAIRRO VITÓRIA	Furo :	11
Procedência:		Estaca:	0
Camada:	SUBLEITO	OPERADO	FERNADO
		Data:	09/07/25

UMIDADE HIDROSCÓPICA		DISCRIMINAÇÃO		AMOSTRA SECA	
				Total	Parcial
Cápsula (N°)	31	45	Cápsula (N°)	33	31
Peso Umido (g)	58,17	62,22	Peso Bruto Úmido (g)	1500,0	150,0
Peso Bruto Seco (g)	57,00	61,00	Peso Retido na # N° 10 (g)	150,00	
Peso da Água (g)	1,17	1,22	Peso Úmido Pass. na # N° 10 (g)	1350,00	
Peso da Cápsula (g)	19,11	20,59	Peso Seco Pass. na # N° 10 (g)	1310,00	
Peso do Solo Seco (g)	37,89	40,41	Peso da água (g)	40,00	
Umidade (%)	3,09	3,02	Peso da amostra Seca (g)	2 1460,0	3 145,6
Umidade Média (%)	3,1				


Peneiramento

Amostra Total	Peneiras		Peso Retido Parcial (g)	Peso que Passa Acumulado (g)	% que Passa Am. Total	FAIXA AASTHO		CONSTANTES
	Pol	mm				Mínimo	Máximo	
	2"	50,8	0,00	1460,0	100,0			K ₁ =100 = 0,068 2
	1 1/2"	38,1	0,00	1460,0	100,0			
	1"	25,4	0,00	1460,0	100,0			K ₂ = 4 = 0,611 3
	3/8"	9,5	0,00	1460,0	100,0			
	4	4,8	0,00	1460,0	99,0			
	10	2,0	150,00	1310,0	4 89,0			
Amostra Parcial	40	0,42	58,90	86,7	53,0			
	200	0,074	45,88	40,8	25,0			

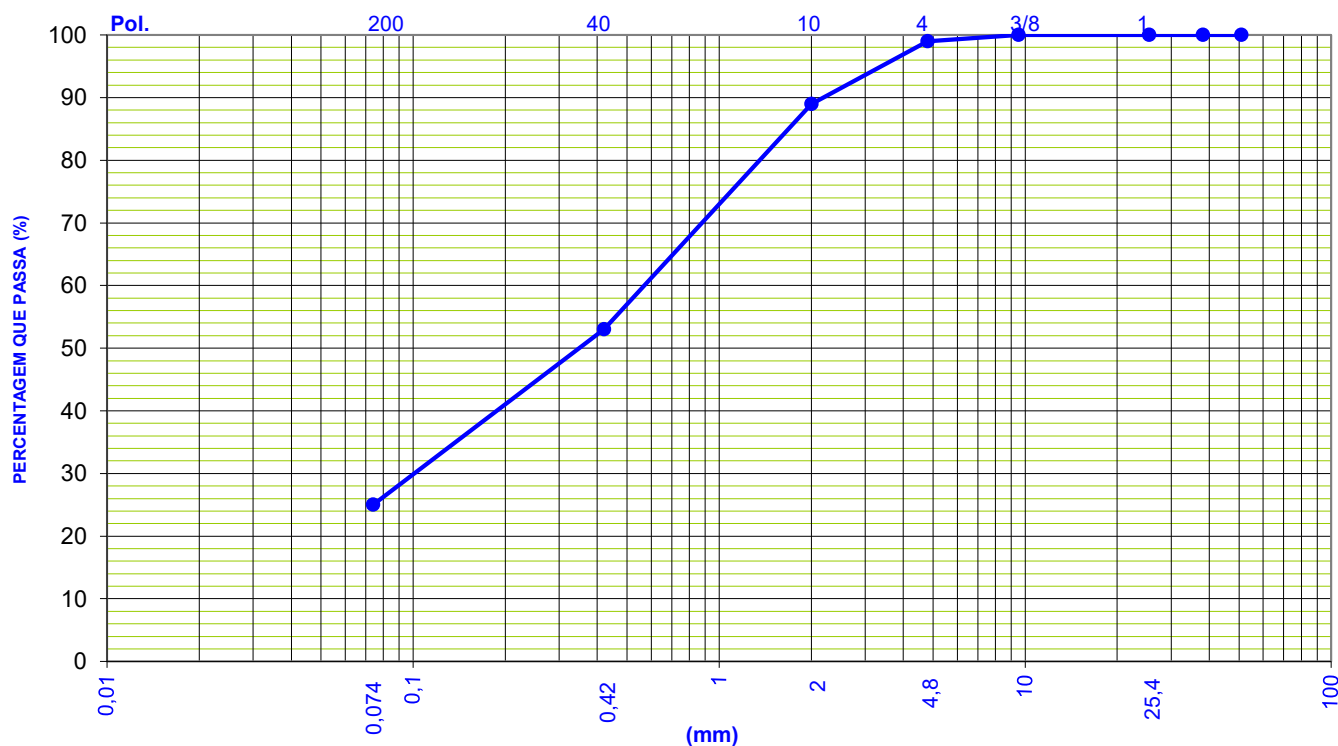**Resumo Granulometria (%)**

Pedregulho (> 4,8 mm)	1,0
Areia Grossa (4,8 - 2,0 mm)	10,0
Areia Média (2,0 - 0,42 mm)	36,0
Areia Fina (0,42 - 0,074 mm)	28,0
Passando (0,074 mm)	25,0
Total	100,0

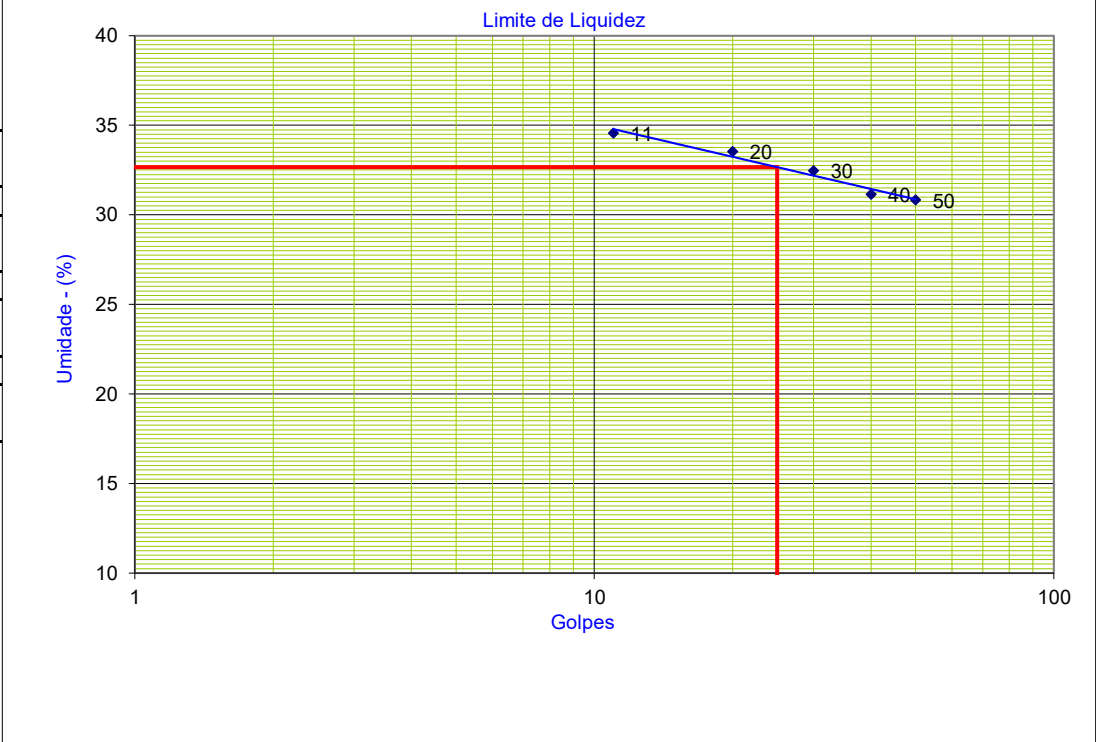

 		LIMITES FÍSICOS  PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS					
Rodovia: SEDE DE RORAINÓPOLIS		Profund.: 0,78		OPERADO FERNANDO			
Trecho: BAIRRO VITÓRIA		Furo : 11					
Procedência: SONDAGEM DE		Estaca: 0					
Camada: SUBLEITO		Data: 10/07/2025		LADO L / X			
LIMITE DE LIQUIDEZ NORMA DNER ME - 122/94							
Cápsula	N.º	20	45	25	32	71	
Golpes	g	11	20	30	40	50	
Peso Bruto Úmido	g	14,35	14,85	12,10	14,78	10,75	
Peso Bruto Seco	g	12,29	12,71	10,49	12,79	9,52	
Peso da Cápsula	g	6,33	6,33	5,53	6,40	5,53	
Peso da Água	g	2,06	2,14	1,61	1,99	1,23	
Peso do Solo Seco	g	5,96	6,38	4,96	6,39	3,99	
Umidade	%	34,56	33,54	32,46	31,14	30,83	
LIMITE DE PLASTICIDADE NORMA DNER ME - 082/94							
Cápsula	N.º	23	61	60	55	08	
Peso Bruto Úmido	g	8,67	8,07	7,98	7,92	6,51	
Peso Bruto Seco	g	8,27	7,67	7,56	7,56	6,30	
Peso da Cápsula	g	6,43	5,68	5,54	5,81	5,33	
Peso da Água	g	0,40	0,40	0,42	0,36	0,21	
Peso do Solo Seco	g	1,84	1,99	2,02	1,75	0,97	
Umidade	%	21,74	20,10	20,79	20,57	21,65	
Índice de Plasticidade LL= 32,7% LP = 21,0% IP= 11,7%							



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DNIT- 138/2010 - ES

E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA



Folha:


Única

Data:


09/07/2025

Rodovia: SEDE DE RORAINÓPOLIS		Trecho: BAIRRO VITÓRIA			Sub-trecho: RUA K FURO 1			Registro: SONDAGEM DE							
Estaca:		Furo: 12		Profundidade: 0,85		Material: Argila Arenoso Siltosa Cinza			SUBLEITO						
% Mat. Ret. # N° 4: 0,00%		Próctor: NORMAL			Golpes: 12		Operador: FERDANDO		Lado L / X						
Item		Unid.	1	2	3	4	5	6	Umidade Higroscópica						
Cápsula N°		-							45	78					
Peso Bruto Úmido		g							55,21	67,57					
Peso Bruto Seco		g							54,00	66,03					
Peso da Água		g							1,21	1,54					
Peso da Cápsula		g							19,11	20,59					
Peso do Solo Seco		g							34,89	45,44					
Umidade		%							3,47%	3,39%					
Umidade calculada		%	7,7%	9,3%	10,8%	12,4%	13,9%		3,4%						
Água Total		g	449	539	629	719	809		Peso do Material						
Água Adicionada		g	250	340	430	520	610		6.000,00						
% Água Adicionada		%	4,17%	5,67%	7,17%	8,67%	10,17%		P. Mat. Seco	Peso Água					
Peso Bruto Úmido		g	8.100	7.970	8.350	8.190	8.810		5.801	199					
Peos do Solo Úmido		g	3.700	3.885	4.225	4.065	4.096		Moldes						
Dens. Solo Úmido		g / m³	1.771	1.937	2.021	2.026	1.961		N°	Peso	Volume				
Dens. Solo Seco		g / m³	1.644	1.772	1.823	1.803	1.721		34	4.400	2.089				
Resultados:				Observações:											
H. Ótima	Dens. Máx	ISC	Expansão												
11,2 %	1.825	11,1	0,12												


Análise Gráfica

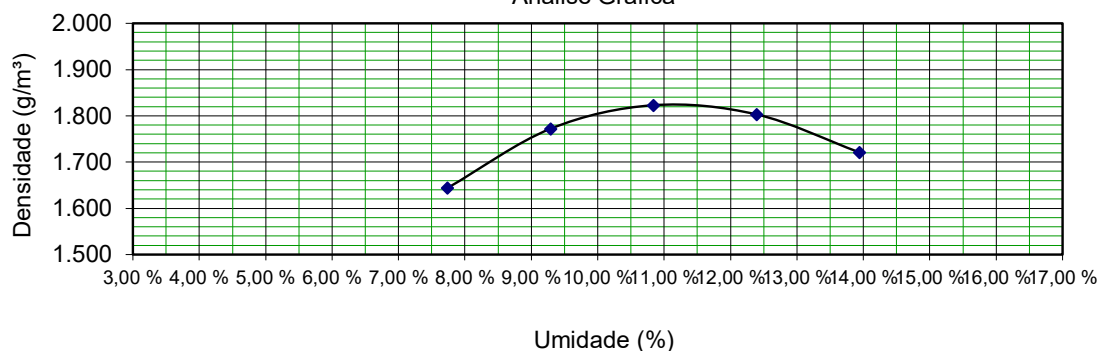

Índice de Suporte Califórnia

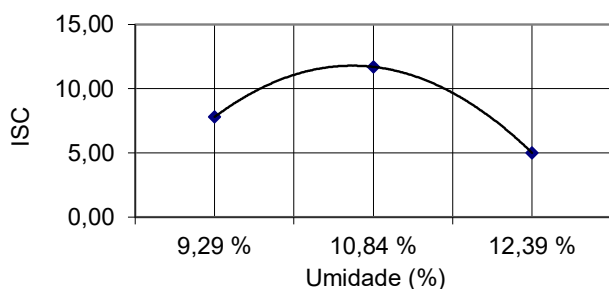

Expansão

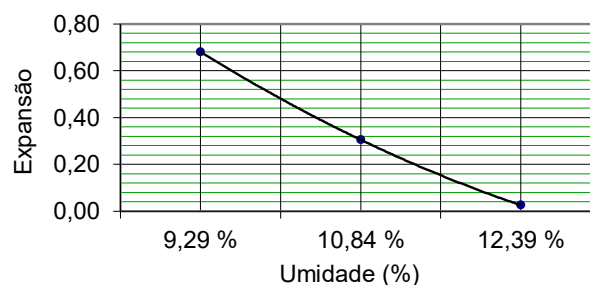



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA. Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE EXPANSÃO / I.S.C



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS




OBRA:						DATA:	
						09/07/2025	
RODOVIA:			TRECHO:			OPERADO	
SEDE DE RORAINÓPOLIS			BAIRRO VITÓRIA			FERDANDO	
ESTACA:		LADO:	FURO:	PROFUNDIDADE:	GOLPES:	ESTUDO:	
0		L / X	12	0,85	12	SUBLEITO	
% MATERIAL RET. PEN. Nº 4			PROCTOR:			MATERIAL:	
0,00%			NORMAL			Argila Arenoso Siltosa Cinza	

ENSAIO DE EXPANSÃO NORMA DNER - ME 049/94

MOLDE Nº		ALTURA			MOLDE Nº		ALTURA		MOLDE Nº		ALTURA	
33		114,5			20		114,5		11		114,5	
DATA	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%
09/07/25	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00	0,00	0,00
												
13/07/25	09:00	1,78	0,78	0,68	09:00	1,35	0,35	0,31	09:00	1,03	0,03	0,03

ENSAIO DE I.S.C NORMA DNIT 172/2016 - ME

MOLDE Nº			K-PRENSA =			MOLDE Nº				MOLDE Nº			
33			0,110			20				11			
PENETR. mm	TEMPO min	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %
0.63	0.5	20	2,20			25	2,70			5	0,50		
1.27	1.0	25	2,70			38	4,20			15	1,60		
1.90	1.5	37	4,10			60	6,60			25	2,70		
2.54	2.0	48	5,30	70	7,60	75	8,20	70	11,70	30	3,30	70	4,70
3.81	3.0	60	6,60			90	9,90			35	3,80		
5.08	4.0	75	8,20	105	7,80	110	12,10	105	11,50	47	5,20	105	5,00
6.35	5.0	90	9,90			125	13,70			58	6,40		
7.62	6.0	110	12,10			140	15,40			70	7,70		
8.89	7.0	125	13,70			160	17,60			80	8,80		
10.16	8.0	140	15,40			200	22,00			90	9,90		
12.70	10.0	150	16,50			230	25,30			105	11,50		

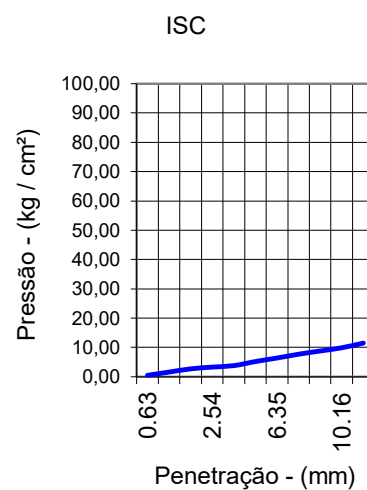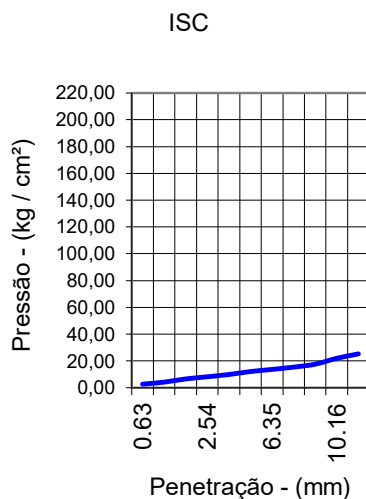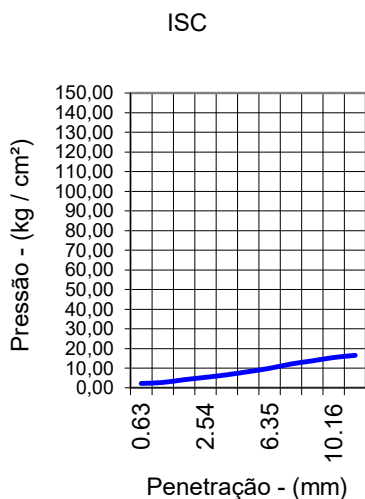

RESUMO

DENSIDADE MÁXIMA:	1825 g / cm³	ISC :	11,14 %
ÚMIDADE ÓTIMA:	11,18 %	EXPANSÃO :	0,12 %



CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA Via Norte Construtora Ltda



Análise Granulométrica NORMA DNER ME -080/94 (Simples)




PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

Rodovia:	0	Profundidade:	0,85
Trecho:	BAIRRO VITÓRIA	Furo :	12
Procedência:	SONDAGEM DE	Estaca:	0
Camada:	SUBLEITO	OPERADO	FERDANDO
		Data:	09/07/25

UMIDADE HIDROSCÓPICA		DISCRIMINAÇÃO		AMOSTRA SECA	
				Total	Parcial
Cápsula (N°)	45	78	Cápsula (N°)	31	11
Peso Umido (g)	55,21	67,57	Peso Bruto Úmido (g)	1500,0	150,0
Peso Bruto Seco (g)	54,00	66,03	Peso Retido na # N° 10 (g)	20,70	
Peso da Água (g)	1,21	1,54	Peso Úmido Pass. na # N° 10 (g)	1479,30	
Peso da Cápsula (g)	19,11	20,59	Peso Seco Pass. na # N° 10 (g)	1430,20	
Peso do Solo Seco (g)	34,89	45,44	Peso da água (g)	49,10	
Umidade (%)	3,47	3,39	Peso da amostra Seca (g)	2 1450,9	3 145,0
Umidade Média (%)	3,4				

Peneiramento



Amostra Total	Peneiras		Peso Retido Parcial (g)	Peso que Passa Acumulado (g)	% que Passa Am.Total	FAIXA AASTHO		CONSTANTES
	Pol	mm				Mínimo	Máximo	
	2"	50,8	0,00	1450,9	100,0			
	1 1/2"	38,1	0,00	1450,9	100,0			K ₁ =100 = 0,069 2
	1"	25,4	0,00	1450,9	100,0			
	3/8"	9,5	0,00	1450,9	100,0			K ₂ = 4 = 0,683 3
	4	4,8	5,40	1445,5	100,0			
	10	2,0	15,30	1430,2	4 99,0			
Amostra	40	0,42	57,90	87,1	59,0			
Parcial	200	0,074	45,10	42,0	29,0			

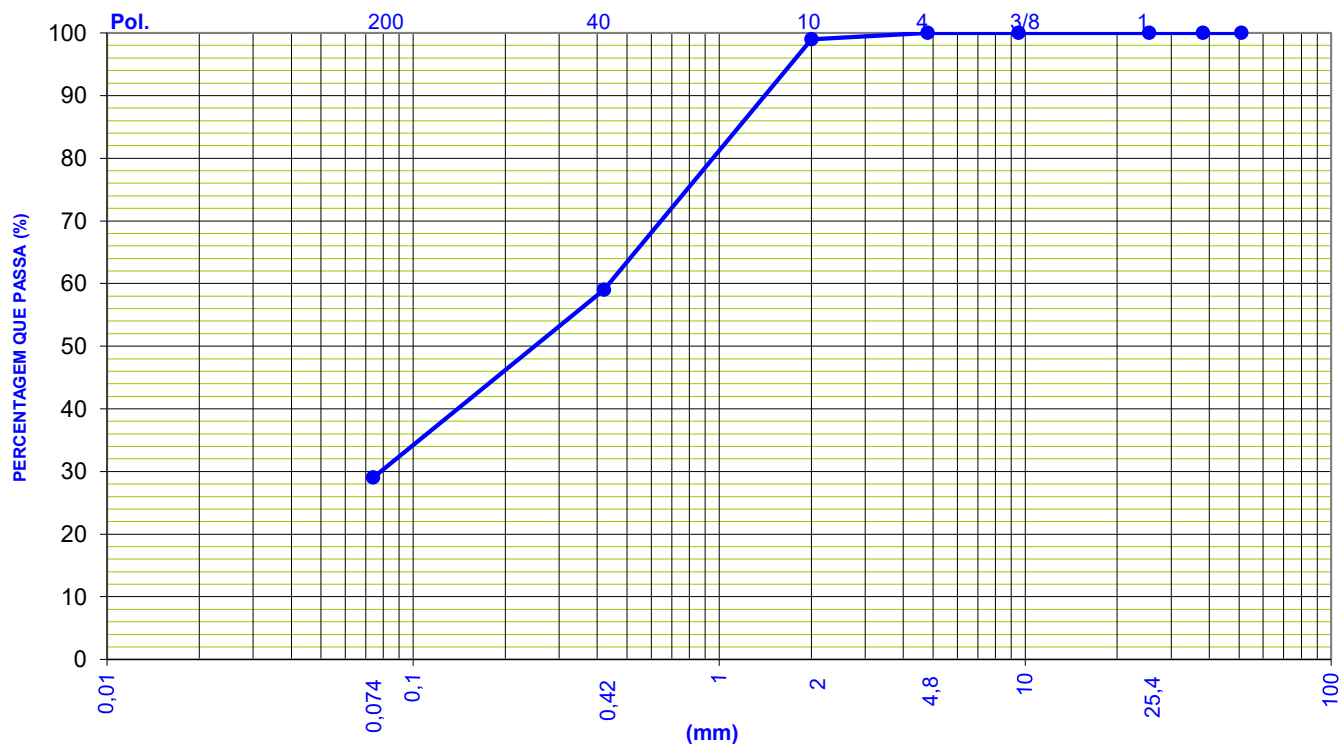

Resumo Granulometria (%)

Pedregulho (> 4,8 mm)	0,0
Areia Grossa (4,8 - 2,0 mm)	1,0
Areia Média (2,0 - 0,42 mm)	40,0
Areia Fina (0,42 - 0,074 mm)	30,0
Passando (0,074 mm)	29,0
Total	100,0

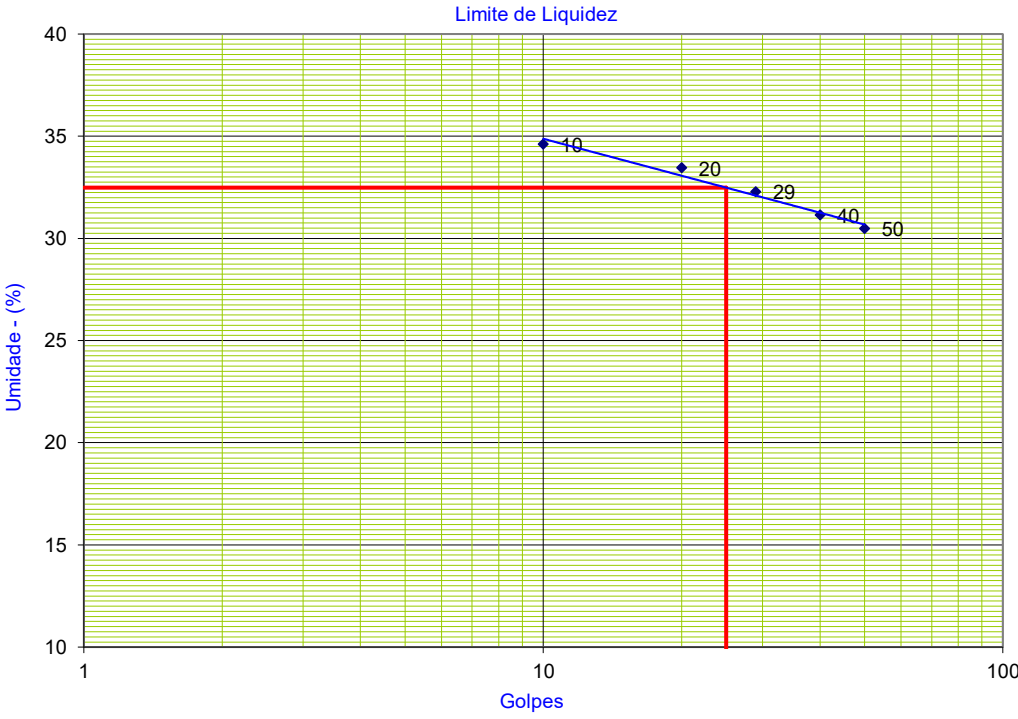

  MTEC CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA. Via Norte Construtora Ltda		LIMITES FÍSICOS  PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS					
Rodovia: 0		Profund.: 0,85		OPERADO FERDANDO			
Trecho: BAIRRO VITÓRIA		Furo : 12					
Procedência: SONDAGEM DE		Estaca: 0					
Camada: SUBLEITO		Data: 10/07/2025		LADO L / X			
LIMITE DE LIQUIDEZ NORMA DNER ME - 122/94							
Cápsula	N.º	12	94	75	45	63	
Golpes	g	10	20	29	40	50	
Peso Bruto Úmido	g	25,48	35,65	21,20	24,78	25,86	
Peso Bruto Seco	g	20,43	28,30	17,42	20,19	21,14	
Peso da Cápsula	g	5,84	6,33	5,71	5,45	5,66	
Peso da Água	g	5,05	7,35	3,78	4,59	4,72	
Peso do Solo Seco	g	14,59	21,97	11,71	14,74	15,48	
Umidade	%	34,61	33,45	32,28	31,14	30,49	
LIMITE DE PLASTICIDADE NORMA DNER ME - 082/94							
Cápsula	N.º	32	62	85	74	75	
Peso Bruto Úmido	g	8,16	8,12	7,71	7,32	7,59	
Peso Bruto Seco	g	7,80	7,75	7,34	7,01	7,28	
Peso da Cápsula	g	6,15	5,96	5,61	5,52	5,80	
Peso da Água	g	0,36	0,37	0,37	0,31	0,31	
Peso do Solo Seco	g	1,65	1,79	1,73	1,49	1,48	
Umidade	%	21,82	20,67	21,39	20,81	20,95	
Índice de Plasticidade LL= 32,5% LP = 21,1% IP= 11,4%		 Limite de Liquidez					



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DNIT- 138/2010 - ES

E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA



Folha:

Única


Data:

09/07/2025


Rodovia: SEDE DE RORAINÓPOLIS		Trecho: BAIRRO VITÓRIA			Sub-trecho: RUA K FURO 2			Registro: SONDGEM DE					
Estaca:	Furo: 13	Profundidade: 0,68		Material: Argila Arenoso Amarela			SUBLEITO						
% Mat. Ret. # N° 4: 1,00%	Próctor: NORMAL		Golpes: 12		Operador: FERNANDO		Lado L / X						
Item	Unid.	1	2	3	4	5	6	Umidade Higroscópica					
Cápsula N°	-							11	96				
Peso Bruto Úmido	g							50,32	55,21				
Peso Bruto Seco	g							49,07	53,85				
Peso da Água	g							1,25	1,36				
Peso da Cápsula	g							12,67	13,17				
Peso do Solo Seco	g							36,4	40,68				
Umidade	%							3,43%	3,34%				
Umidade calculada	%	6,7%	8,3%	9,9%	11,4%	13,0%		3,4%					
Água Total	g	392	482	572	662	752		Peso do Material					
Água Adicionada	g	195	285	375	465	555		6.000,00					
% Água Adicionada	%	3,25%	4,75%	6,25%	7,75%	9,25%		P. Mat. Seco	Peso Água				
Peso Bruto Úmido	g	7.300	7.670	8.220	7.870	8.450		5.803	197				
Peos do Solo Úmido	g	3.200	3.585	4.005	3.830	3.666		Moldes					
Dens. Solo Úmido	g / m³	1.524	1.787	1.945	1.909	1.750		N°	Peso	Volume			
Dens. Solo Seco	g / m³	1.427	1.650	1.771	1.714	1.549		4	4.100	2.100			
Resultados:			Observações:								1	4.085	2.006
											7	4.215	2.059
H. Ótima	Dens. Máx	ISC	Expansão	14	4.040	2.006							
10,1 %	1.774	13,7	0,10	41	4.784	2.095							




Análise Gráfica

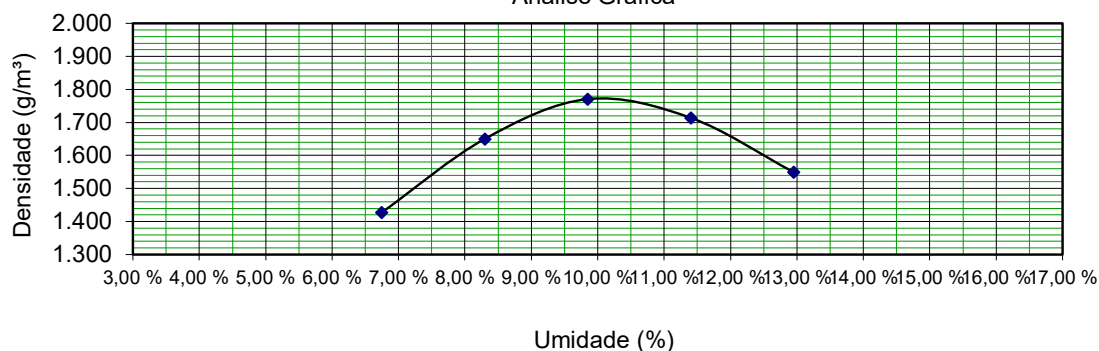

Índice de Suporte Califórnia

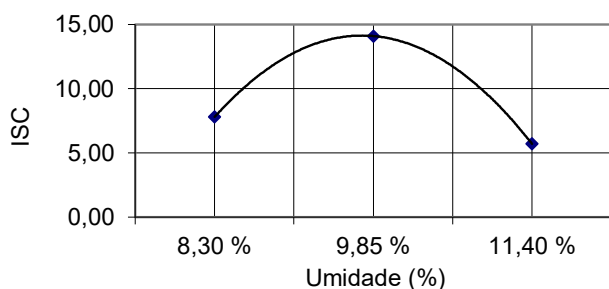

Expansão

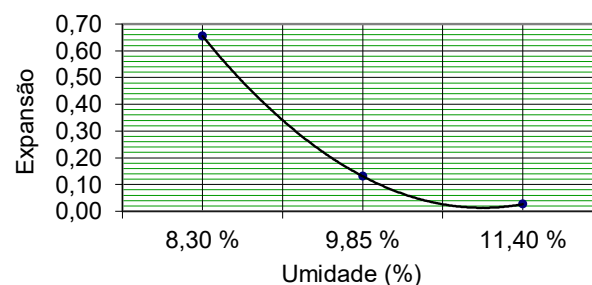



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE EXPANSÃO / I.S.C



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS




TRECHO:	BAIRRO VITÓRIA				DATA:	09/07/2025	
RODOVIA:	SEDE DE RORAINÓPOLIS				SUB-TRECHO:	RUA K FURO 2	
ESTACA:	0	LADO:	L / X	FURO:	13	PROFUNDIDADE:	0,68
% MATERIAL RET. PEN. N° 4	1,00%		PROCTOR:	NORMAL		MATERIAL:	Argila Arenoso Amarela

ENSAIO DE EXPANSÃO NORMA DNER - ME 049/94

MOLDE Nº 1		ALTURA 114,5			MOLDE Nº 7		ALTURA 114,5		MOLDE Nº 14		ALTURA 114,5	
DATA	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%
09/07/25	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00	0,00	0,00
												
13/07/25	09:00	1,75	0,75	0,66	09:00	1,15	0,15	0,13	09:00	1,03	0,03	0,03

ENSAIO DE I.S.C NORMA DNIT 172/2016 - ME

MOLDE Nº 1			K-PRENSA = 0,110			MOLDE Nº 7				MOLDE Nº 14			
PENETR. mm	TEMPO min	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %
0.63	0.5	10	1,10			25	2,70			5	0,50		
1.27	1.0	20	2,20			40	4,40			15	1,60		
1.90	1.5	30	3,30			60	6,60			20	2,20		
2.54	2.0	45	4,90	70	7,00	90	9,90	70	14,10	30	3,30	70	4,70
3.81	3.0	65	7,10			115	12,60			40	4,40		
5.08	4.0	75	8,20	105	7,80	135	14,80	105	14,10	55	6,00	105	5,70
6.35	5.0	90	9,90			185	20,30			65	7,10		
7.62	6.0	105	11,50			205	22,50			85	9,30		
8.89	7.0	110	12,10			230	25,30			100	11,00		
10.16	8.0	125	13,70			260	28,50			105	11,50		
12.70	10.0	145	15,90			300	32,90			110	12,10		

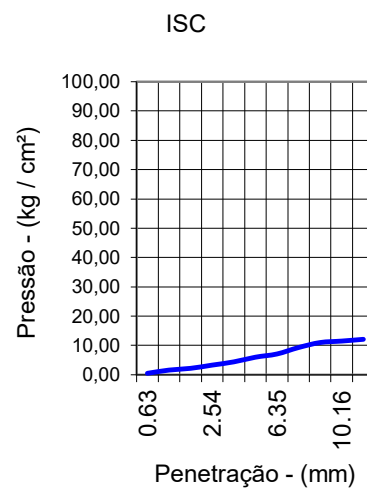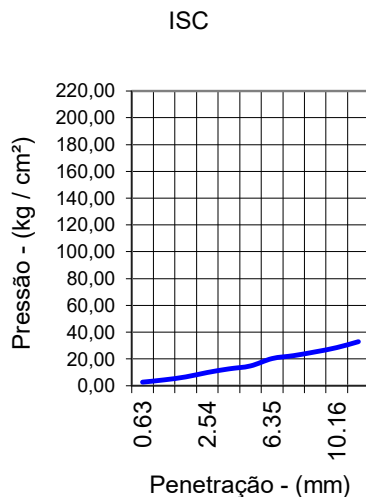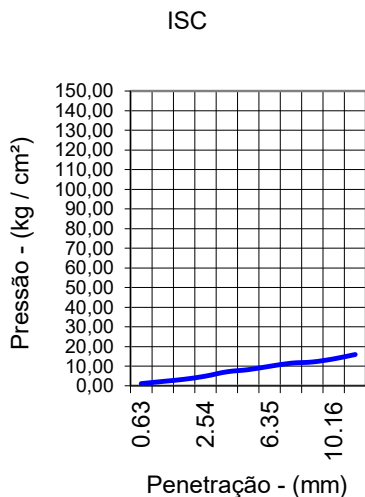

RESUMO

DENSIDADE MÁXIMA:	1774 g / cm³	ISC :	13,67 %
ÚMIDADE ÓTIMA:	10,13 %	EXPANSÃO :	0,10 %



CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA Via Norte Construtora Ltda



Análise Granulométrica NORMA DNER ME -080/94 (Simples)




PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

Rodovia:	SEDE DE RORAINÓPOLIS	Profundidade:	0,68
Trecho:	BAIRRO VITÓRIA	Furo :	13
Procedência:	SONDAGEM DE	Estaca:	0
Camada:	SUBLEITO	OPERADO	FERNANDO
		Data:	09/07/25

UMIDADE HIDROSCÓPICA		DISCRIMINAÇÃO		AMOSTRA SECA	
				Total	Parcial
Cápsula (N°)	11	96	Cápsula (N°)	21	08
Peso Umido (g)	50,32	55,21	Peso Bruto Úmido (g)	1500,0	150,0
Peso Bruto Seco (g)	49,07	53,85	Peso Retido na # N° 10 (g)	35,80	
Peso da Água (g)	1,25	1,36	Peso Úmido Pass. na # N° 10 (g)	1464,20	
Peso da Cápsula (g)	12,67	13,17	Peso Seco Pass. na # N° 10 (g)	1416,30	
Peso do Solo Seco (g)	36,40	40,68	Peso da água (g)	47,90	
Umidade (%)	3,43	3,34	Peso da amostra Seca (g)	2 1452,1	3 145,1
Umidade Média (%)	3,4				

Peneiramento


Amostra Total	Peneiras		Peso Retido Parcial (g)	Peso que Passa Acumulado (g)	% que Passa Am. Total	FAIXA AASTHO		CONSTANTES
	Pol	mm				Mínimo	Máximo	
	2"	50,8	0,00	1452,1	100,0			K ₁ =100 = 0,069
	1 1/2"	38,1	0,00	1452,1	100,0			2
	1"	25,4	0,00	1452,1	100,0			K ₂ = 4 = 0,675
	3/8"	9,5	0,00	1452,1	100,0			3
	4	4,8	11,20	1440,9	99,0			
	10	2,0	24,60	1416,3	4 98,0			
Amostra Parcial	40	0,42	78,90	66,2	45,0			
	200	0,074	44,94	21,3	14,0			

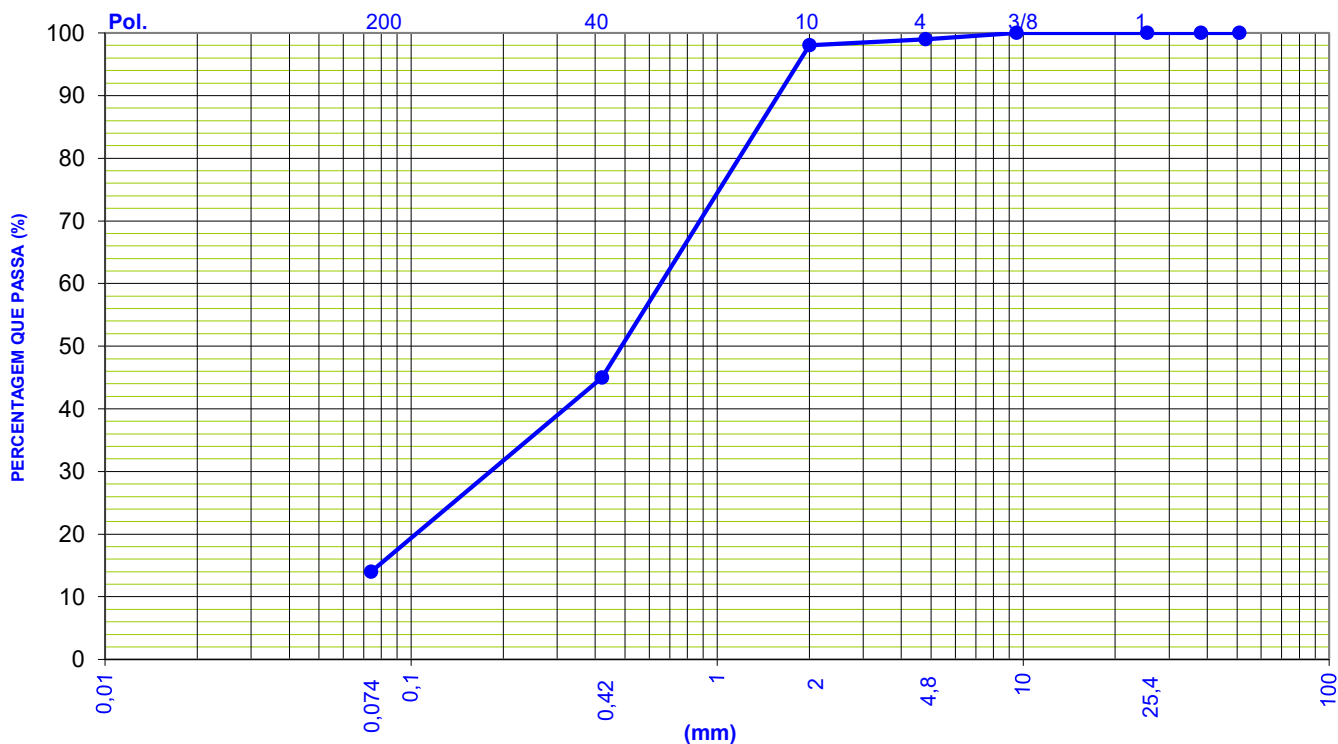

Resumo Granulometria (%)

Pedregulho (> 4,8 mm)	1,0
Areia Grossa (4,8 - 2,0 mm)	1,0
Areia Média (2,0 - 0,42 mm)	53,0
Areia Fina (0,42 - 0,074 mm)	31,0
Passando (0,074 mm)	14,0
Total	100,0

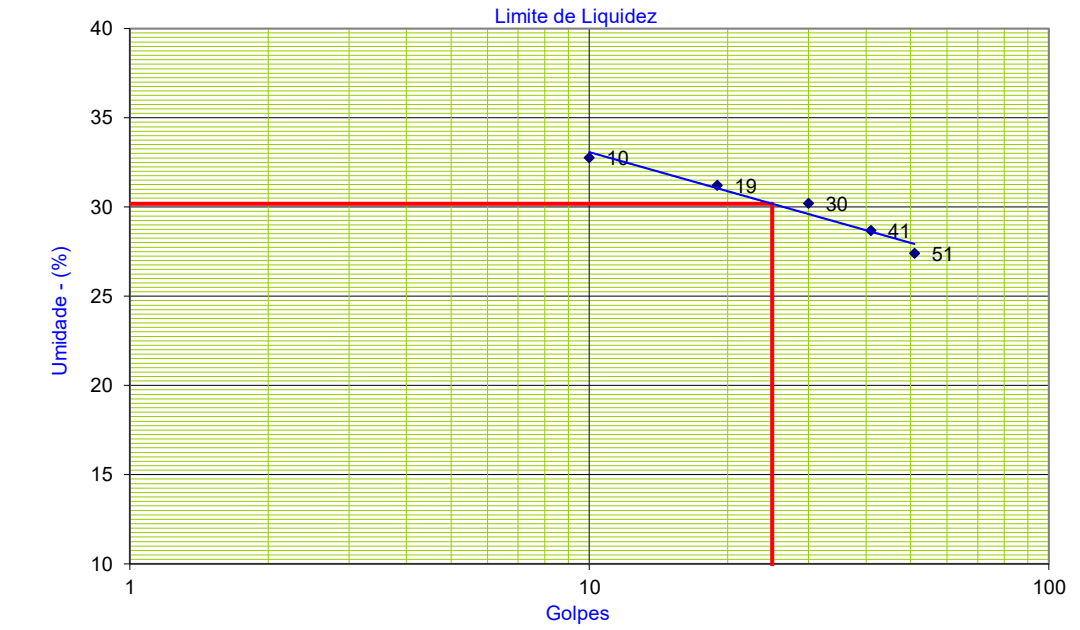

  MTEC CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda		LIMITES FÍSICOS  PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS					
Rodovia: BR - 207		Profund.: 0,68		OPERADO FERNANDO			
Trecho: BAIRRO VITÓRIA		Furo : 6					
Procedência: SONDAGEM DE		Estaca: 0					
Camada: SUBLEITO		Data: 10/07/2025		LADO L / X			
LIMITE DE LIQUIDEZ NORMA DNER ME - 122/94							
Cápsula	N.º	20	10	31	40	21	
Golpes	g	10	19	30	41	51	
Peso Bruto Úmido	g	22,57	23,10	24,10	22,45	25,57	
Peso Bruto Seco	g	18,52	18,92	19,99	18,60	21,40	
Peso da Cápsula	g	6,16	5,53	6,38	5,18	6,18	
Peso da Água	g	4,05	4,18	4,11	3,85	4,17	
Peso do Solo Seco	g	12,36	13,39	13,61	13,42	15,22	
Umidade	%	32,77	31,22	30,20	28,69	27,40	
LIMITE DE PLASTICIDADE NORMA DNER ME - 082/94							
Cápsula	N.º	35	82	72	33	45	
Peso Bruto Úmido	g	6,70	6,76	7,55	7,00	6,87	
Peso Bruto Seco	g	6,51	6,54	7,31	6,77	6,64	
Peso da Cápsula	g	5,62	5,51	6,20	5,64	5,53	
Peso da Água	g	0,19	0,22	0,24	0,23	0,23	
Peso do Solo Seco	g	0,89	1,03	1,11	1,13	1,11	
Umidade	%	21,35	21,36	21,62	20,35	20,72	
Índice de Plasticidade LL= 30,2% LP = 21,1% IP= 9,1%		 Limite de Liquidez					



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DNIT- 138/2010 - ES

E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA



Folha:


Única

Data:


09/07/2025

Rodovia: SEDE DE RORAINÓPOLIS		Trecho: BAIRRO VITÓRIA			Sub-trecho: RUA K FURO L 01			Registro: SONDGEM DE					
Estaca:		Furo: 14		Profundidade: 0,75		Material: Argila Arenoso Siltosa cinza			SUBLEITO				
% Mat. Ret. # N° 4: 0,00%		Próctor: normal			Golpes: 12		Operador: FERNADO		Lado L / X				
Item		Unid.	1	2	3	4	5	6	Umidade Higroscópica				
Cápsula N°		-							31	45			
Peso Bruto Úmido		g							58,27	62,10			
Peso Bruto Seco		g							57,00	61,00			
Peso da Água		g							1,27	1,10			
Peso da Cápsula		g							19,11	20,59			
Peso do Solo Seco		g							37,89	40,41			
Umidade		%							3,35%	2,72%			
Umidade calculada		%	6,6%	8,7%	10,8%	12,8%	14,9%		3,0%				
Água Total		g	387	507	627	747	867		Peso do Material				
Água Adicionada		g	210	330	450	570	690		6.000,00				
% Água Adicionada		%	3,50%	5,50%	7,50%	9,50%	11,50%		P. Mat. Seco	Peso Água			
Peso Bruto Úmido		g	7.650	7.950	8.370	8.230	8.710		5.823	177			
Peos do Solo Úmido		g	3.525	3.865	4.295	4.105	3.996		Moldes				
Dens. Solo Úmido		g / m³	1.686	1.927	2.074	2.046	1.913		N°	Peso	Volume		
Dens. Solo Seco		g / m³	1.581	1.772	1.872	1.814	1.665		20	4.125	2.091		
Resultados:				Observações:							34	4.085	2.006
											2	4.075	2.071
H. Ótima	Dens. Máx	ISC	Expansão	1	4.125	2.006							
11,0 %	1.874	14,4	0,10	42	4.714	2.089							


Análise Gráfica

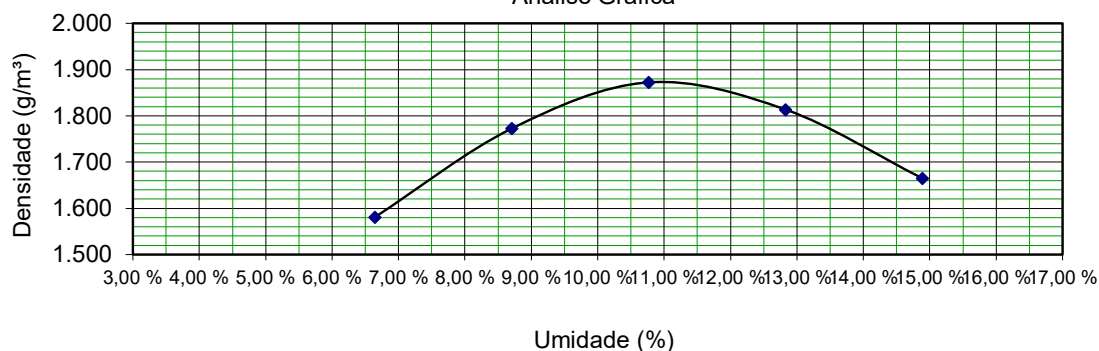

Índice de Suporte Califórnia

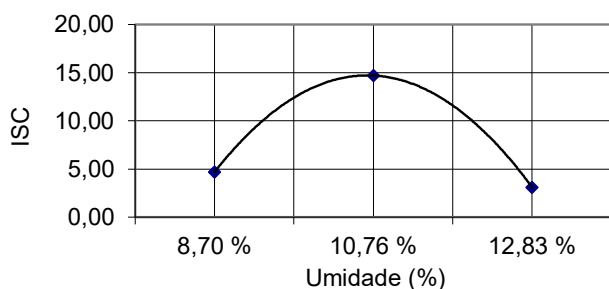

Expansão

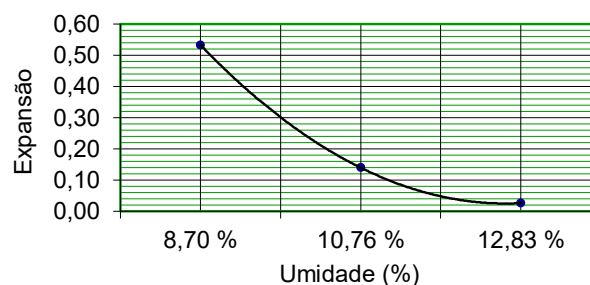



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE EXPANSÃO / I.S.C



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

OBRA:

DATA:

09/07/2025

RODOVIA:

TRECHO:

OPERADO

SEDE DE RORAINÓPOLIS

BAIRRO VITÓRIA

FERNADO

ESTACA:

LADO:

FURO:

PROFUNDIDADE:

GOLPES:

ESTUDO:

0

L / X

14

0,75

12

SUBLEITO

% MATERIAL RET. PEN. N° 4

PROCTOR:

MATERIAL:

0,00%

normal

Argila Arenoso Siltosa cinza


ENSAIO DE EXPANSÃO NORMA DNER - ME 049/94

MOLDE N°	34	ALTURA 114,5				MOLDE N°	2	ALTURA 114,5				MOLDE N°	1	ALTURA 114,5			
DATA	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%		HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%			HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%		
09/07/25	10:00	1,00		0,00		10:00	1,00		0,00			10:00	1,00	0,00	0,00		
13/07/25	09:00	1,61	0,61	0,53		09:00	1,16	0,16	0,14			09:00	1,03	0,03	0,03		

ENSAIO DE I.S.C NORMA DNIT 172/2016 - ME


MOLDE N° 34			K-PRESSA = 0,110			MOLDE N° 2				MOLDE N° 1			
PENETR. mm	TEMPO min	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %
0.63	0.5	15	1,60			35	3,80			5	0,50		
1.27	1.0	20	2,20			50	5,50			10	1,10		
1.90	1.5	25	2,70			65	7,10			15	1,60		
2.54	2.0	30	3,30	70	4,70	80	8,80	70	12,60	20	2,20	70	3,10
3.81	3.0	35	3,80			110	12,10			25	2,70		
5.08	4.0	40	4,40	105	4,20	140	15,40	105	14,70	30	3,30	105	3,10
6.35	5.0	45	4,90			200	22,00			35	3,80		
7.62	6.0	50	5,50			230	25,30			40	4,40		
8.89	7.0	55	6,00			265	29,10			45	4,90		
10.16	8.0	60	6,60			320	35,10			50	5,50		
12.70	10.0	65	7,10			360	39,50			55	6,00		

ISC

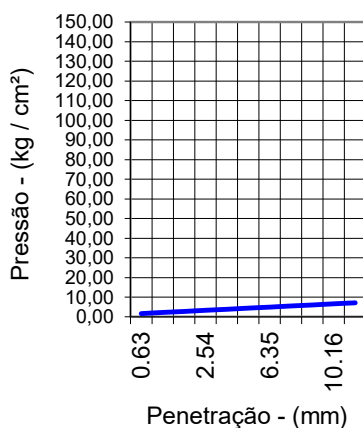


ISC = 4,70 %

ISC

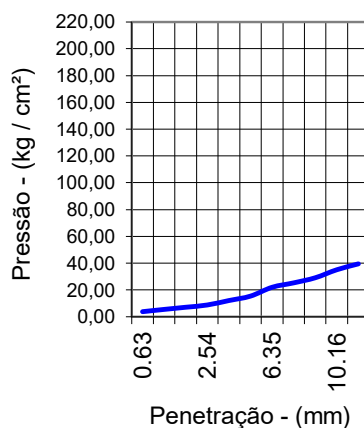

ISC = 14,70 %

ISC

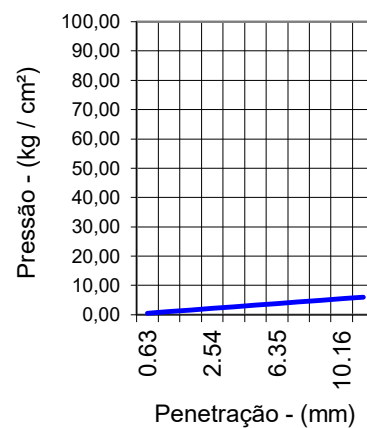

ISC = 3,10 %

RESUMO

DENSIDADE MÁXIMA: 1874 g / cm³

ISC : 14,41 %

ÚMIDADE ÓTIMA: 11,03 %

EXPANSÃO : 0,10 %



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda


**Análise Granulométrica NORMA DNER ME -080/94 (Simples)**PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS

Rodovia:	SEDE DE RORAINÓPOLIS	Profundidade:	0,75
Trecho:	BAIRRO VITÓRIA	Furo :	14
Procedência:	SONDGEM DE	Estaca:	0
Camada:	SUBLEITO	OPERADO	FERNANDO
		Data:	09/07/25

UMIDADE HIDROSCÓPICA			DISCRIMINAÇÃO		AMOSTRA SECA	
					Total	Parcial
Cápsula (N°)	31	45	Cápsula (N°)		33	31
Peso Umido (g)	58,27	62,10	Peso Bruto Úmido (g)		1500,0	150,0
Peso Bruto Seco (g)	57,00	61,00	Peso Retido na # N° 10 (g)		84,00	
Peso da Água (g)	1,27	1,10	Peso Úmido Pass. na # N° 10 (g)		1416,00	
Peso da Cápsula (g)	19,11	20,59	Peso Seco Pass. na # N° 10 (g)		1374,30	
Peso do Solo Seco (g)	37,89	40,41	Peso da água (g)		41,70	
Umidade (%)	3,35	2,72	Peso da amostra Seca (g)		2 1458,3	3 145,6
Umidade Média (%)	3,0					



Peneiramento

Amostra Total	Peneiras		Peso Retido Parcial (g)	Peso que Passa Acumulado (g)	% que Passa Am.Total	FAIXA AASTHO		CONSTANTES
	Pol	mm				Mínimo	Máximo	
	2"	50,8	0,00	1458,3	100,0			K ₁ =100 = 0,069 2
	1 1/2"	38,1	0,00	1458,3	100,0			K ₂ = 4 = 0,652 3
	1"	25,4	0,00	1458,3	100,0			
	3/8"	9,5	0,00	1458,3	100,0			
	4	4,8	9,00	1449,3	100,0			
	10	2,0	75,00	1374,3	4 95,0			
Amostra Parcial	40	0,42	24,90	120,7	79,0			
	200	0,074	75,50	45,2	29,0			

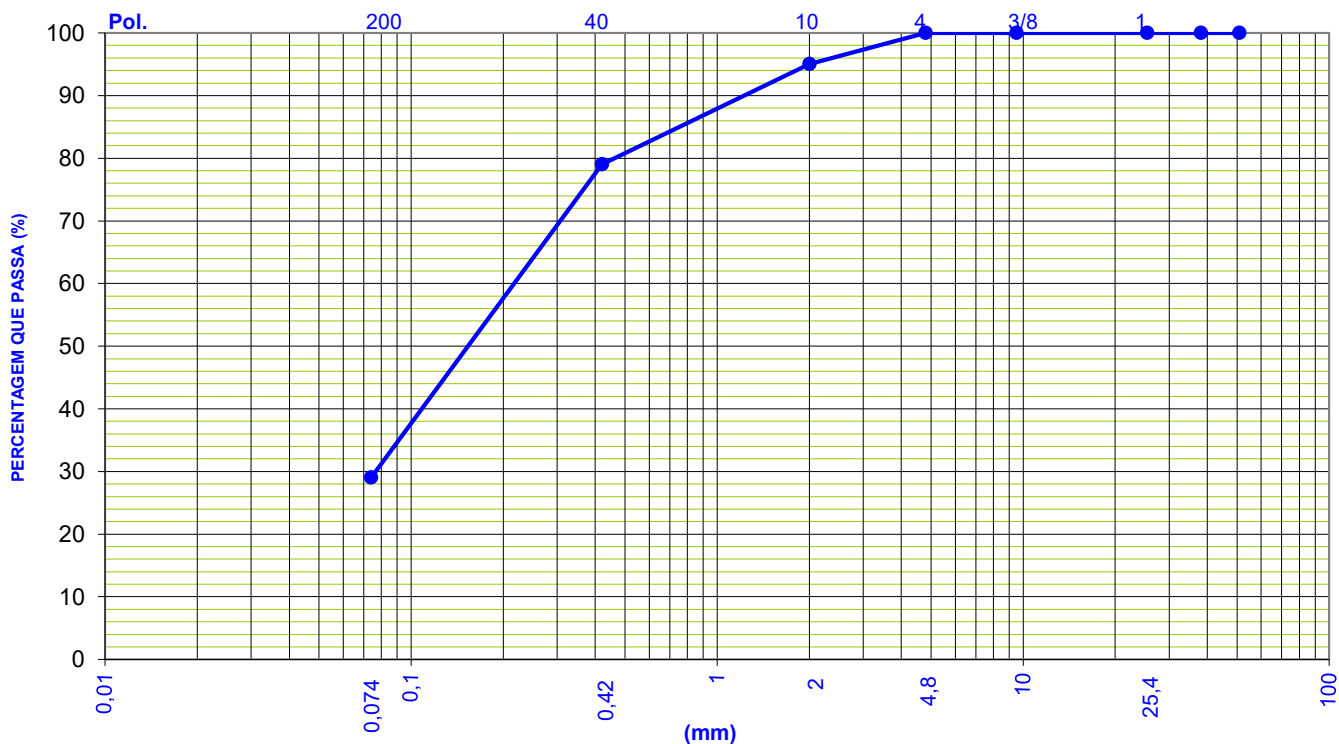**Resumo Granulometria (%)**

Pedregulho (> 4,8 mm)	0,0
Areia Grossa (4,8 - 2,0 mm)	5,0
Areia Média (2,0 - 0,42 mm)	16,0
Areia Fina (0,42 - 0,074 mm)	50,0
Passando (0,074 mm)	29,0
Total	100,0

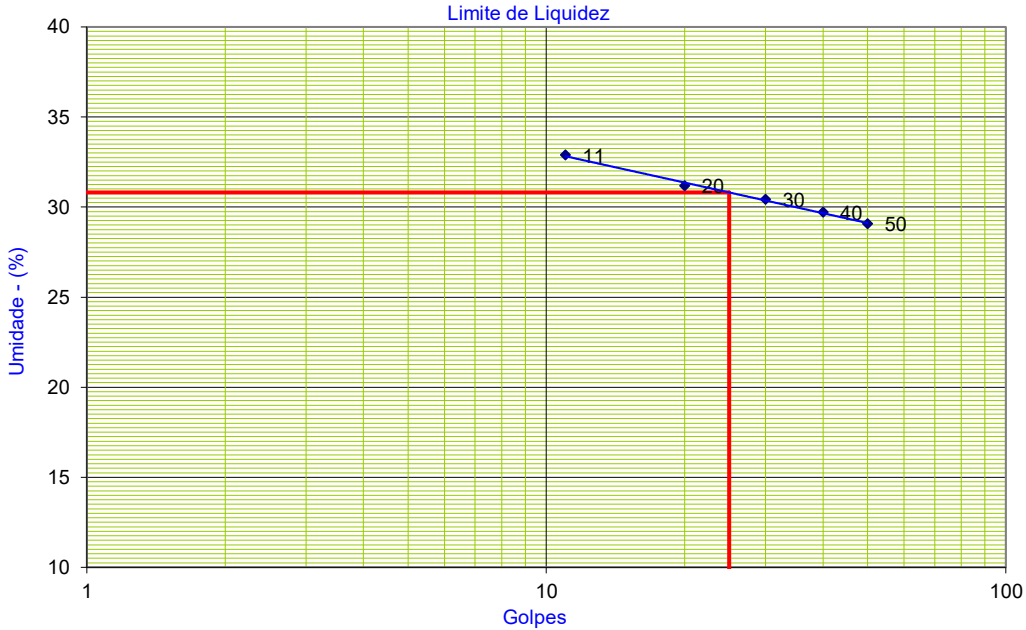

  MTEC CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda		LIMITES FÍSICOS  PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS					
Rodovia: SEDE DE RORAINÓPOLIS		Profund.: 0,75		OPERADO FERNANDO			
Trecho: BAIRRO VITÓRIA		Furo : 14					
Procedência: SONDAGEM DE		Estaca: 0					
Camada: SUBLEITO		Data: 10/07/2025		LADO L / X			
LIMITE DE LIQUIDEZ NORMA DNER ME - 122/94							
Cápsula	N.º	64	54	32	97	78	
Golpes	g	11	20	30	40	50	
Peso Bruto Úmido	g	14,25	14,70	12,00	14,69	10,68	
Peso Bruto Seco	g	12,29	12,71	10,49	12,79	9,52	
Peso da Cápsula	g	6,33	6,33	5,53	6,40	5,53	
Peso da Água	g	1,96	1,99	1,51	1,90	1,16	
Peso do Solo Seco	g	5,96	6,38	4,96	6,39	3,99	
Umidade	%	32,89	31,19	30,44	29,73	29,07	
LIMITE DE PLASTICIDADE NORMA DNER ME - 082/94							
Cápsula	N.º	45	06	48	31	07	
Peso Bruto Úmido	g	8,65	8,07	7,97	7,92	6,48	
Peso Bruto Seco	g	8,27	7,67	7,56	7,56	6,30	
Peso da Cápsula	g	6,43	5,68	5,54	5,81	5,33	
Peso da Água	g	0,38	0,40	0,41	0,36	0,18	
Peso do Solo Seco	g	1,84	1,99	2,02	1,75	0,97	
Umidade	%	20,65	20,10	20,30	20,57	18,56	
Índice de Plasticidade LL= 30,8% LP = 20,4% IP= 10,4%							



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA



Via Norte Construtora Ltda

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DNIT- 138/2010 - ES

E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS

Folha:

Única

Data:

09/07/2025

Rodovia:		Trecho:			Sub-trecho:			Registro:							
SEDE DE RORAINÓPOLIS		BAIRRO VITÓRIA			RUA K FURO L 02			SONDAGEM DE							
Estaca:		15		Profundidade:		Material:		SUBLEITO							
				0,87		Argila Silte Arenoso Amarela									
% Mat. Ret. # N° 4:		Próctor:			Golpes:		Operador:		Lado						
0,00%		NORMAL			12		FERNANO		L / X						
Item		Unid.	1	2	3	4	5	6	Umidade Higroscópica						
Cápsula N°		-							22	45					
Peso Bruto Úmido		g							67,45	65,44					
Peso Bruto Seco		g							66,00	64,00					
Peso da Água		g							1,45	1,44					
Peso da Cápsula		g							19,11	20,59					
Peso do Solo Seco		g							46,89	43,41					
Umidade		%							3,09%	3,32%					
Umidade calculada		%	5,1%	7,2%	9,2%	11,3%	13,4%		3,2%						
Água Total		g	296	416	536	656	776		Peso do Material						
Água Adicionada		g	110	230	350	470	590		6.000,00						
% Água Adicionada		%	1,83%	3,83%	5,83%	7,83%	9,83%		P. Mat. Seco	Peso Água					
Peso Bruto Úmido		g	7.850	7.724	8.080	8.250	8.150		5.814	186					
Peos do Solo Úmido		g	3.450	3.639	3.897	3.887	3.925		Moldes						
Dens. Solo Úmido		g / m³	1.652	1.814	1.918	1.938	1.893		N°	Peso	Volume				
Dens. Solo Seco		g / m³	1.571	1.693	1.756	1.741	1.670		34	4.400	2.089				
Resultados:				Observações:											
H. Ótima		Dens. Máx										ISC		Expansão	
9,9 %		1.760										11,4		0,09	
								43		4.085	2.006				
								30		4.183	2.032				
								29		4.363	2.006				
								15		4.225	2.073				



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE EXPANSÃO / I.S.C



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

TRECHO:	BAIRRO VITÓRIA				DATA:	09/07/2025	
RODOVIA:	SEDE DE RORAINÓPOLIS				SUB-TRECHO	RUA K FURO L 02	
ESTACA:	0	LADO:	L / X	FURO:	7	PROFUNDIDADE:	0,87
% MATERIAL RET. PEN. N° 4				PROCTOR:		MATERIAL:	
0,00%				NORMAL		Argila Silte Arenoso Amarela	




ENSAIO DE EXPANSÃO NORMA DNER - ME 049/94

MOLDE N°	43	ALTURA			114,5	MOLDE N°	30	ALTURA			114,5	MOLDE N°	29	ALTURA			114,5
DATA	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%		HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%			HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%		
09/07/25	10:00	1,00		0,00		10:00	1,00		0,00			10:00	1,00		0,00		
13/07/25	09:00	1,71	0,71	0,62		09:00	1,25	0,25	0,22			09:00	1,03	0,03	0,03		



ENSAIO DE I.S.C NORMA DNIT 172/2016 - ME

MOLDE N° 43			K-PRENSA =			0,110	MOLDE N° 30				MOLDE N° 29			
PENETR. mm	TEMPO min	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	
0.63	0.5	10	1,10			23	2,50			5	0,50			
1.27	1.0	20	2,20			40	4,40			10	1,10			
1.90	1.5	35	3,80			60	6,60			20	2,20			
2.54	2.0	55	6,00	70	8,60	75	8,20	70	11,70	30	3,30	70	4,70	
3.81	3.0	75	8,20			90	9,90			40	4,40			
5.08	4.0	95	10,40	105	9,90	120	13,20	105	12,60	50	5,50	105	5,20	
6.35	5.0	110	12,10			150	16,50			60	6,60			
7.62	6.0	125	13,70			190	20,90			70	7,70			
8.89	7.0	130	14,30			220	24,20			80	8,80			
10.16	8.0	140	15,40			255	28,00			90	9,90			
12.70	10.0	145	15,90			275	30,20			100	11,00			

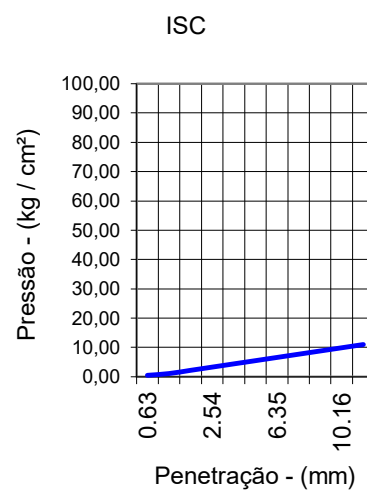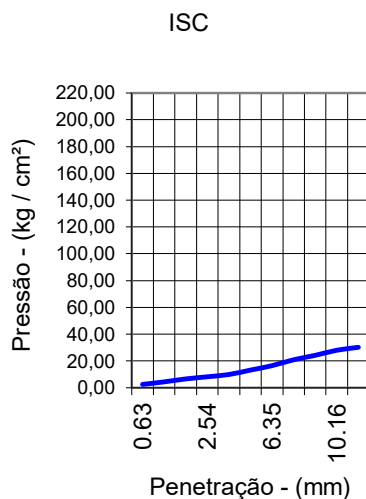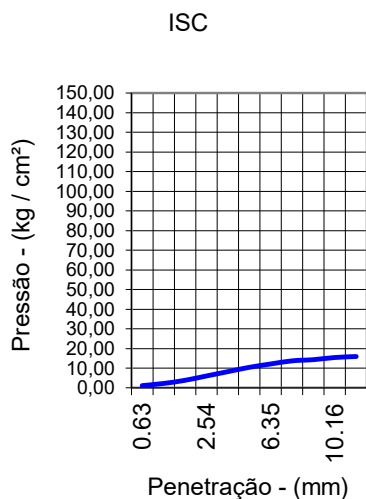

RESUMO

DENSIDADE MÁXIMA:	1760	g / cm³	ISC :	11,38	%
ÚMIDADE ÓTIMA:	9,87	%	EXPANSÃO :	0,09	%

Análise Granulométrica **NORMA DNER ME -080/94** (Simples)




PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS

Rodovia:	SEDE DE RORAINÓPOLIS	Profundidade:	0,87
Trecho:	BAIRRO VITÓRIA	Furo :	15
Procedência:	0	Estaca:	0
Camada:	SUBLEITO	OPERADO	FERNANO
		Data:	09/07/25

UMIDADE HIDROSCÓPICA		DISCRIMINAÇÃO		AMOSTRA SECA	
				Total	Parcial
Cápsula (N°)	22	45	Cápsula (N°)	20	01
Peso Umido (g)	67,45	65,44	Peso Bruto Úmido (g)	1500,0	150,0
Peso Bruto Seco (g)	66,00	64,00	Peso Retido na # N° 10 (g)	25,30	
Peso da Água (g)	1,45	1,44	Peso Úmido Pass. na # N° 10 (g)	1474,70	
Peso da Cápsula (g)	19,11	20,59	Peso Seco Pass. na # N° 10 (g)	1428,90	
Peso do Solo Seco (g)	46,89	43,41	Peso da água (g)	45,80	
Umidade (%)	3,09	3,32	Peso da amostra Seca (g)	2 1454,2	3 145,3
Umidade Média (%)	3,2				

Peneiramento

Amostra Total	Peneiras		Peso Retido Parcial (g)	Peso que Passa Acumulado (g)	% que Passa Am. Total	FAIXA AASTHO		CONSTANTES
	Pol	mm				Mínimo	Máximo	
	2"	50,8	0,00	1454,2	100,0			$K_1=100 = 0,069$ 2
	1 1/2"	38,1	0,00	1454,2	100,0			
	1"	25,4	0,00	1454,2	100,0			$K_2 = \frac{\text{[4]}}{\text{[3]}} = 0,681$
	3/8"	9,5	0,00	1454,2	100,0			
	4	4,8	10,00	1444,2	100,0			
	10	2,0	15,30	1428,9	4 99,0			
Amostra Parcial	40	0,42	81,60	63,7	43,0			
	200	0,074	41,63	22,1	15,0			

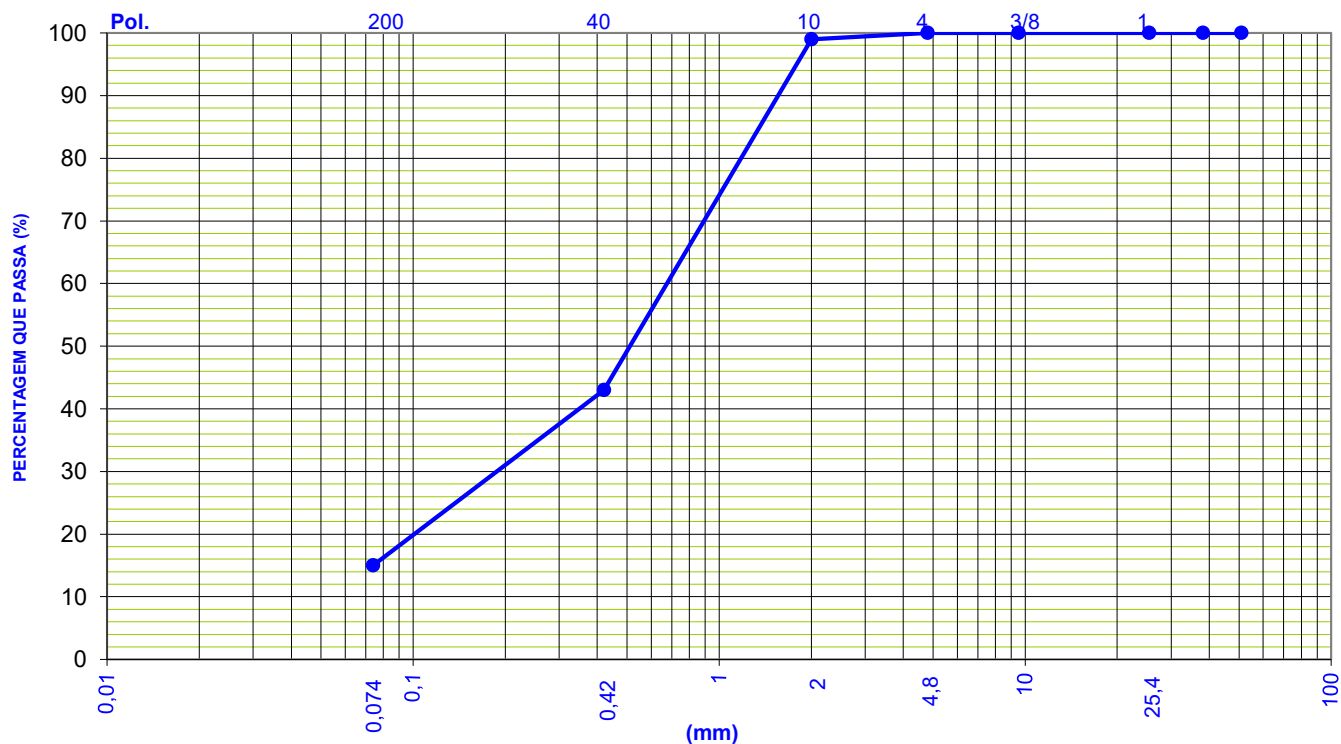

Resumo Granulometria (%)

Pedregulho (> 4,8 mm)	0,0
Areia Grossa (4,8 - 2,0 mm)	1,0
Areia Média (2,0 - 0,42 mm)	56,0
Areia Fina (0,42 - 0,074 mm)	28,0
Passando (0,074 mm)	15,0
Total	100,0





CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA. Via Norte Construtora Ltda

LIMITES FÍSICOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS

Rodovia: SEDE DE RORAINÓPOLIS	Profund.: 0,87	OPERADO FERNANO
Trecho: BAIRRO VITÓRIA	Furo : 15	
Procedência: 0	Estaca: 0	
Camada: SUBLEITO	Data: 10/07/2025	LADO L / X

LIMITE DE LIQUEDEZ NORMA DNER ME - 122/94

Cápsula	N.º	40	21	53	87	05	
Golpes	g	11	20	32	42	50	
Peso Bruto Úmido	g	33,32	30,80	32,67	30,18	32,00	
Peso Bruto Seco	g	26,60	25,43	26,60	24,72	26,65	
Peso da Cápsula	g	6,08	8,11	6,08	5,89	7,70	
Peso da Água	g	6,72	5,37	6,07	5,46	5,35	
Peso do Solo Seco	g	20,52	17,32	20,52	18,83	18,95	
Umidade	%	32,75	31,00	29,58	29,00	28,23	

LIMITE DE PLASTICIDADE NORMA DNER ME - 082/94


Cápsula	N.º	32	74	54	31	45	
Peso Bruto Úmido	g	5,22	6,92	6,97	7,04	5,42	
Peso Bruto Seco	g	4,89	6,57	6,65	6,88	5,06	
Peso da Cápsula	g	3,32	4,90	5,11	6,10	3,31	
Peso da Água	g	0,33	0,35	0,32	0,16	0,36	
Peso do Solo Seco	g	1,57	1,67	1,54	0,78	1,75	
Umidade	%	21,02	20,96	20,78	20,51	20,57	

Índice de
Plasticidade

LL= 30,4%

LP = 20,8%

IP = 9,6%

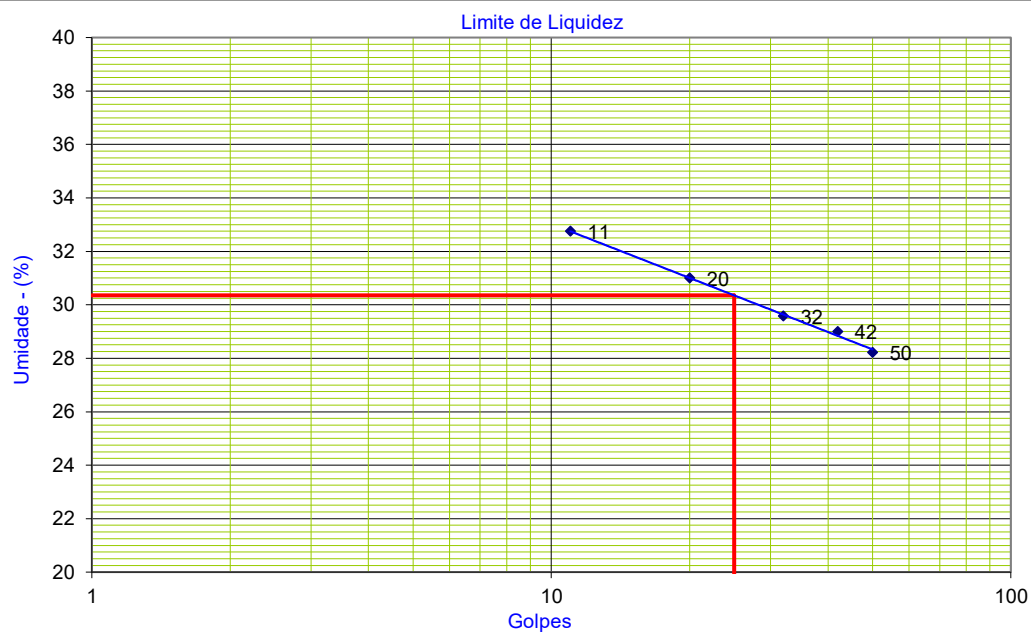



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DNIT- 138/2010 - ES

E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA



Folha:

Única

Data:

10/07/2025

Rodovia:		Trecho:		Sub-trecho:		Registro:	
SEDE DE RORAINÓPOLIS		BAIRRO VITÓRIA		RUA M		SONDGEM DE	
Estaca:	Furo:	Profundidade:		Material:		SUBLEITO	
	16	0,80		Argila Arenoso Siltosa Cinza			
% Mat. Ret. # N° 4:	Próctor:		Golpes:		Operador:		Lado
0,00%	NORMAL		12		FERNADO		L / X
Item	Unid.	1	2	3	4	5	6
Cápsula N°	-						
Peso Bruto Úmido	g						
Peso Bruto Seco	g						
Peso da Água	g						
Peso da Cápsula	g						
Peso do Solo Seco	g						
Umidade	%						
Umidade calculada	%	7,6%	9,7%	11,7%	13,8%	15,9%	3,3%
Água Total	g	441	561	681	801	921	Peso do Material
Água Adicionada	g	250	370	490	610	730	6.000,00
% Água Adicionada	%	4,17%	6,17%	8,17%	10,17%	12,17%	P. Mat. Seco
Peso Bruto Úmido	g	7.380	7.510	7.996	7.870	8.390	Peso Água
Peos do Solo Úmido	g	3.255	3.425	3.780	3.635	3.676	5.809
Dens. Solo Úmido	g / m³	1.557	1.707	1.812	1.812	1.760	191
Dens. Solo Seco	g / m³	1.447	1.557	1.622	1.593	1.519	
Resultados:		Observações:					
H. Ótima	Dens. Máx	ISC	Expansão				
12,1 %	1.624	14,3	0,14				



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda

ENSAIO DE EXPANSÃO / I.S.C



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS




OBRA:						DATA:	
						10/07/2025	
RODOVIA:		TRECHO:				OPERADO	
SEDE DE RORAINÓPOLIS		BAIRRO VITÓRIA				FERNADO	
ESTACA:	LADO:	FURO:	PROFUNDIDADE:		GOLPES:	ESTUDO:	
0	L / X	16	0,80		12	SUBLEITO	
% MATERIAL RET. PEN. Nº 4		PROCTOR:			MATERIAL:		
0,00%		NORMAL			Argila Arenoso Siltosa Cinza		

ENSAIO DE EXPANSÃO NORMA DNER - ME 049/94

MOLDE Nº 23		ALTURA 114,5			MOLDE Nº 37		ALTURA 114,5		MOLDE Nº 61		ALTURA 114,5	
DATA	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%
10/07/25	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00	0,00	0,00
												
14/07/25	09:00	1,98	0,98	0,86	09:00	1,41	0,41	0,36	09:00	1,03	0,03	0,03

ENSAIO DE I.S.C NORMA DNIT 172/2016 - ME

MOLDE Nº			K-PRENSA =				MOLDE Nº				MOLDE Nº			
23			0,110				37				61			
PENETR. mm	TEMPO min	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	
0.63	0.5	10	1,10			35	3,80			5	0,50			
1.27	1.0	14	1,50			60	6,60			7	0,80			
1.90	1.5	18	2,00			80	8,80			10	1,10			
2.54	2.0	27	3,00	70	4,30	95	10,40	70	14,90	16	1,80	70	2,60	
3.81	3.0	38	4,20			115	12,60			20	2,20			
5.08	4.0	49	5,40	105	5,10	135	14,80	105	14,10	25	2,70	105	2,60	
6.35	5.0	57	6,30			150	16,50			32	3,50			
7.62	6.0	71	7,80			180	19,80			39	4,30			
8.89	7.0	80	8,80			205	22,50			47	5,20			
10.16	8.0	92	10,10			230	25,30			55	6,00			
12.70	10.0	102	11,20			250	27,50			65	7,10			

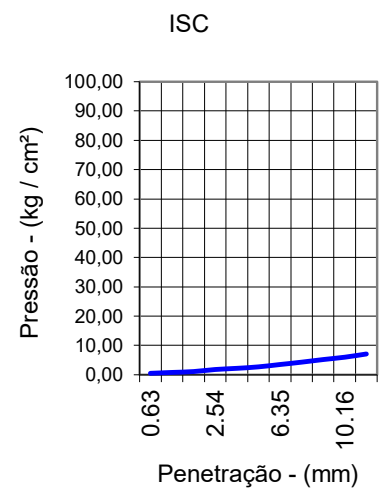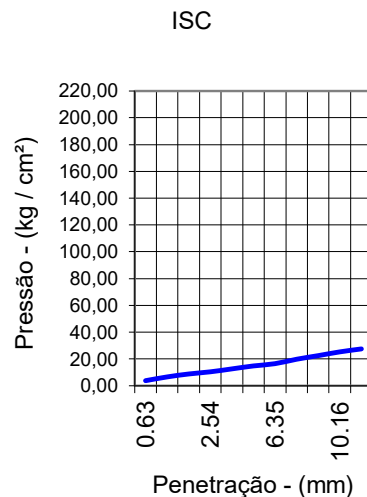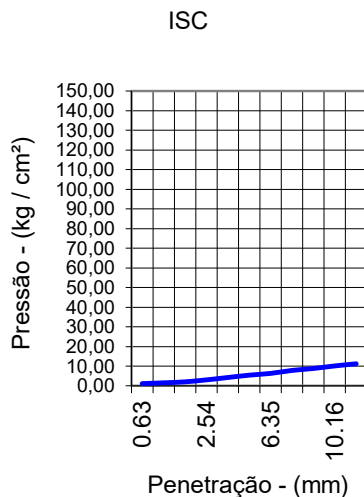

RESUMO

DENSIDADE MÁXIMA:	1624 g / cm³	ISC :	14,28 %
ÚMIDADE ÓTIMA:	12,11 %	EXPANSÃO :	0,14 %



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda

**Análise Granulométrica NORMA DNER ME -080/94 (Simples)**


PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

Rodovia:	SEDE DE RORAINÓPOLIS	Profundidade:	0,80
Trecho:	BAIRRO VITÓRIA	Furo :	16
Procedência:	SONDGEM DE	Estaca:	0
Camada:	SUBLEITO	OPERADO	FERNADO
		Data:	10/07/25

UMIDADE HIDROSCÓPICA			DISCRIMINAÇÃO		AMOSTRA SECA	
					Total	Parcial
Cápsula (N°)	52	46	Cápsula (N°)		33	31
Peso Umido (g)	58,27	62,30	Peso Bruto Úmido (g)		1500,0	150,0
Peso Bruto Seco (g)	57,00	61,00	Peso Retido na # N° 10 (g)		110,00	
Peso da Água (g)	1,27	1,30	Peso Úmido Pass. na # N° 10 (g)		1390,00	
Peso da Cápsula (g)	19,11	20,59	Peso Seco Pass. na # N° 10 (g)		1345,80	
Peso do Solo Seco (g)	37,89	40,41	Peso da água (g)		44,20	
Umidade (%)	3,35	3,22	Peso da amostra Seca (g)		2 1455,8	3 145,2
Umidade Média (%)	3,3					


Peneiramento

Amostra Total	Peneiras		Peso Retido Parcial (g)	Peso que Passa Acumulado (g)	% que Passa Am. Total	FAIXA AASTHO		CONSTANTES
	Pol	mm				Mínimo	Máximo	
	2"	50,8	0,00	1455,8	100,0			$K_1=100 = 0,069$ 2
	1 1/2"	38,1	0,00	1455,8	100,0			$K_2 = \frac{4}{3} = 0,640$ 3
	1"	25,4	0,00	1455,8	100,0			
	3/8"	9,5	0,00	1455,8	100,0			
	4	4,8	0,00	1455,8	100,0			
	10	2,0	110,00	1345,8	4 93,0			
Amostra Parcial	40	0,42	51,80	93,4	60,0			
	200	0,074	38,60	54,8	35,0			

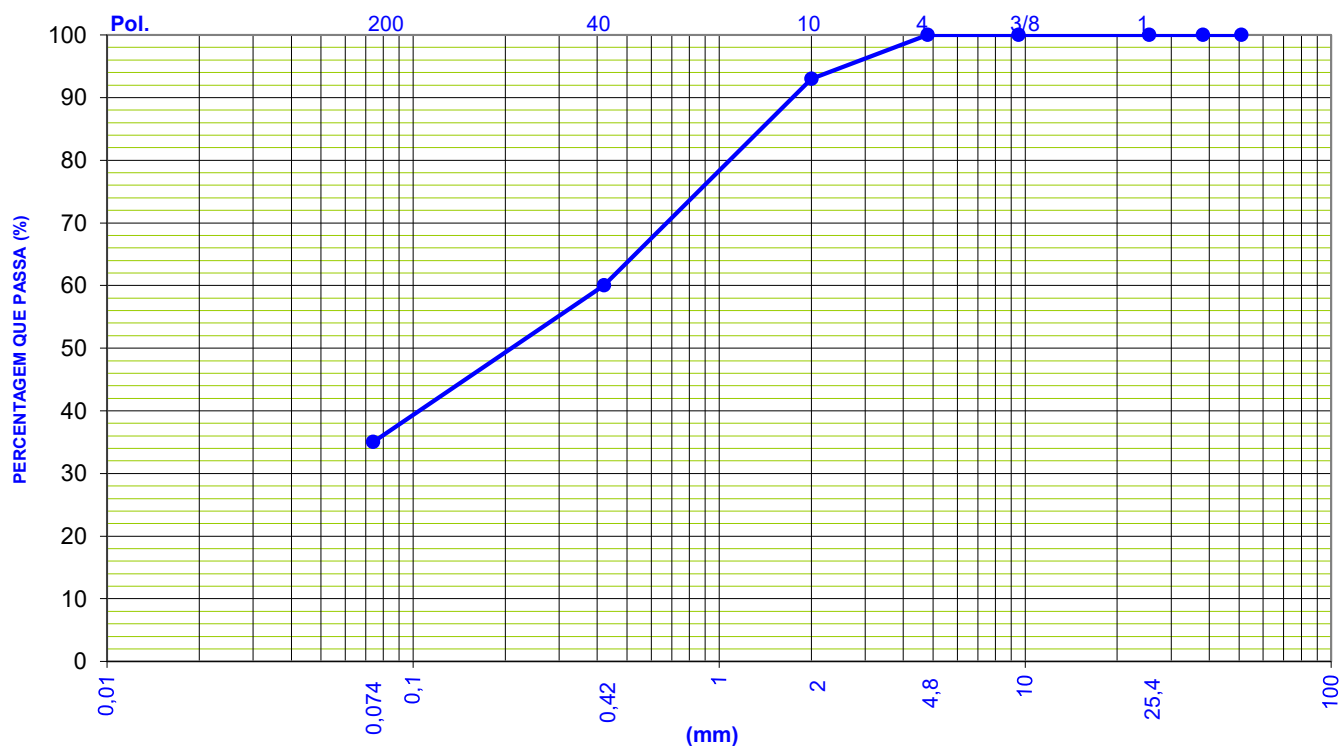**Resumo Granulometria (%)**

Pedregulho (> 4,8 mm)	0,0
Areia Grossa (4,8 - 2,0 mm)	7,0
Areia Média (2,0 - 0,42 mm)	33,0
Areia Fina (0,42 - 0,074 mm)	25,0
Passando (0,074 mm)	35,0
Total	100,0

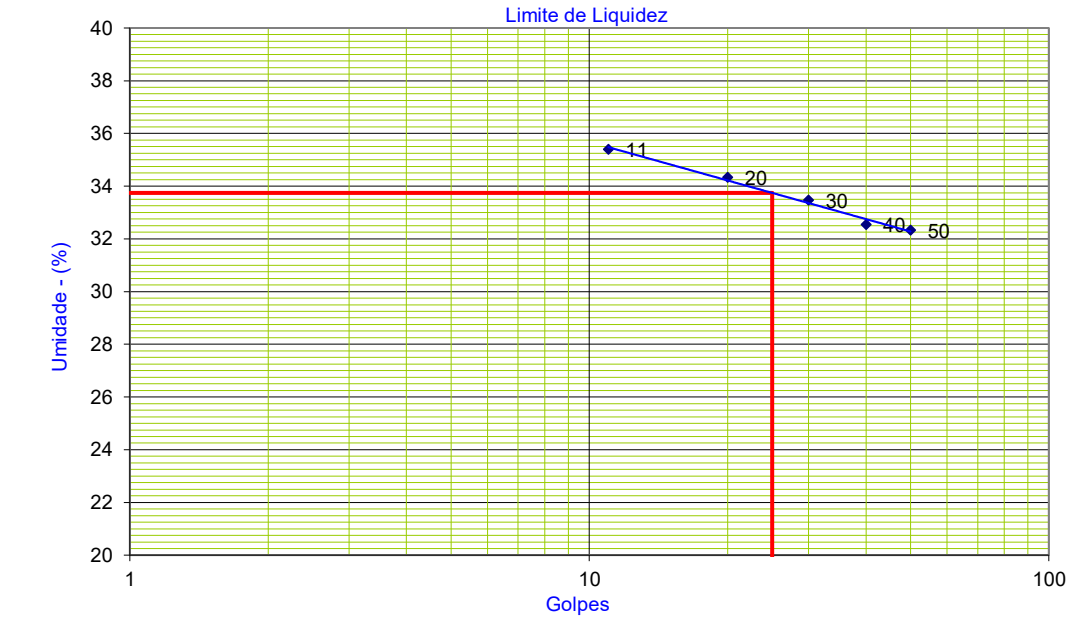

 		LIMITES FÍSICOS  PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS					
Rodovia: SEDE DE RORAINÓPOLIS		Profund.: 0,80		OPERADO FERNANDO			
Trecho: BAIRRO VITÓRIA		Furo : 16					
Procedência: SONDAGEM DE		Estaca: 0					
Camada: SUBLEITO		Data: 11/07/2025		LADO L / X			
LIMITE DE LIQUIDEZ NORMA DNER ME - 122/94							
Cápsula	N.º	54	21	35	98	79	
Golpes	g	11	20	30	40	50	
Peso Bruto Úmido	g	14,40	14,90	12,15	14,87	10,81	
Peso Bruto Seco	g	12,29	12,71	10,49	12,79	9,52	
Peso da Cápsula	g	6,33	6,33	5,53	6,40	5,53	
Peso da Água	g	2,11	2,19	1,66	2,08	1,29	
Peso do Solo Seco	g	5,96	6,38	4,96	6,39	3,99	
Umidade	%	35,40	34,33	33,47	32,55	32,33	
LIMITE DE PLASTICIDADE NORMA DNER ME - 082/94							
Cápsula	N.º	85	20	03	05	06	
Peso Bruto Úmido	g	8,68	8,12	8,02	7,91	6,52	
Peso Bruto Seco	g	8,27	7,67	7,56	7,56	6,30	
Peso da Cápsula	g	6,43	5,68	5,54	5,81	5,33	
Peso da Água	g	0,41	0,45	0,46	0,35	0,22	
Peso do Solo Seco	g	1,84	1,99	2,02	1,75	0,97	
Umidade	%	22,28	22,61	22,77	20,00	22,68	
Índice de Plasticidade LL= 33,7% LP = 22,6% IP= 11,1%							



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DNIT- 138/2010 - ES

E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA



Folha:

Única


Data:

10/07/2025


Rodovia: SEDE DE RORAINÓPOLIS		Trecho: BAIRRO VITÓRIA		Sub-trecho: RUA N			Registro: SONDGEM DE			
Estaca:	Furo: 17	Profundidade: 0,55		Material: Argila Arenoso Siltosa Amarela			SONDAG DE SUBLEITO			
% Mat. Ret. # N° 4: 0,00%	Próctor: NORMAL		Golpes: 12		Operador: FERNADO		Lado L / X			
Item	Unid.	1	2	3	4	5	6	Umidade Higroscópica		
Cápsula N°	-							2	31	
Peso Bruto Úmido	g							59,01	63,04	
Peso Bruto Seco	g							57,00	61,00	
Peso da Água	g							2,01	2,04	
Peso da Cápsula	g							19,11	20,59	
Peso do Solo Seco	g							37,89	40,41	
Umidade	%							5,30%	5,05%	
Umidade calculada	%	6,9%	9,0%	11,1%	13,2%	15,3%		5,2%		
Água Total	g	395	515	635	755	875		Peso do Material		
Água Adicionada	g	100	220	340	460	580		6.000,00		
% Água Adicionada	%	1,67%	3,67%	5,67%	7,67%	9,67%		P. Mat. Seco	Peso Água	
Peso Bruto Úmido	g	7.650	7.830	8.376	8.290	8.690		5.705	295	
Peos do Solo Úmido	g	3.525	3.745	4.132	3.958	3.976		Moldes		
Dens. Solo Úmido	g / m³	1.686	1.867	1.968	1.973	1.903		N°	Peso	Volume
Dens. Solo Seco	g / m³	1.577	1.712	1.770	1.742	1.650		20	4.125	2.091
Resultados:		Observações:						22	4.085	2.006
								35	4.244	2.100
								27	4.332	2.006
								42	4.714	2.089
H. Ótima	Dens. Máx	ISC	Expansão							
11,5 %	1.772	7,6	0,10							




Análise Gráfica

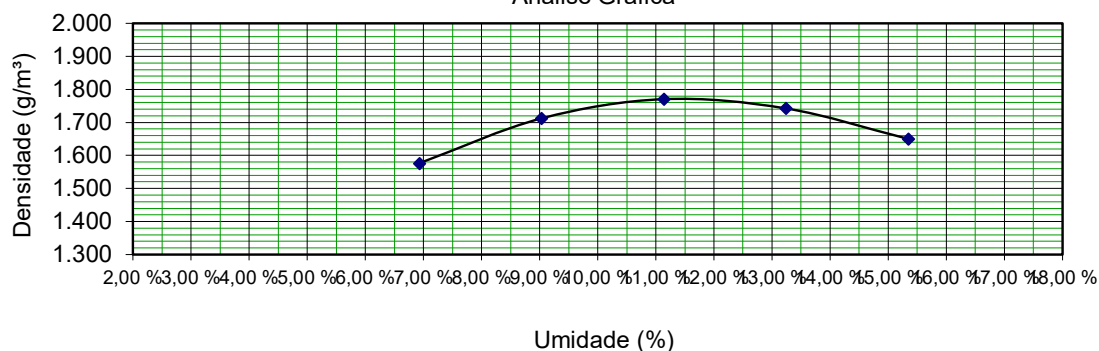

Índice de Suporte Califórnia

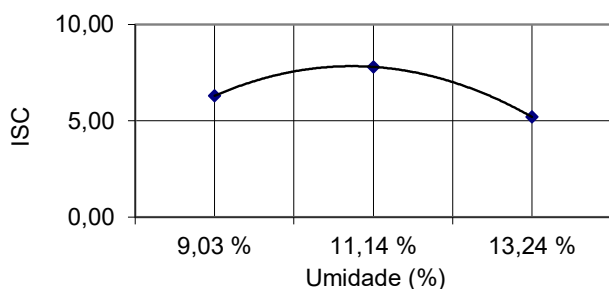

Expansão

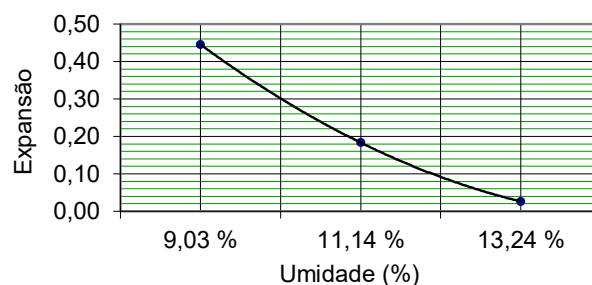



MTEC
CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA. Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE EXPANSÃO / I.S.C



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS

OBRA:		DATA:	10/07/2025
RODOVIA:	SEDE DE RORAINÓPOLIS	TRECHO:	BAIRRO VITÓRIA
ESTACA:	0	LADO:	L / X
FURO:	22	PROFUNDIDADE:	0,55
GOLPES:	12	ESTUDO:	SONDAG DE SUBLEITO
% MATERIAL RET. PEN. Nº 4	0,00%	PROCTOR:	NORMAL
MATERIAL:	Argila Arenoso Siltosa Amarela		




ENSAIO DE EXPANSÃO NORMA DNER - ME 049/94

MOLDE Nº 22		ALTURA 114,5			MOLDE Nº 35		ALTURA 114,5		MOLDE Nº 27		ALTURA 114,5	
DATA	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%
10/07/25	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00	0,00	0,00
												
14/07/25	09:00	1,51	0,51	0,45	09:00	1,21	0,21	0,18	09:00	1,03	0,03	0,03



ENSAIO DE I.S.C NORMA DNIT 172/2016 - ME

MOLDE Nº			22			K-PRENSA =			0,110	MOLDE Nº				35				MOLDE Nº				27			
PENETR. mm	TEMPO min	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %				
0.63	0.5	10	1,10			20	2,20			7	0,80														
1.27	1.0	15	1,60			30	3,30			12	1,30														
1.90	1.5	30	3,30			40	4,40			20	2,20														
2.54	2.0	40	4,40	70	6,30	46	5,10	70	7,30	25	2,70	70	3,90												
3.81	3.0	46	5,10			65	7,10			40	4,40														
5.08	4.0	55	6,00	105	5,70	75	8,20	105	7,80	50	5,50	105	5,20												
6.35	5.0	68	7,50			90	9,90			60	6,60														
7.62	6.0	79	8,70			105	11,50			75	8,20														
8.89	7.0	85	9,30			112	12,30			80	8,80														
10.16	8.0	95	10,40			120	13,20			95	10,40														
12.70	10.0	105	11,50			125	13,70			110	12,10														

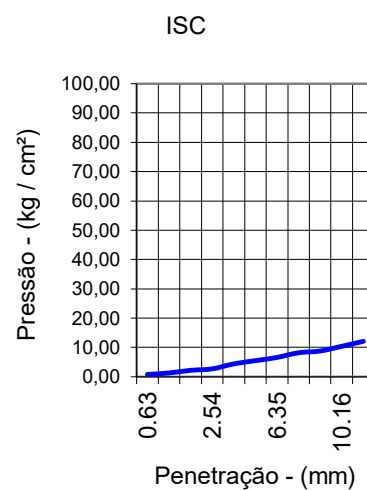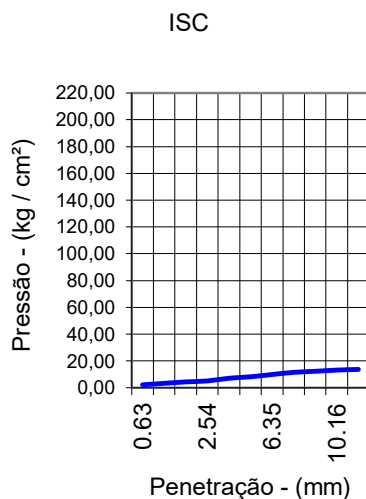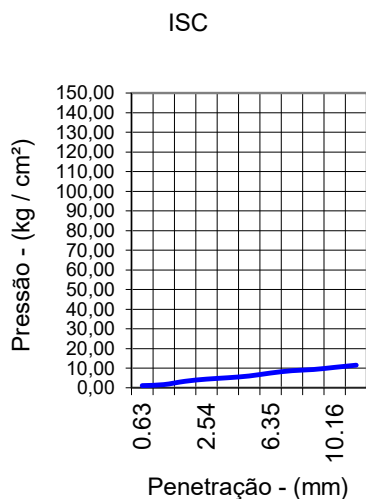

RESUMO

DENSIDADE MÁXIMA:	1772 g / cm³	ISC :	7,64 %
ÚMIDADE ÓTIMA:	11,50 %	EXPANSÃO :	0,10 %



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



Análise Granulométrica NORMA DNER ME -080/94 (Simples)




PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

Rodovia:	SEDE DE RORAINÓPOLIS	Profundidade:	0,55
Trecho:	BAIRRO VITÓRIA	Furo :	17
Procedência:	SONDGEM DE	Estaca:	0
Camada:	SONDAG DE SUBLEITO	OPERADO	FERNADO
		Data:	10/07/25

UMIDADE HIDROSCÓPICA			DISCRIMINAÇÃO		AMOSTRA SECA	
					Total	Parcial
Cápsula (N°)	02	31	Cápsula (N°)		33	31
Peso Umido (g)	59,01	63,04	Peso Bruto Úmido (g)		1500,0	150,0
Peso Bruto Seco (g)	57,00	61,00	Peso Retido na # N° 10 (g)		11,50	
Peso da Água (g)	2,01	2,04	Peso Úmido Pass. na # N° 10 (g)		1488,50	
Peso da Cápsula (g)	19,11	20,59	Peso Seco Pass. na # N° 10 (g)		1415,30	
Peso do Solo Seco (g)	37,89	40,41	Peso da água (g)		73,20	
Umidade (%)	5,30	5,05	Peso da amostra Seca (g)		2 1426,8	3 142,6
Umidade Média (%)	5,2					

Peneiramento

Amostra Total	Peneiras		Peso Retido Parcial (g)	Peso que Passa Acumulado (g)	% que Passa Am. Total	FAIXA AASTHO		CONSTANTES
	Pol	mm				Mínimo	Máximo	
	2"	50,8	0,00	1426,8	100,0			K ₁ =100 = 0,070 2
	1 1/2"	38,1	0,00	1426,8	100,0			K ₂ = 4 = 0,694 3
	1"	25,4	0,00	1426,8	100,0			
	3/8"	9,5	0,00	1426,8	100,0			
	4	4,8	0,00	1426,8	100,0			
	10	2,0	11,50	1415,3	4 99,0			
Amostra Parcial	40	0,42	58,30	84,3	59,0			
	200	0,074	65,70	18,6	13,0			

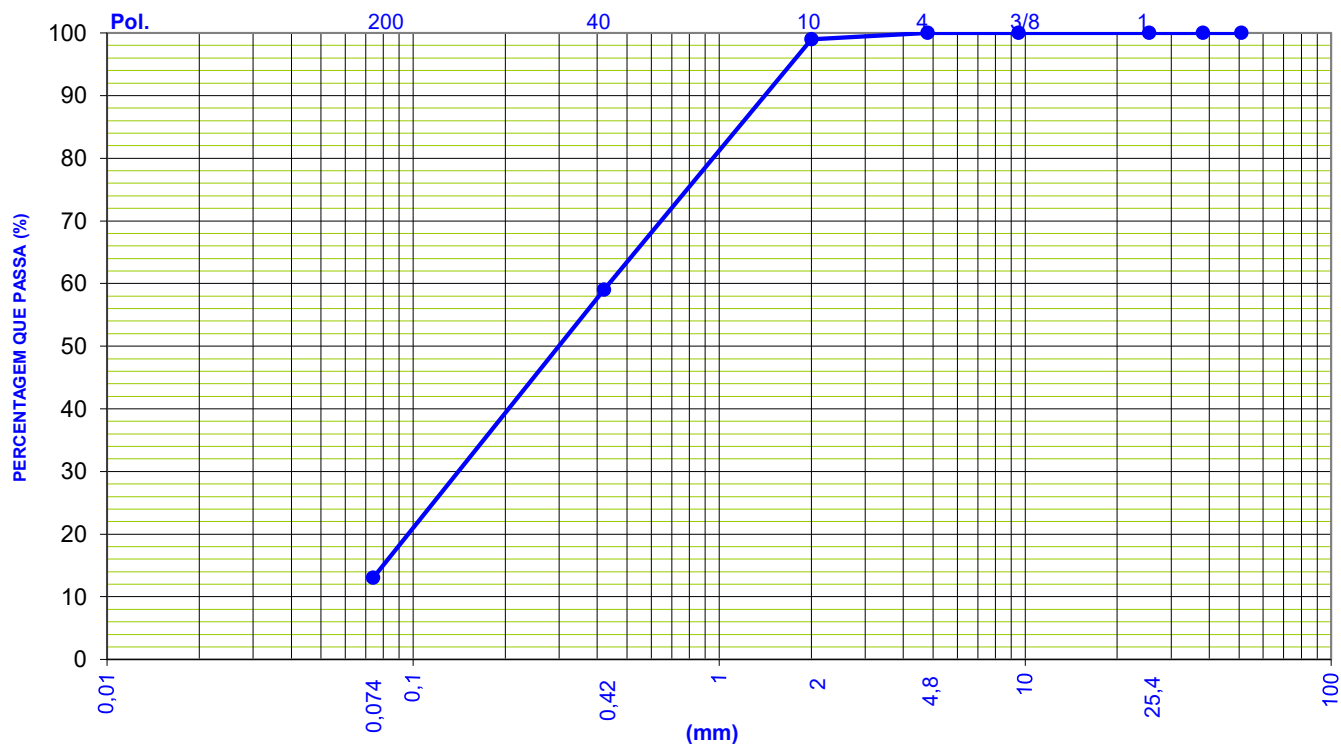

Resumo Granulometria (%)

Pedregulho (> 4,8 mm)	0,0
Areia Grossa (4,8 - 2,0 mm)	1,0
Areia Média (2,0 - 0,42 mm)	40,0
Areia Fina (0,42 - 0,074 mm)	46,0
Passando (0,074 mm)	13,0
Total	100,0



 		LIMITES FÍSICOS  PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	
Rodovia: SEDE DE RORAINÓPOLIS		Profund.: 0,55	OPERADO FERNADO
Trecho: BAIRRO VITÓRIA		Furo : 17	
Procedência: SONDAGEM DE		Estaca: 0	
Camada: SONDAG DE SUBLEITO		Data: 11/07/2025	LADO L / X
LIMITE DE LIQUIDEZ NORMA DNER ME - 122/94			
Cápsula	N.º	10	71
Golpes	g	11	20
Peso Bruto Úmido	g	14,72	15,22
Peso Bruto Seco	g	12,29	12,71
Peso da Cápsula	g	6,33	6,33
Peso da Água	g	2,43	2,51
Peso do Solo Seco	g	5,96	6,38
Umidade	%	40,77	39,34
LIMITE DE PLASTICIDADE NORMA DNER ME - 082/94			
Cápsula	N.º	04	15
Peso Bruto Úmido	g	8,70	8,13
Peso Bruto Seco	g	8,27	7,67
Peso da Cápsula	g	6,43	5,68
Peso da Água	g	0,43	0,46
Peso do Solo Seco	g	1,84	1,99
Umidade	%	23,37	23,12




Índice de Plasticidade	
LL=	38,7%
LP =	23,3%
IP=	15,4%





CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DNIT- 138/2010 - ES

E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS

Folha:

Única


Data:

10/07/2025


Rodovia: SEDE DE RORAINÓPOLIS		Trecho: BAIRRO VITÓRIA		Sub-trecho: RUA O		Registro: SONDGEM DE				
Estaca:	Furo: 18	Profundidade: 0,75		Material: Argila Silte Arenoso Siltosa Cinza		SUBLEITO				
% Mat. Ret. # N° 4: 0,00%	Próctor: NORMAL		Golpes: 12		Operador: FERNANDO		Lado L / X			
Item	Unid.	1	2	3	4	5	6	Umidade Higroscópica		
Cápsula N°	-							52	23	
Peso Bruto Úmido	g							68,40	76,60	
Peso Bruto Seco	g							67,30	75,50	
Peso da Água	g							1,10	1,10	
Peso da Cápsula	g							19,11	20,59	
Peso do Solo Seco	g							48,19	54,91	
Umidade	%							2,28%	2,00%	
Umidade calculada	%	6,4%	8,4%	10,5%	12,5%	14,6%		2,1%		
Água Total	g	376	496	616	736	856		Peso do Material		
Água Adicionada	g	250	370	490	610	730		6.000,00		
% Água Adicionada	%	4,17%	6,17%	8,17%	10,17%	12,17%		P. Mat. Seco	Peso Água	
Peso Bruto Úmido	g	8.020	7.940	8.420	8.170	8.750		5.874	126	
Peos do Solo Úmido	g	3.620	3.855	4.195	4.045	4.036		Moldes		
Dens. Solo Úmido	g / m³	1.733	1.922	2.020	2.016	1.932		N°	Peso	Volume
Dens. Solo Seco	g / m³	1.629	1.772	1.828	1.792	1.686		34	4.400	2.089
Resultados:		Observações:								
H. Ótima	Dens. Máx	ISC	Expansão	23	4.085	2.006				
10,7 %	1.829	16,0	0,15	13	4.225	2.077				
				71	4.125	2.006				
				42	4.714	2.089				




Análise Gráfica

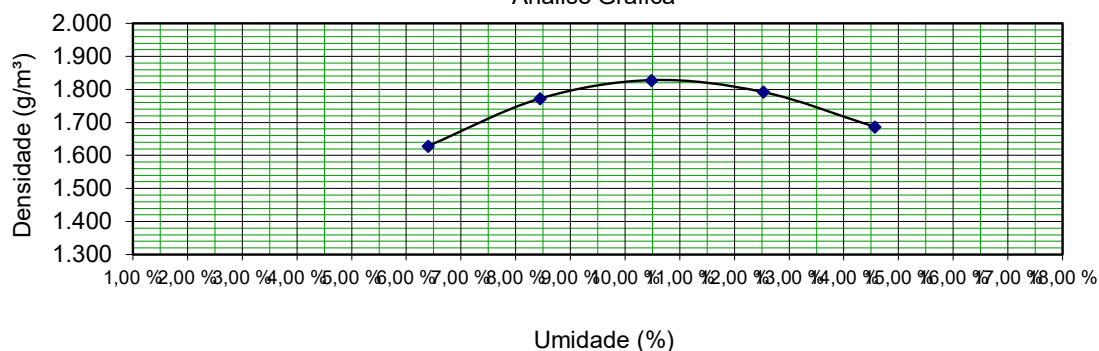

Índice de Suporte Califórnia

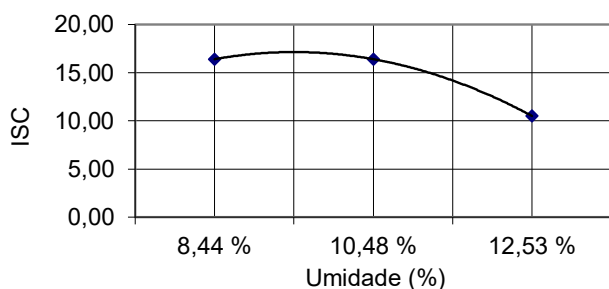

Expansão

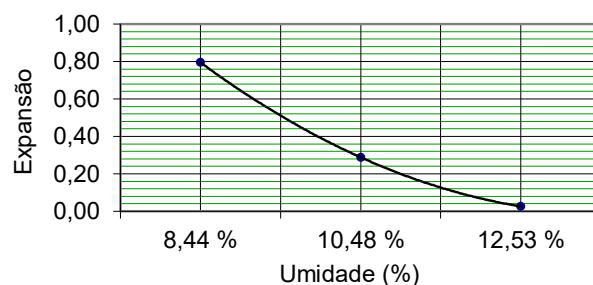



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE EXPANSÃO / I.S.C



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS


OBRA:		DATA:	10/07/2025
RODOVIA:	SEDE DE RORAINÓPOLIS	TRECHO:	BAIRRO VITÓRIA
ESTACA:	0	FURO:	18
LADO:	L / X	PROFUNDIDADE:	0,75
		GOLPES:	12
% MATERIAL RET. PEN. N° 4	0,00%	PROCTOR:	NORMAL
		MATERIAL:	Argila Silte Arenoso Siltosa Cinza

ENSAIO DE EXPANSÃO NORMA DNER - ME 049/94


MOLDE Nº 23		ALTURA 114,5			MOLDE Nº 13		ALTURA 114,5		MOLDE Nº 71		ALTURA 114,5	
DATA	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%
10/07/25	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00	0,00	0,00
												
14/07/25	09:00	1,91	0,91	0,79	09:00	1,33	0,33	0,29	09:00	1,03	0,03	0,03

ENSAIO DE I.S.C NORMA DNIT 172/2016 - ME


MOLDE Nº			23			K-PRENSA =			0,110	MOLDE Nº				13				MOLDE Nº				71			
PENETR. mm	TEMPO min	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %				
0.63	0.5	25	2,70			35	3,80			15	1,60														
1.27	1.0	40	4,40			65	7,10			25	2,70														
1.90	1.5	85	9,30			85	9,30			40	4,40														
2.54	2.0	105	11,50	70	16,40	105	11,50	70	16,40	65	7,10		70		10,10										
3.81	3.0	125	13,70			125	13,70			80	8,80														
5.08	4.0	140	15,40	105	14,70	156	17,10	105	16,30	100	11,00		105		10,50										
6.35	5.0	165	18,10			190	20,90			115	12,60														
7.62	6.0	185	20,30			225	24,70			125	13,70														
8.89	7.0	210	23,10			245	26,90			135	14,80														
10.16	8.0	225	24,70			270	29,60			145	15,90														
12.70	10.0	235	25,80			300	32,90			160	17,60														

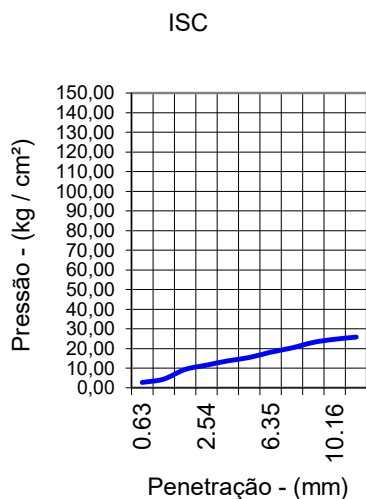

ISC = 16,40 %

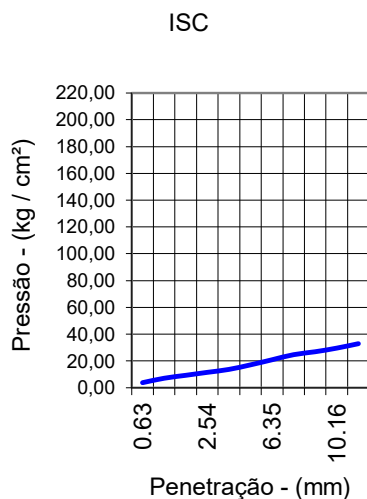

ISC = 16,40 %

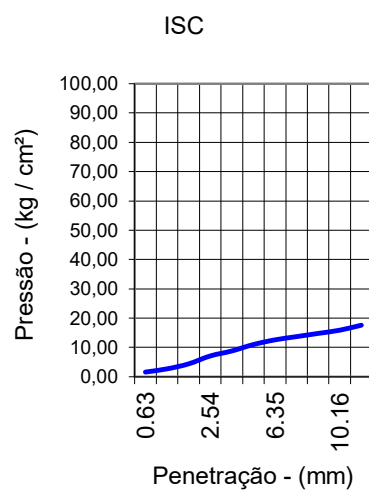

ISC = 10,50 %

RESUMO

DENSIDADE MÁXIMA:	1829 g / cm³	ISC :	16,05 %
ÚMIDADE ÓTIMA:	10,70 %	EXPANSÃO :	0,15 %



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda

**Análise Granulométrica NORMA DNER ME -080/94 (Simples)**


PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

Rodovia:	SEDE DE RORAINÓPOLIS	Profundidade:	0,75
Trecho:	BAIRRO VITÓRIA	Furo :	18
Procedência:	SONDGEM DE	Estaca:	0
Camada:	SUBLEITO	Operado	FERNADO
		Data:	10/07/25

UMIDADE HIDROSCÓPICA			DISCRIMINAÇÃO		AMOSTRA SECA	
					Total	Parcial
Cápsula (N°)	52	23	Cápsula (N°)		31	11
Peso Umido (g)	68,40	76,60	Peso Bruto Úmido (g)		1500,0	150,0
Peso Bruto Seco (g)	67,30	75,50	Peso Retido na # N° 10 (g)		4,40	
Peso da Água (g)	1,10	1,10	Peso Úmido Pass. na # N° 10 (g)		1495,60	
Peso da Cápsula (g)	19,11	20,59	Peso Seco Pass. na # N° 10 (g)		1464,30	
Peso do Solo Seco (g)	48,19	54,91	Peso da água (g)		31,30	
Umidade (%)	2,28	2,00	Peso da amostra Seca (g)		2 1468,7	3 146,9
Umidade Média (%)	2,1					



Peneiramento

Amostra Total	Peneiras		Peso Retido Parcial (g)	Peso que Passa Acumulado (g)	% que Passa Am. Total	FAIXA AASTHO		CONSTANTES
	Pol	mm				Mínimo	Máximo	
	2"	50,8	0,00	1468,7	100,0			$K_1=100 = 0,068$ 2
	1 1/2"	38,1	0,00	1468,7	100,0			$K_2 = \frac{4}{3} = 0,681$ 3
	1"	25,4	0,00	1468,7	100,0			
	3/8"	9,5	0,00	1468,7	100,0			
	4	4,8	0,00	1468,7	100,0			
	10	2,0	4,40	1464,3	100,0			
Amostra Parcial	40	0,42	38,70	108,2	74,0			
	200	0,074	85,00	23,2	16,0			

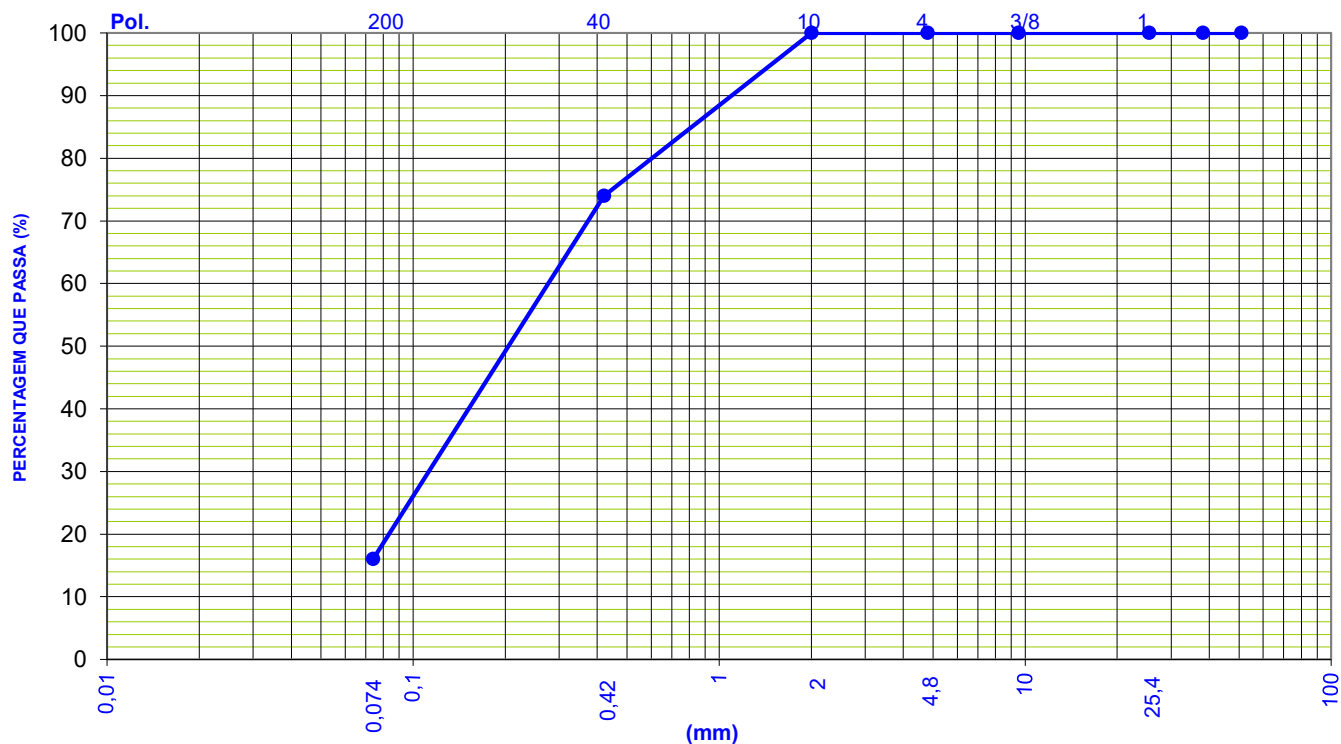**Resumo Granulometria (%)**

Pedregulho (> 4,8 mm)	0,0
Areia Grossa (4,8 - 2,0 mm)	0,0
Areia Média (2,0 - 0,42 mm)	26,0
Areia Fina (0,42 - 0,074 mm)	58,0
Passando (0,074 mm)	16,0
Total	100,0

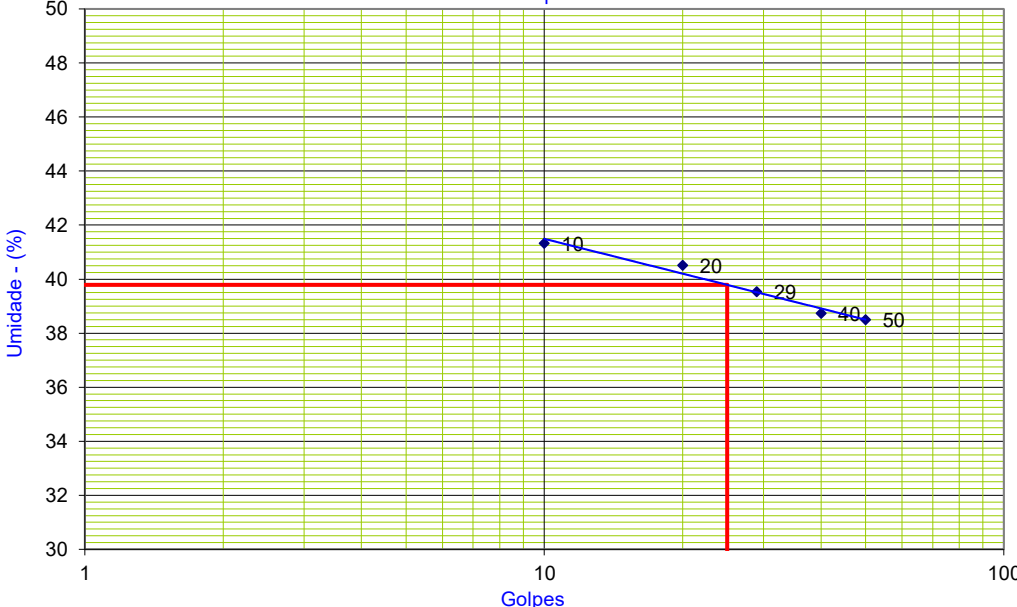

  MTEC CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda		LIMITES FÍSICOS  PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS					
Rodovia: ALG 138		Profund.: 0,75		OPERADO FERNADO			
Trecho: BAIRRO VITÓRIA		Furo : 18					
Procedência: SONDAGEM DE		Estaca: 0					
Camada: SUBLEITO		Data: 11/07/2025		LADO L / X			
LIMITE DE LIQUIDEZ NORMA DNER ME - 122/94							
Cápsula	N.º	31	95	85	77	41	
Golpes	g	10	20	29	40	50	
Peso Bruto Úmido	g	26,46	37,20	22,05	25,90	27,10	
Peso Bruto Seco	g	20,43	28,30	17,42	20,19	21,14	
Peso da Cápsula	g	5,84	6,33	5,71	5,45	5,66	
Peso da Água	g	6,03	8,90	4,63	5,71	5,96	
Peso do Solo Seco	g	14,59	21,97	11,71	14,74	15,48	
Umidade	%	41,33	40,51	39,54	38,74	38,50	
LIMITE DE PLASTICIDADE NORMA DNER ME - 082/94							
Cápsula	N.º	10	03	18	54	32	
Peso Bruto Úmido	g	8,26	8,25	7,77	7,39	7,64	
Peso Bruto Seco	g	7,80	7,75	7,34	7,01	7,28	
Peso da Cápsula	g	6,15	5,96	5,61	5,52	5,80	
Peso da Água	g	0,46	0,50	0,43	0,38	0,36	
Peso do Solo Seco	g	1,65	1,79	1,73	1,49	1,48	
Umidade	%	27,88	27,93	24,86	25,50	24,32	
Índice de Plasticidade LL= 39,8% LP = 25,2% IP= 14,6%		Limite de Liquidez 					



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE EXPANSÃO / I.S.C



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS

OBRA:

DATA:

10/07/2025

RODOVIA:

TRECHO:

OPERADO

SEDE DE RORAINÓPOLIS

BAIRRO VITÓRIA

FERNADO

ESTACA:

LADO:

FURO:

PROFUNDIDADE:

GOLPES:

ESTUDO:

0

L / X

19

0,70

12

SUBLEITO

% MATERIAL RET. PEN. N° 4

PROCTOR:

MATERIAL:

0,00%

NORMAL

Argila Silte Arenoso Siltosa Cinza

ENSAIO DE EXPANSÃO NORMA DNER - ME 049/94

MOLDE Nº 23		ALTURA 114,5			MOLDE Nº 37		ALTURA 114,5		MOLDE Nº 61		ALTURA 114,5	
DATA	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%
10/07/25	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00	0,00	0,00
												
14/07/25	09:00	1,68	0,68	0,59	09:00	1,21	0,21	0,18	09:00	1,03	0,03	0,03




ENSAIO DE I.S.C NORMA DNIT 172/2016 - ME

MOLDE Nº 23			K-PRENSA = 0,110			MOLDE Nº 37				MOLDE Nº 61			
PENETR. mm	TEMPO min	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %
0.63	0.5	10	1,10			31	3,40			5	0,50		
1.27	1.0	20	2,20			48	5,30			10	1,10		
1.90	1.5	35	3,80			60	6,60			15	1,60		
2.54	2.0	50	5,50	70	7,90	74	8,10	70	11,60	25	2,70	70	3,90
3.81	3.0	65	7,10			95	10,40			35	3,80		
5.08	4.0	80	8,80	105	8,40	115	12,60	105	12,00	45	4,90	105	4,70
6.35	5.0	105	11,50			140	15,40			60	6,60		
7.62	6.0	120	13,20			180	19,80			75	8,20		
8.89	7.0	135	14,80			220	24,20			90	9,90		
10.16	8.0	155	17,00			235	25,80			100	11,00		
12.70	10.0	170	18,70			250	27,50			110	12,10		




ISC

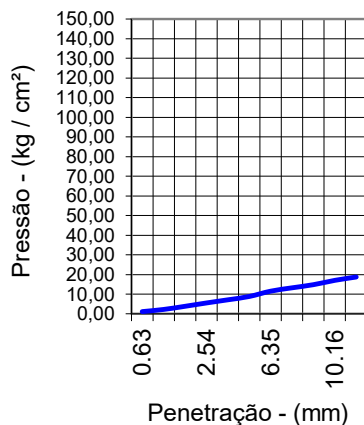


ISC = 8,40 %

ISC

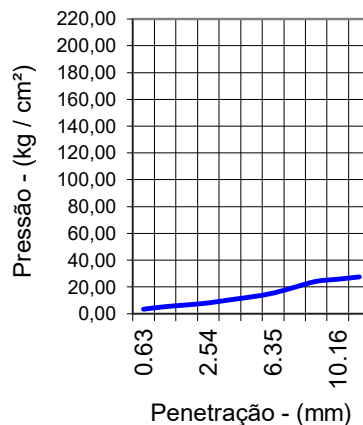

ISC = 12,00 %

ISC

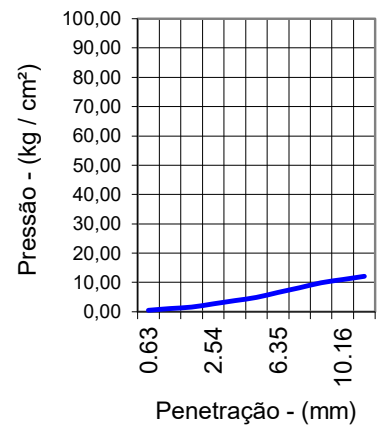

ISC = 4,70 %

RESUMO

DENSIDADE MÁXIMA: 1848 g / cm³

ISC : 11,81 %

ÚMIDADE ÓTIMA: 11,20 %

EXPANSÃO : 0,12 %



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda

**Análise Granulométrica NORMA DNER ME -080/94 (Simples)**


PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

Rodovia:	SEDE DE RORAINÓPOLIS	Profundidade:	0,70
Trecho:	BAIRRO VITÓRIA	Furo :	19
Procedência:	SONDGEM DE	Estaca:	0
Camada:	SUBLEITO	OPERADO	FERNADO
		Data:	10/07/25

UMIDADE HIDROSCÓPICA			DISCRIMINAÇÃO		AMOSTRA SECA	
					Total	Parcial
Cápsula (N°)	52	46	Cápsula (N°)		33	31
Peso Umido (g)	58,27	62,30	Peso Bruto Úmido (g)		1500,0	150,0
Peso Bruto Seco (g)	57,00	61,00	Peso Retido na # N° 10 (g)		22,90	
Peso da Água (g)	1,27	1,30	Peso Úmido Pass. na # N° 10 (g)		1477,10	
Peso da Cápsula (g)	19,11	20,59	Peso Seco Pass. na # N° 10 (g)		1430,10	
Peso do Solo Seco (g)	37,89	40,41	Peso da água (g)		47,00	
Umidade (%)	3,35	3,22	Peso da amostra Seca (g)		2 1453,0	3 145,2
Umidade Média (%)	3,3					


Peneiramento

Amostra Total	Peneiras		Peso Retido Parcial (g)	Peso que Passa Acumulado (g)	% que Passa Am.Total	FAIXA AASTHO		CONSTANTES
	Pol	mm				Mínimo	Máximo	
	2"	50,8	0,00	1453,0	100,0			K ₁ =100 = 0,069
	1 1/2"	38,1	0,00	1453,0	100,0			2
	1"	25,4	0,00	1453,0	100,0			K ₂ = 4 = 0,682
	3/8"	9,5	0,00	1453,0	100,0			3
	4	4,8	4,20	1448,8	100,0			
	10	2,0	18,70	1430,1	4 99,0			
Amostra Parcial	40	0,42	30,60	114,6	78,0			
	200	0,074	51,30	63,3	43,0			

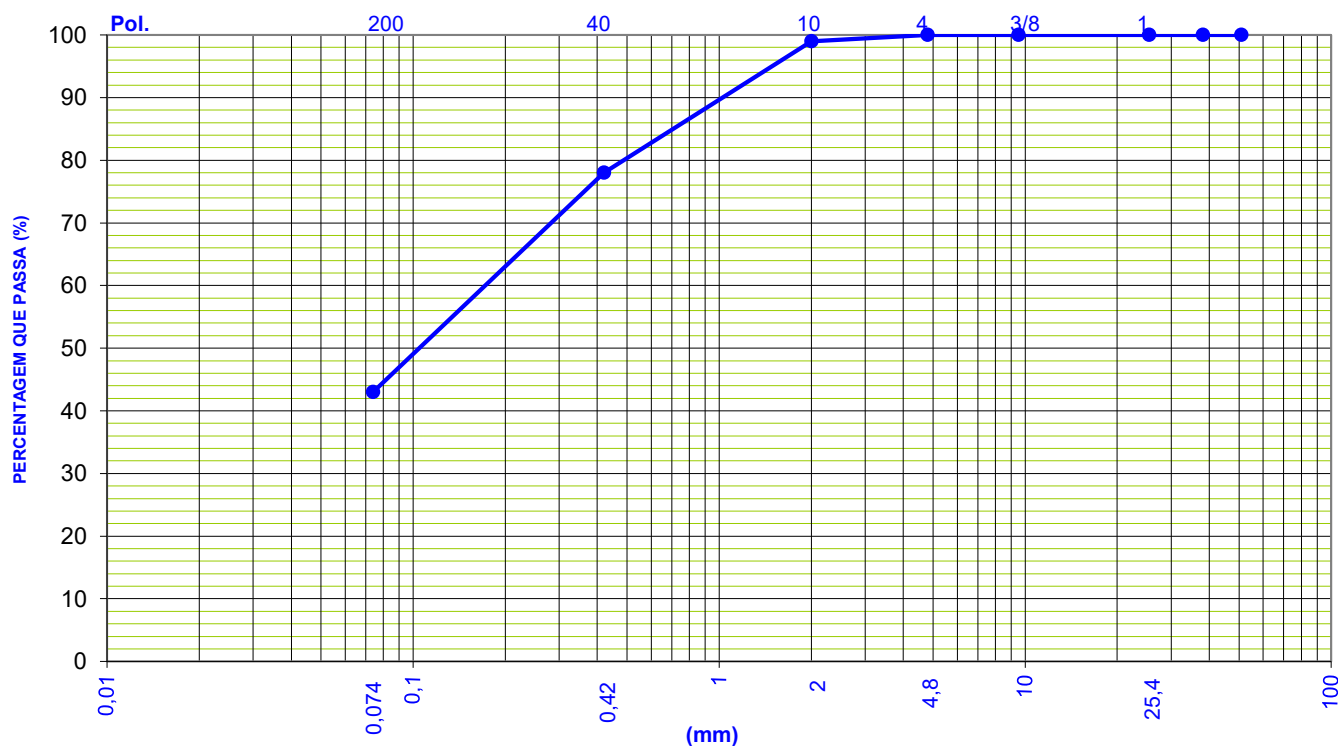**Resumo Granulometria (%)**

Pedregulho (> 4,8 mm)	0,0
Areia Grossa (4,8 - 2,0 mm)	1,0
Areia Média (2,0 - 0,42 mm)	21,0
Areia Fina (0,42 - 0,074 mm)	35,0
Passando (0,074 mm)	43,0
Total	100,0

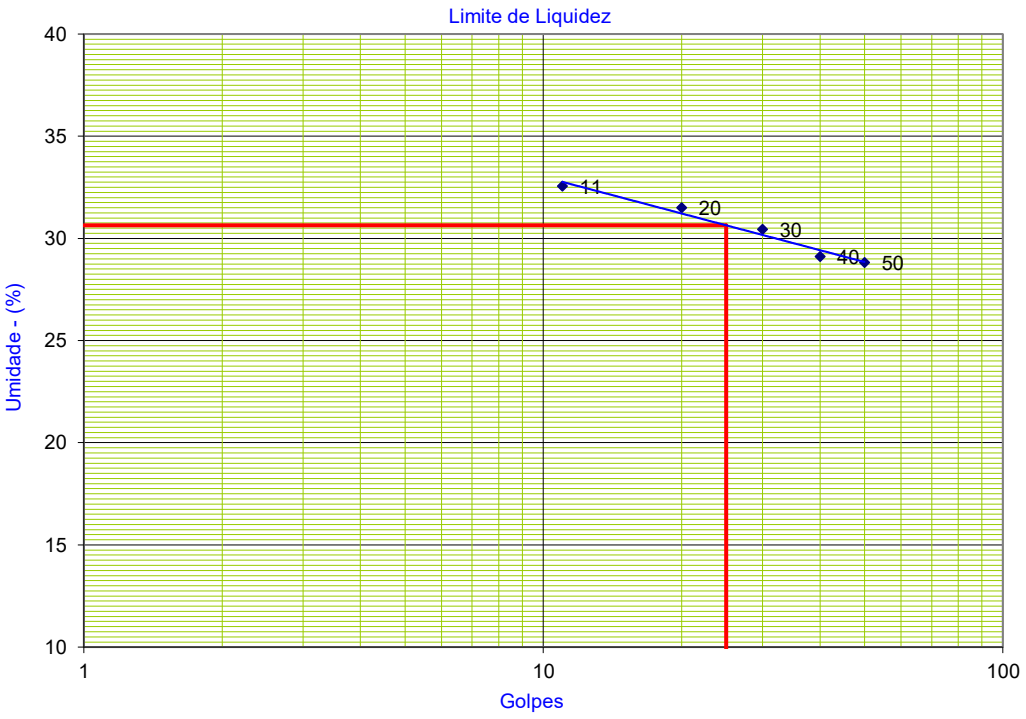

 		LIMITES FÍSICOS  PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS					
Rodovia: SEDE DE RORAINÓPOLIS		Profund.: 0,70		OPERADO FERNANDO			
Trecho: BAIRRO VITÓRIA		Furo : 19					
Procedência: SONDAGEM DE		Estaca: 0					
Camada: SUBLEITO		Data: 11/07/2025		LADO L / X			
LIMITE DE LIQUIDEZ NORMA DNER ME - 122/94							
Cápsula	N.º	54	21	35	98	79	
Golpes	g	11	20	30	40	50	
Peso Bruto Úmido	g	14,23	14,72	12,00	14,65	10,67	
Peso Bruto Seco	g	12,29	12,71	10,49	12,79	9,52	
Peso da Cápsula	g	6,33	6,33	5,53	6,40	5,53	
Peso da Água	g	1,94	2,01	1,51	1,86	1,15	
Peso do Solo Seco	g	5,96	6,38	4,96	6,39	3,99	
Umidade	%	32,55	31,50	30,44	29,11	28,82	
LIMITE DE PLASTICIDADE NORMA DNER ME - 082/94							
Cápsula	N.º	85	20	03	05	06	
Peso Bruto Úmido	g	8,62	8,05	7,96	7,93	6,49	
Peso Bruto Seco	g	8,27	7,67	7,56	7,56	6,30	
Peso da Cápsula	g	6,43	5,68	5,54	5,81	5,33	
Peso da Água	g	0,35	0,38	0,40	0,37	0,19	
Peso do Solo Seco	g	1,84	1,99	2,02	1,75	0,97	
Umidade	%	19,02	19,10	19,80	21,14	19,59	
Índice de Plasticidade LL= 30,6% LP = 19,4% IP= 11,2%							



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DNIT- 138/2010 - ES

E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA



Folha:


Única

Data:


10/07/2025

Rodovia: SEDE DE RORAINÓPOLIS		Trecho: BAIRRO VITÓRIA		Sub-trecho: RUA Q		Registro: SONDGEM DE				
Estaca:	Furo: 20	Profundidade: 0,85		Material: Argila Silte Arenoso Cinza		SUBLEITO				
% Mat. Ret. # N° 4: 1,00%	Próctor: NORMAL		Golpes: 12		Operador: FERNADO		Lado L / X			
Item	Unid.	1	2	3	4	5	6	Umidade Higroscópica		
Cápsula N°	-							2	31	
Peso Bruto Úmido	g							58,05	62,07	
Peso Bruto Seco	g							57,00	61,00	
Peso da Água	g							1,05	1,07	
Peso da Cápsula	g							19,11	20,59	
Peso do Solo Seco	g							37,89	40,41	
Umidade	%							2,77%	2,65%	
Umidade calculada	%	6,5%	8,5%	10,6%	12,6%	14,7%		2,7%		
Água Total	g	378	498	618	738	858		Peso do Material		
Água Adicionada	g	220	340	460	580	700		6.000,00		
% Água Adicionada	%	3,67%	5,67%	7,67%	9,67%	11,67%		P. Mat. Seco	Peso Água	
Peso Bruto Úmido	g	7.650	7.860	8.426	8.330	8.790		5.842	158	
Peos do Solo Úmido	g	3.525	3.775	4.182	3.998	4.076		Moldes		
Dens. Solo Úmido	g / m³	1.686	1.882	1.991	1.993	1.951		N°	Peso	Volume
Dens. Solo Seco	g / m³	1.583	1.734	1.801	1.769	1.701		20	4.125	2.091
Resultados:			Observações:							
H. Ótima	Dens. Máx	ISC	Expansão	22	4.085	2.006				
11,0 %	1.802	13,5	0,08	35	4.244	2.100				
				27	4.332	2.006				
				42	4.714	2.089				


Análise Gráfica

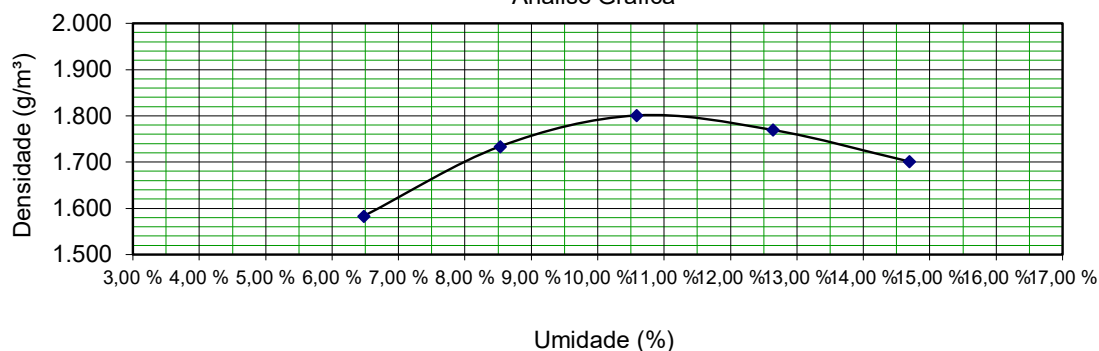

Índice de Suporte Califórnia

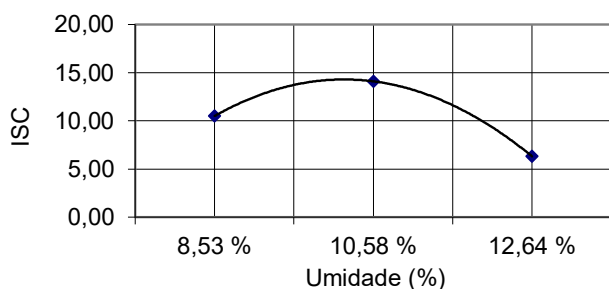

Expansão

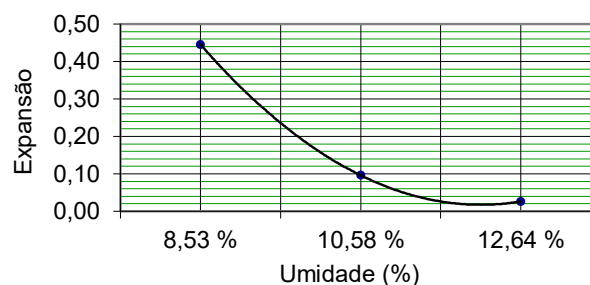



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA. Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE EXPANSÃO / I.S.C



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS

OBRA:						DATA:		10/07/2025	
RODOVIA:		TRECHO:				OPERADO			
SEDE DE RORAINÓPOLIS		BAIRRO VITÓRIA				FERNADO			
ESTACA:		LADO:	FURO:	PROFUNDIDADE:		GOLPES:		ESTUDO:	
0		L / X	20	0,85		12		SUBLEITO	
% MATERIAL RET. PEN. Nº 4		PROCTOR:			MATERIAL:				
1,00%		NORMAL			Argila Silte Arenoso Cinza				




ENSAIO DE EXPANSÃO NORMA DNER - ME 049/94

MOLDE Nº 22		ALTURA 114,5			MOLDE Nº 35		ALTURA 114,5		MOLDE Nº 27		ALTURA 114,5	
DATA	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%
10/07/25	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00	0,00	0,00
												
14/07/25	09:00	1,51	0,51	0,45	09:00	1,11	0,11	0,10	09:00	1,03	0,03	0,03



ENSAIO DE I.S.C NORMA DNIT 172/2016 - ME

MOLDE Nº 22			K-PRENSA = 0,110				MOLDE Nº 35				MOLDE Nº 27			
PENETR. mm	TEMPO min	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %		LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %
0.63	0.5	15	1,60				30	3,30			10	1,10		
1.27	1.0	20	2,20				50	5,50			15	1,60		
1.90	1.5	35	3,80				70	7,70			20	2,20		
2.54	2.0	55	6,00	70	8,60		90	9,90	70	14,10	35	3,80	70	5,40
3.81	3.0	85	9,30				125	13,70			45	4,90		
5.08	4.0	100	11,00	105	10,50		135	14,80	105	14,10	60	6,60	105	6,30
6.35	5.0	115	12,60				185	20,30			75	8,20		
7.62	6.0	130	14,30				205	22,50			80	8,80		
8.89	7.0	155	17,00				225	24,70			100	11,00		
10.16	8.0	175	19,20				260	28,50			110	12,10		
12.70	10.0	190	20,90				280	30,70			115	12,60		

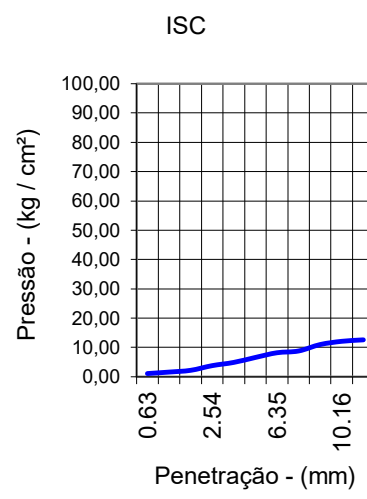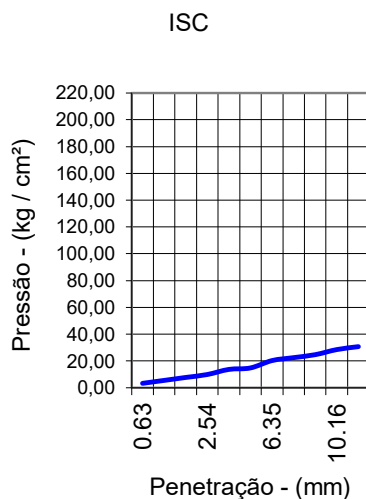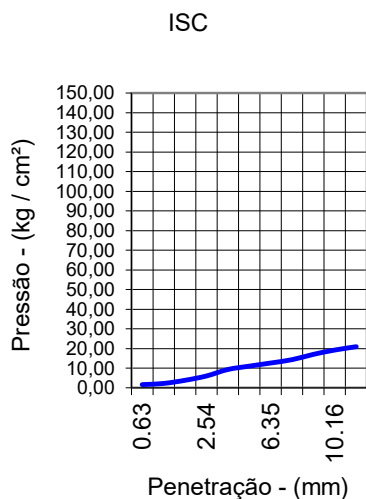

RESUMO


DENSIDADE MÁXIMA:	1802	g / cm³	ISC :	13,54	%
ÚMIDADE ÓTIMA:	10,95	%	EXPANSÃO :	0,08	%

Rodovia:	SEDE DE RORAINÓPOLIS	Profundidade:	0,85
Trecho:	BAIRRO VITÓRIA	Furo :	20
Procedência:		Estaca:	0
Camada:	SUBLEITO	OPERADO	FERNADO
		Data:	10/07/25

UMIDADE HIDROSCÓPICA			DISCRIMINAÇÃO		AMOSTRA SECA	
					Total	Parcial
Cápsula (N°)	02	31	Cápsula (N°)		33	31
Peso Umido (g)	58,05	62,07	Peso Bruto Úmido (g)		1500,0	150,0
Peso Bruto Seco (g)	57,00	61,00	Peso Retido na # N° 10 (g)		20,50	
Peso da Água (g)	1,05	1,07	Peso Úmido Pass. na # N° 10 (g)		1479,50	
Peso da Cápsula (g)	19,11	20,59	Peso Seco Pass. na # N° 10 (g)		1440,50	
Peso do Solo Seco (g)	37,89	40,41	Peso da água (g)		39,00	
Umidade (%)	2,77	2,65	Peso da amostra Seca (g)		2 1461,0	3 146,0
Umidade Média (%)	2,7					

Peneiramento

Amostra Total	Peneiras		Peso Retido Parcial (g)	Peso que Passa Acumulado (g)	% que Passa Am.Total	FAIXA AASTHO		CONSTANTES
	Pol	mm				Mínimo	Máximo	
	2"	50,8	0,00	1461,0	100,0			K ₁ =100 = 0,068
	1 1/2"	38,1	0,00	1461,0	100,0			2
	1"	25,4	0,00	1461,0	100,0			K ₂ = 4 = 0,671
	3/8"	9,5	0,00	1461,0	100,0			3
	4	4,8	1,30	1459,7	99,0			
	10	2,0	19,20	1440,5	98,0			4
Amostra Parcial	40	0,42	55,10	90,9	61,0			
	200	0,074	57,60	33,3	22,0			

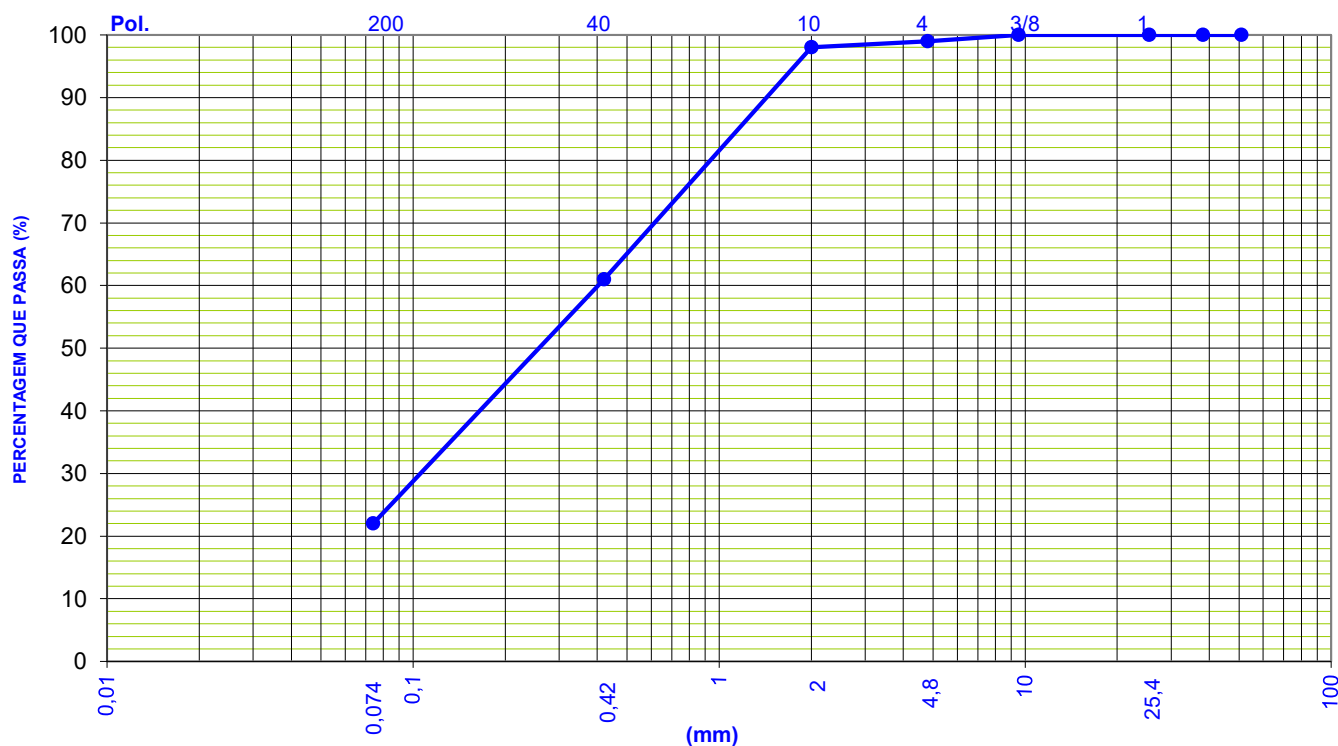

Resumo Granulometria (%)


Pedregulho (> 4,8 mm)	1,0
Areia Grossa (4,8 - 2,0 mm)	1,0
Areia Média (2,0 - 0,42 mm)	37,0
Areia Fina (0,42 - 0,074 mm)	39,0
Passando (0,074 mm)	22,0
Total	100,0



 		LIMITES FÍSICOS  PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	
Rodovia: SEDE DE RORAINÓPOLIS		Profund.: 0,85	OPERADO FERNANDO
Trecho: BAIRRO VITÓRIA		Furo : 20	
Procedência: SONDAGEM DE		Estaca: 0	
Camada: SUBLEITO		Data: 11/07/2025	LADO L / X

LIMITE DE LIQUIDEZ NORMA DNER ME - 122/94						
Cápsula	N.º	10	71	91	86	82
Golpes	g	11	20	30	40	50
Peso Bruto Úmido	g	14,28	14,78	12,05	14,72	10,70
Peso Bruto Seco	g	12,29	12,71	10,49	12,79	9,52
Peso da Cápsula	g	6,33	6,33	5,53	6,40	5,53
Peso da Água	g	1,99	2,07	1,56	1,93	1,18
Peso do Solo Seco	g	5,96	6,38	4,96	6,39	3,99
Umidade	%	33,39	32,45	31,45	30,20	29,57

LIMITE DE PLASTICIDADE NORMA DNER ME - 082/94						
Cápsula	N.º	04	15	07	18	21
Peso Bruto Úmido	g	8,66	8,09	7,99	7,92	6,51
Peso Bruto Seco	g	8,27	7,67	7,56	7,56	6,30
Peso da Cápsula	g	6,43	5,68	5,54	5,81	5,33
Peso da Água	g	0,39	0,42	0,43	0,36	0,21
Peso do Solo Seco	g	1,84	1,99	2,02	1,75	0,97
Umidade	%	21,20	21,11	21,29	20,57	21,65

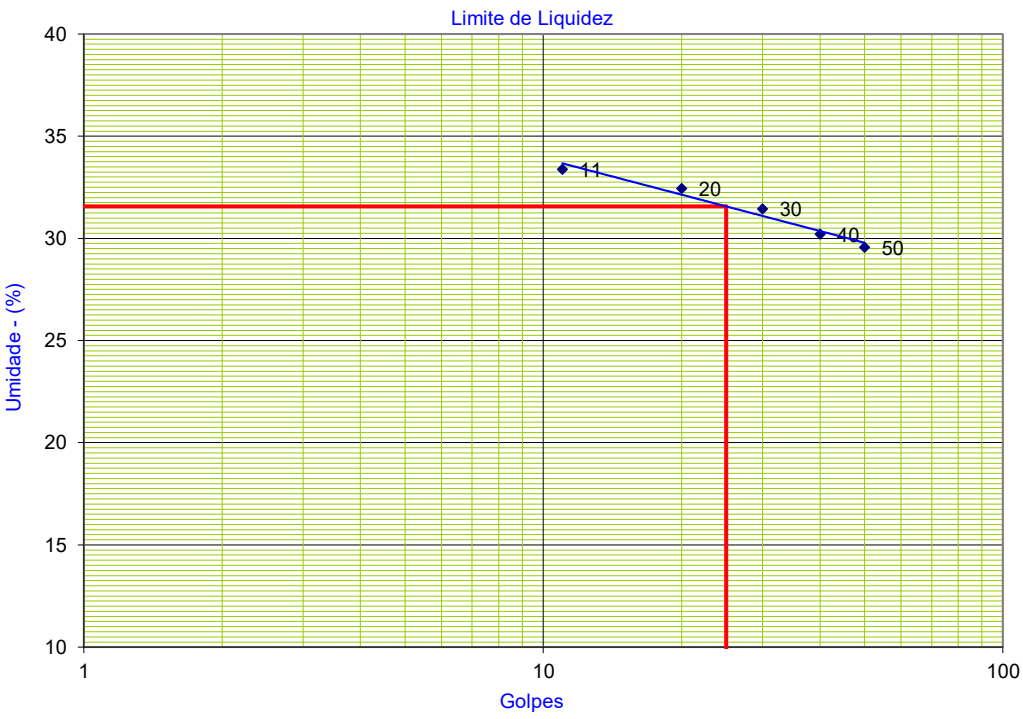Índice de Plasticidade LL= 31,6% LP = 21,2% IP= 10,4%		



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DNIT- 138/2010 - ES

E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA



Folha:

Única

Data:

10/07/2025

Rodovia:		Trecho:		Sub-trecho:		Registro:	
SEDE DE RORAINÓPOLIS		BAIRRO VITÓRIA		RUA R		SONDGEM DE	
Estaca:	Furo:	Profundidade:		Material:		SUBLEITO	
	21	0,75		Argila Arenoso Amarela			
% Mat. Ret. # N° 4:	Próctor:		Golpes:		Operador:		Lado
1,00%	NORMAL		12		FERNANDO		L / X
Item	Unid.	1	2	3	4	5	6
Cápsula N°	-						
Peso Bruto Úmido	g						
Peso Bruto Seco	g						
Peso da Água	g						
Peso da Cápsula	g						
Peso do Solo Seco	g						
Umidade	%						
Umidade calculada	%	6,8%	8,8%	10,9%	12,9%	15,0%	
Água Total	g	396	516	636	756	876	
Água Adicionada	g	235	355	475	595	715	
% Água Adicionada	%	3,92%	5,92%	7,92%	9,92%	11,92%	
Peso Bruto Úmido	g	7.680	7.880	8.446	8.220	8.690	
Peos do Solo Úmido	g	3.555	3.795	4.128	3.985	3.976	
Dens. Solo Úmido	g / m³	1.700	1.892	1.982	1.987	1.903	
Dens. Solo Seco	g / m³	1.592	1.738	1.787	1.759	1.655	
Resultados:		Observações:					
H. Ótima	Dens. Máx	ISC	Expansão				
11,2 %	1.788	13,0	0,12				



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE EXPANSÃO / I.S.C



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS




OBRA:		DATA:			
		10/07/2025			
RODOVIA:		TRECHO:		OPERADO:	
SEDE DE RORAINÓPOLIS		BAIRRO VITÓRIA		FERNANDO	
ESTACA:	LADO:	FURO:	PROFUNDIDADE:	GOLPES:	ESTUDO:
0	L / X	21	0,75	12	SUBLEITO
% MATERIAL RET. PEN. Nº 4		PROCTOR:		MATERIAL:	
1,00%		NORMAL		Argila Arenoso Amarela	

ENSAIO DE EXPANSÃO NORMA DNER - ME 049/94

MOLDE Nº		ALTURA			MOLDE Nº		ALTURA		MOLDE Nº		ALTURA	
23		114,5			36		114,5		61		114,5	
DATA	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%
10/07/25	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00	0,00	0,00
												
14/07/25	09:00	1,68	0,68	0,59	09:00	1,26	0,26	0,23	09:00	1,03	0,03	0,03

ENSAIO DE I.S.C NORMA DNIT 172/2016 - ME

MOLDE Nº 23			K-PRENSA =			0,110	MOLDE Nº 36				MOLDE Nº 61			
PENETR. mm	TEMPO min	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	
0.63	0.5	15	1,60			31	3,40			5	0,50			
1.27	1.0	25	2,70			50	5,50			10	1,10			
1.90	1.5	35	3,80			70	7,70			15	1,60			
2.54	2.0	40	4,40	70	6,30	85	9,30	70	13,30	25	2,70	70	3,90	
3.81	3.0	60	6,60			110	12,10			35	3,80			
5.08	4.0	75	8,20	105	7,80	125	13,70	105	13,00	55	6,00	105	5,70	
6.35	5.0	90	9,90			160	17,60			65	7,10			
7.62	6.0	115	12,60			200	22,00			80	8,80			
8.89	7.0	125	13,70			230	25,30			105	11,50			
10.16	8.0	140	15,40			255	28,00			110	12,10			
12.70	10.0	155	17,00			280	30,70			120	13,20			

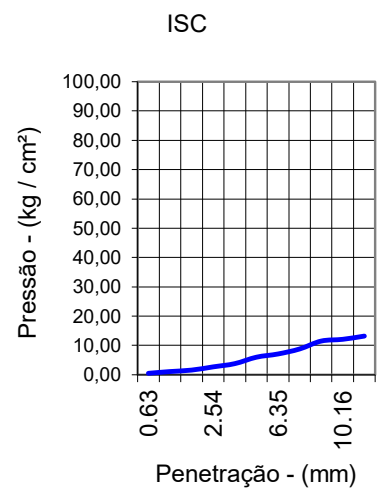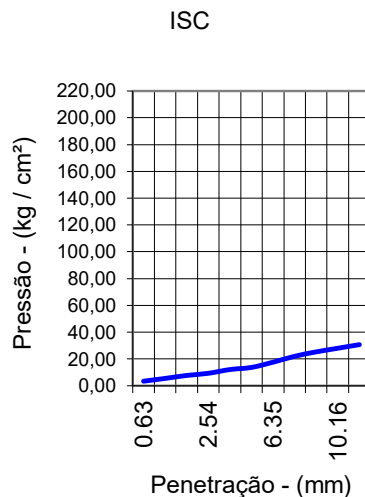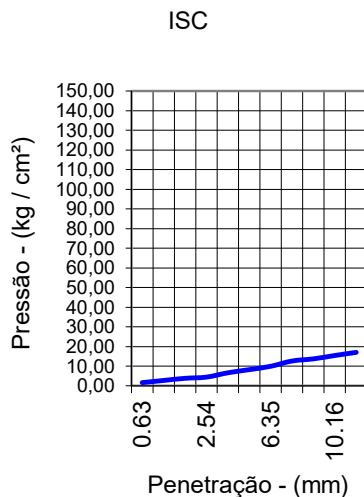

RESUMO

DENSIDADE MÁXIMA:	1788	g / cm³	ISC :	13,04	%
ÚMIDADE ÓTIMA:	11,16	%	EXPANSÃO :	0,12	%



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



Análise Granulométrica NORMA DNER ME -080/94 (Simples)




PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

Rodovia:	SEDE DE RORAINÓPOLIS	Profundidade:	0,75
Trecho:	BAIRRO VITÓRIA	Furo :	21
Procedência:	SONDAGEM DE	Estaca:	0
Camada:	SUBLEITO	Operado	FERNANDO
		Data:	10/07/25

UMIDADE HIDROSCÓPICA		DISCRIMINAÇÃO		AMOSTRA SECA	
				Total	Parcial
Cápsula (N°)	52	46	Cápsula (N°)	33	31
Peso Umido (g)	58,10	62,05	Peso Bruto Úmido (g)	1500,0	150,0
Peso Bruto Seco (g)	57,00	61,00	Peso Retido na # N° 10 (g)	30,40	
Peso da Água (g)	1,10	1,05	Peso Úmido Pass. na # N° 10 (g)	1469,60	
Peso da Cápsula (g)	19,11	20,59	Peso Seco Pass. na # N° 10 (g)	1430,30	
Peso do Solo Seco (g)	37,89	40,41	Peso da água (g)	39,30	
Umidade (%)	2,90	2,60	Peso da amostra Seca (g)	2 1460,7	3 146,0
Umidade Média (%)	2,8				

Peneiramento

Amostra Total	Peneiras		Peso Retido Parcial (g)	Peso que Passa Acumulado (g)	% que Passa Am. Total	FAIXA AASTHO		CONSTANTES
	Pol	mm				Mínimo	Máximo	
	2"	50,8	0,00	1460,7	100,0			K ₁ =100 = 0,068
	1 1/2"	38,1	0,00	1460,7	100,0			2
	1"	25,4	0,00	1460,7	100,0			K ₂ = 4 = 0,664
	3/8"	9,5	0,00	1460,7	100,0			3
	4	4,8	8,00	1452,7	99,0			
	10	2,0	22,40	1430,3	4 97,0			
Amostra Parcial	40	0,42	57,90	88,1	58,0			
	200	0,074	55,80	32,3	21,0			

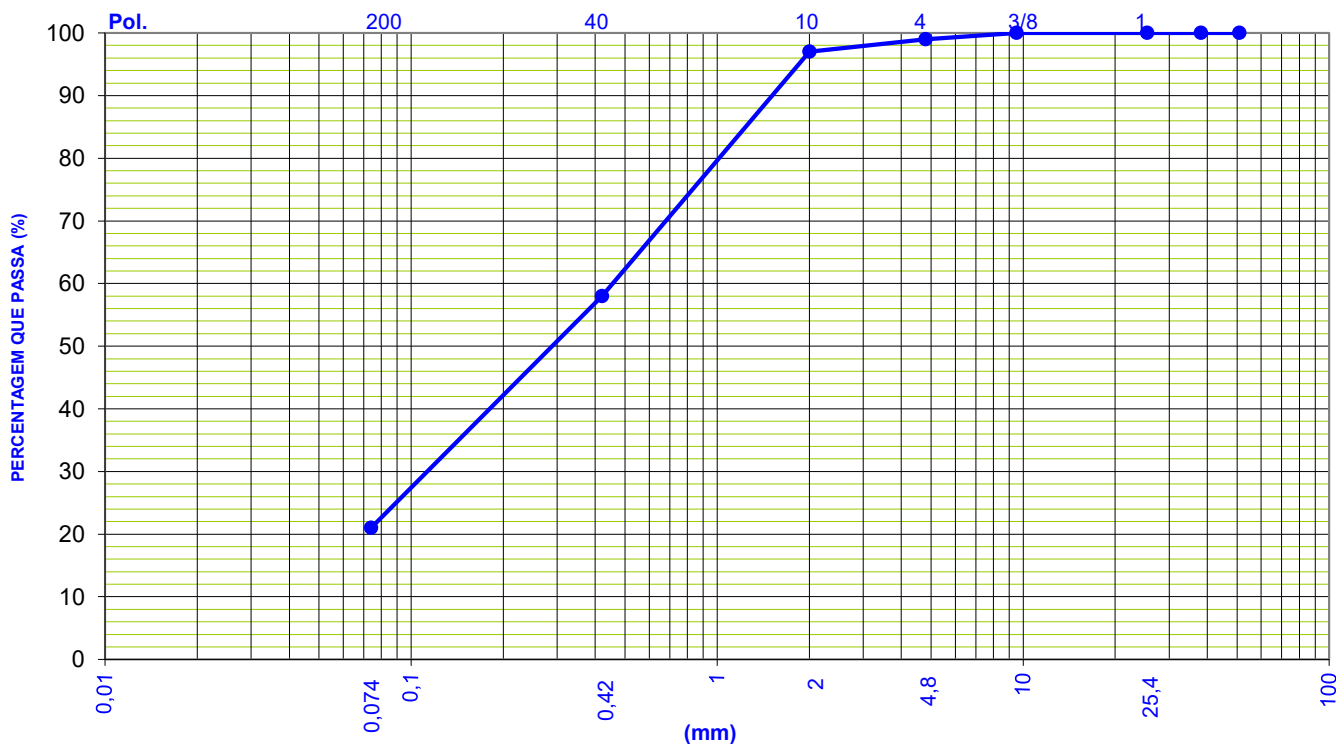

Resumo Granulometria (%)


Pedregulho (> 4,8 mm)	1,0
Areia Grossa (4,8 - 2,0 mm)	2,0
Areia Média (2,0 - 0,42 mm)	39,0
Areia Fina (0,42 - 0,074 mm)	37,0
Passando (0,074 mm)	21,0
Total	100,0



 		LIMITES FÍSICOS  RORAINÓPOLIS	
Rodovia: SEDE DE RORAINÓPOLIS		Profund.: 0,75	OPERADO FERNANDO
Trecho: BAIRRO VITÓRIA		Furo : 21	
Procedência: SONDAGEM DE		Estaca: 0	
Camada: SUBLEITO		Data: 11/07/2025	LADO L / X

LIMITE DE LIQUIDEZ NORMA DNER ME - 122/94						
Cápsula	N.º	54	21	35	98	79
Golpes	g	11	20	30	40	50
Peso Bruto Úmido	g	14,20	14,70	12,00	14,65	10,65
Peso Bruto Seco	g	12,29	12,71	10,49	12,79	9,52
Peso da Cápsula	g	6,33	6,33	5,53	6,40	5,53
Peso da Água	g	1,91	1,99	1,51	1,86	1,13
Peso do Solo Seco	g	5,96	6,38	4,96	6,39	3,99
Umidade	%	32,05	31,19	30,44	29,11	28,32

LIMITE DE PLASTICIDADE NORMA DNER ME - 082/94						
Cápsula	N.º	85	20	03	05	06
Peso Bruto Úmido	g	8,61	8,04	7,90	7,88	6,48
Peso Bruto Seco	g	8,27	7,67	7,56	7,56	6,30
Peso da Cápsula	g	6,43	5,68	5,54	5,81	5,33
Peso da Água	g	0,34	0,37	0,34	0,32	0,18
Peso do Solo Seco	g	1,84	1,99	2,02	1,75	0,97
Umidade	%	18,48	18,59	16,83	18,29	18,56

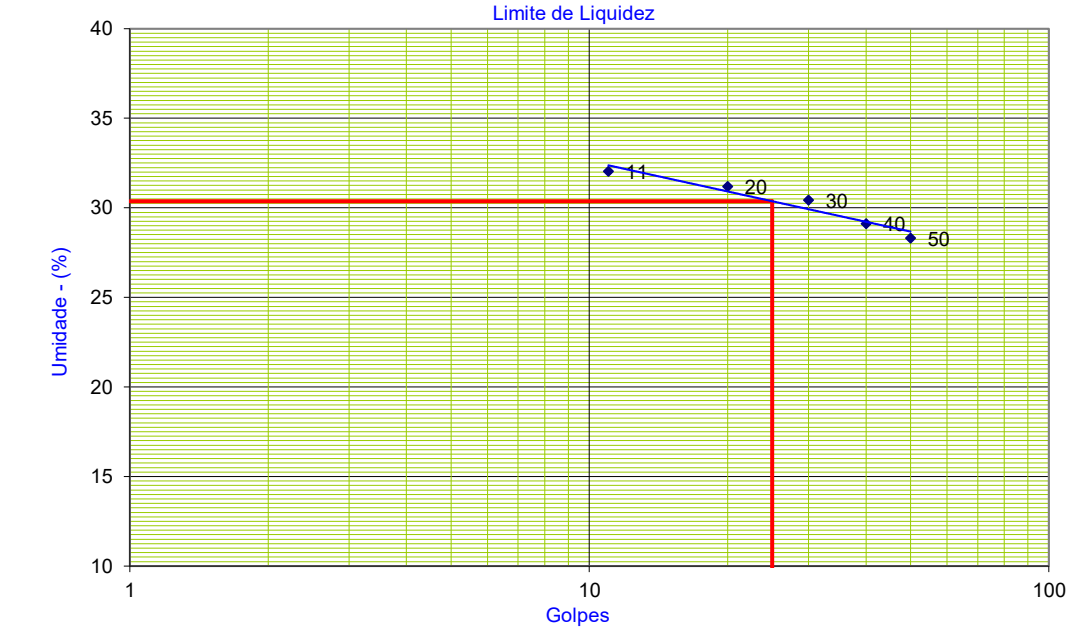Índice de Plasticidade LL= 30,4% LP = 18,5% IP= 11,9%		



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA. Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DNIT- 138/2010 - ES

E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA



Folha:


Única

Data:


11/07/2025

Rodovia: SEDE DE RORAINÓPOLIS		Trecho: BAIRRO VITÓRIA			Sub-trecho: RUA S		Registro: SONDAGEM DE					
Estaca:	Furo: 20		Profundidade: 0,60		Material: Argila Arenoso Siltosa Amarela		SUBLEITO					
% Mat. Ret. # Nº 4: 1,00%	Próctor: NORMAL			Golpes: 12		Operador: FERNANDO		Lado L / X				
Item	Unid.	1	2	3	4	5	6	Umidade Higroscópica				
Cápsula Nº	-							12	8			
Peso Bruto Úmido	g							81,50	65,10			
Peso Bruto Seco	g							80,30	63,90			
Peso da Água	g							1,20	1,20			
Peso da Cápsula	g							19,11	20,59			
Peso do Solo Seco	g							61,19	43,31			
Umidade	%							1,96%	2,77%			
Umidade calculada	%	6,3%	8,3%	10,4%	12,4%	14,5%		2,4%				
Água Total	g	369	489	609	729	849		Peso do Material				
Água Adicionada	g	230	350	470	590	710		6.000,00				
% Água Adicionada	%	3,83%	5,83%	7,83%	9,83%	11,83%		P. Mat. Seco	Peso Água			
Peso Bruto Úmido	g	7.720	7.850	8.370	8.190	8.200		5.861	139			
Peos do Solo Úmido	g	3.504	3.765	4.135	4.007	3.965		Moldes				
Dens. Solo Úmido	g / m³	1.680	1.877	2.008	1.998	1.926		Nº	Peso	Volume		
Dens. Solo Seco	g / m³	1.580	1.732	1.819	1.777	1.682		37	4.216	2.086		
Resultados:			Observações:									
H. Ótima	Dens. Máx	ISC	Expansão									
10,7 %	1.821	14,5	0,14									
								4	4.085	2.006		
								5	4.235	2.059		
								30	4.183	2.006		
								22	4.235	2.059		


Análise Gráfica

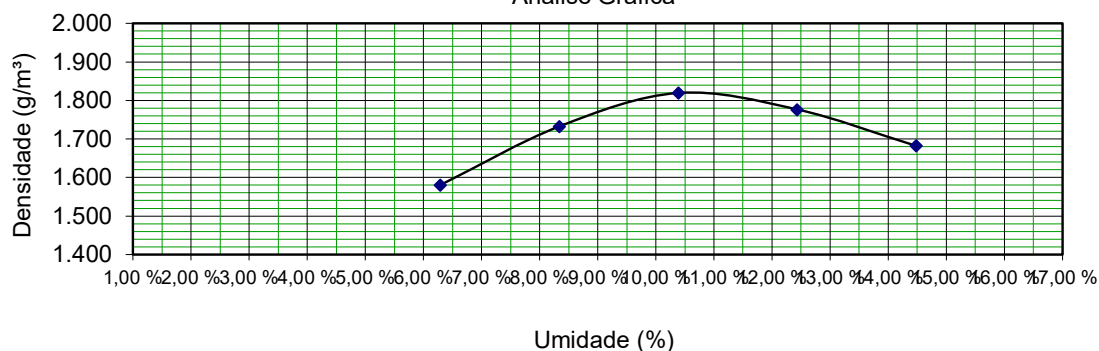

Índice de Suporte Califórnia

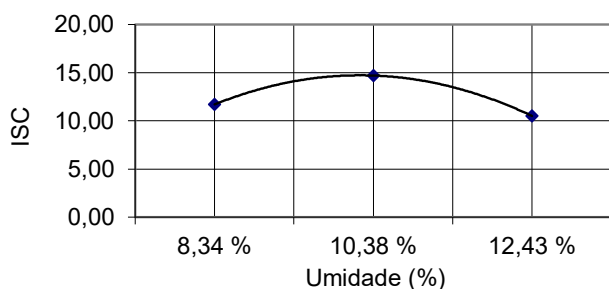

Expansão

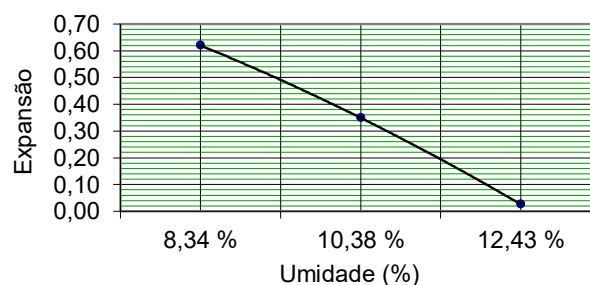



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA. Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE EXPANSÃO / I.S.C



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS

OBRA:

DATA:

11/07/2025

RODOVIA:

TRECHO:

OPERADO

SEDE DE RORAINÓPOLIS

BAIRRO VITÓRIA

FERNANDO

ESTACA:

LADO:

FURO:

PROFUNDIDADE:

GOLPES:

ESTUDO:

0

L / X

20

0,60

12

SUBLEITO

% MATERIAL RET. PEN. Nº 4

PROCTOR:

MATERIAL:

1,00%

NORMAL

Argila Arenoso Siltosa Amarela

ENSAIO DE EXPANSÃO NORMA DNER - ME 049/94

MOLDE Nº 4		ALTURA 114,5			MOLDE Nº 5		ALTURA 114,5		MOLDE Nº 30		ALTURA 114,5	
DATA	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%
11/07/25	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00	0,00	0,00
												
15/07/25	09:00	1,71	0,71	0,62	09:00	1,40	0,40	0,35	09:00	1,03	0,03	0,03




ENSAIO DE I.S.C NORMA DNIT 172/2016 - ME

MOLDE Nº 4			K-PRENSA =			0,110	MOLDE Nº 5				MOLDE Nº 30			
PENETR. mm	TEMPO min	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	
0.63	0.5	20	2,20			30	3,30			13	1,40			
1.27	1.0	35	3,80			40	4,40			25	2,70			
1.90	1.5	50	5,50			60	6,60			35	3,80			
2.54	2.0	75	8,20	70	11,70	85	9,30	70	13,30	55	6,00	70	8,60	
3.81	3.0	95	10,40			110	12,10			85	9,30			
5.08	4.0	105	11,50	105	11,00	140	15,40	105	14,70	100	11,00	105	10,50	
6.35	5.0	125	13,70			185	20,30			115	12,60			
7.62	6.0	140	15,40			200	22,00			130	14,30			
8.89	7.0	165	18,10			230	25,30			150	16,50			
10.16	8.0	185	20,30			260	28,50			168	18,40			
12.70	10.0	210	23,10			300	32,90			195	21,40			




ISC

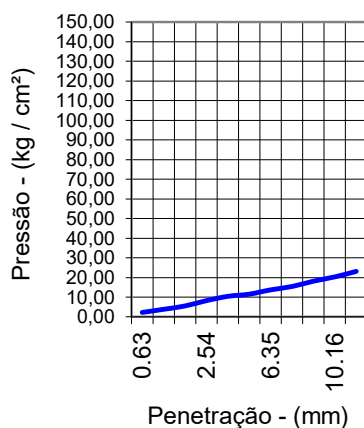


ISC = 11,70 %

ISC

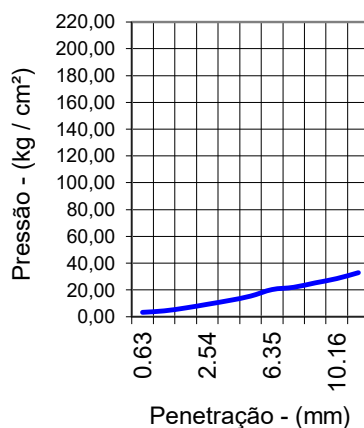

ISC = 14,70 %

ISC

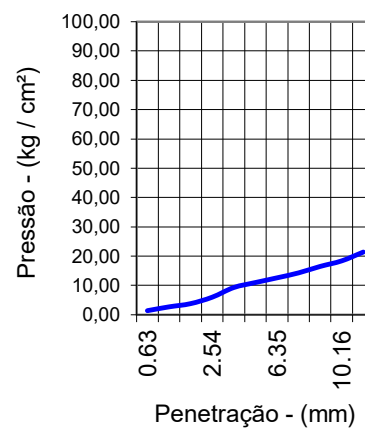

ISC = 10,50 %

RESUMO

DENSIDADE MÁXIMA: 1821 g / cm³

ISC : 14,49 %

ÚMIDADE ÓTIMA: 10,73 %

EXPANSÃO : 0,14 %



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



Análise Granulométrica NORMA DNER ME -080/94 (Simples)




PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

Rodovia:	SEDE DE RORAINÓPOLIS	Profundidade:	0,60
Trecho:	BAIRRO VITÓRIA	Furo :	20
Procedência:	SONDGEM DE	Estaca:	0
Camada:	SUBLEITO	OPERADO	FERNANDO
		Data:	11/07/25

UMIDADE HIDROSCÓPICA		DISCRIMINAÇÃO		AMOSTRA SECA	
				Total	Parcial
Cápsula (N°)	12	08	Cápsula (N°)	20	01
Peso Umido (g)	81,50	65,10	Peso Bruto Úmido (g)	1500,0	150,0
Peso Bruto Seco (g)	80,30	63,90	Peso Retido na # N° 10 (g)	18,80	
Peso da Água (g)	1,20	1,20	Peso Úmido Pass. na # N° 10 (g)	1481,20	
Peso da Cápsula (g)	19,11	20,59	Peso Seco Pass. na # N° 10 (g)	1447,00	
Peso do Solo Seco (g)	61,19	43,31	Peso da água (g)	34,20	
Umidade (%)	1,96	2,77	Peso da amostra Seca (g)	2 1465,8	3 146,5
Umidade Média (%)	2,4				

Peneiramento



Amostra Total	Peneiras		Peso Retido Parcial (g)	Peso que Passa Acumulado (g)	% que Passa Am.Total	FAIXA AASTHO		CONSTANTES
	Pol	mm				Mínimo	Máximo	
	2"	50,8	0,00	1465,8	100,0			$K_1=100 = 0,068$ 2
	1 1/2"	38,1	0,00	1465,8	100,0			
	1"	25,4	0,00	1465,8	100,0			$K_2= 4 = 0,669$ 3
	3/8"	9,5	0,00	1465,8	100,0			
	4	4,8	2,90	1462,9	99,0			
Amostra Parcial	10	2,0	15,90	1447,0	4 98,0			
	40	0,42	30,50	116,0	78,0			
	200	0,074	70,48	45,5	30,0			

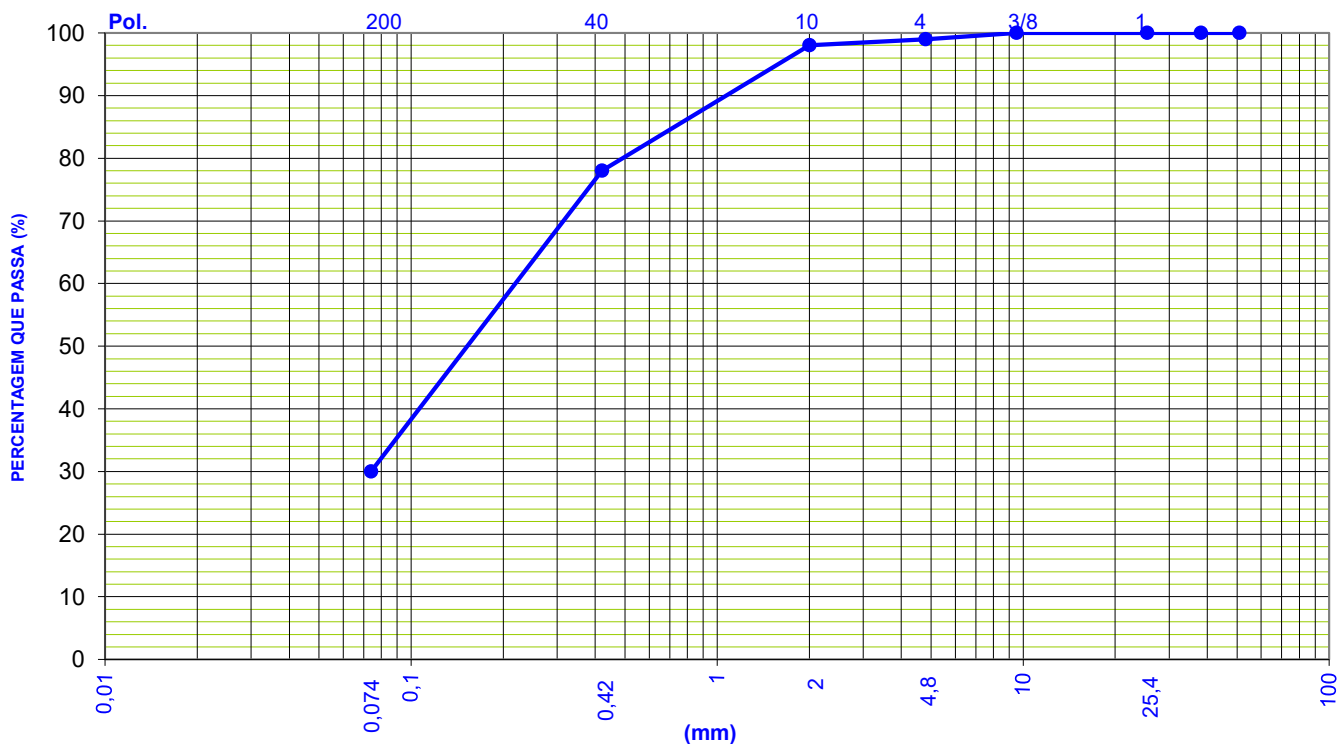

Resumo Granulometria (%)

Pedregulho (> 4,8 mm)	1,0
Areia Grossa (4,8 - 2,0 mm)	1,0
Areia Média (2,0 - 0,42 mm)	20,0
Areia Fina (0,42 - 0,074 mm)	48,0
Passando (0,074 mm)	30,0
Total	100,0

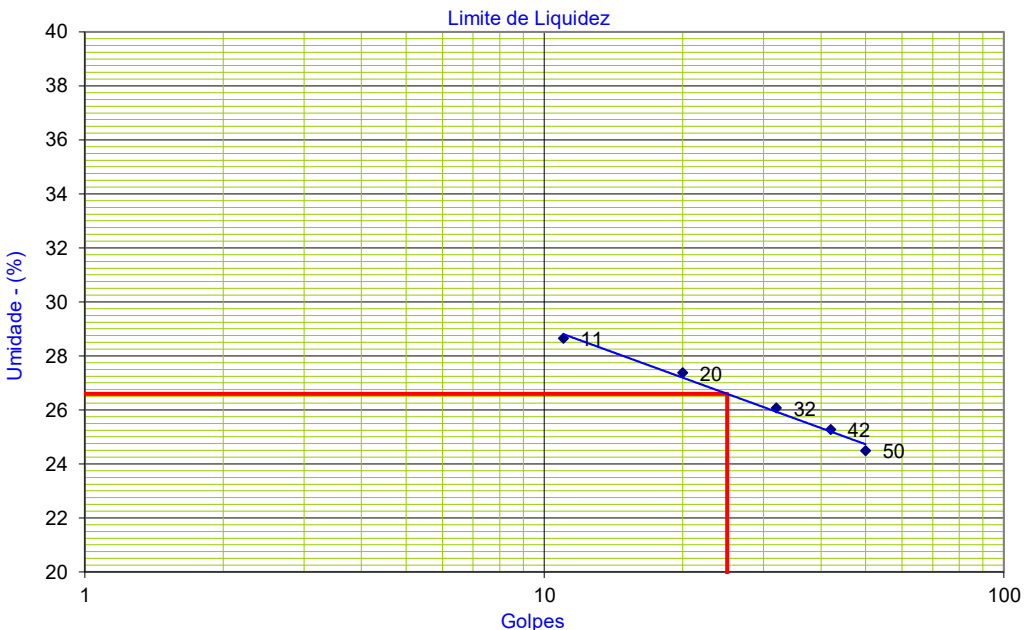

  MTEC CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda		LIMITES FÍSICOS  PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS					
Rodovia: SEDE DE RORAINÓPOLIS		Profund.: 0,60		OPERADO FERNANDO			
Trecho: BAIRRO VITÓRIA		Furo : 20					
Procedência: SONDAGEM DE		Estaca: 0					
Camada: SUBLEITO		Data: 12/07/2025		LADO L / X			
LIMITE DE LIQUEDEZ NORMA DNER ME - 122/94							
Cápsula	N.º	98	45	32	48	95	
Golpes	g	11	20	32	42	50	
Peso Bruto Úmido	g	32,48	30,17	31,95	29,48	31,29	
Peso Bruto Seco	g	26,60	25,43	26,60	24,72	26,65	
Peso da Cápsula	g	6,08	8,11	6,08	5,89	7,70	
Peso da Água	g	5,88	4,74	5,35	4,76	4,64	
Peso do Solo Seco	g	20,52	17,32	20,52	18,83	18,95	
Umidade	%	28,65	27,37	26,07	25,28	24,49	
LIMITE DE PLASTICIDADE NORMA DNER ME - 082/94							
Cápsula	N.º	75	35	15	95	34	
Peso Bruto Úmido	g	5,15	6,85	6,91	7,00	5,40	
Peso Bruto Seco	g	4,89	6,57	6,65	6,88	5,06	
Peso da Cápsula	g	3,32	4,90	5,11	6,10	3,31	
Peso da Água	g	0,26	0,28	0,26	0,12	0,34	
Peso do Solo Seco	g	1,57	1,67	1,54	0,78	1,75	
Umidade	%	16,56	16,77	16,88	15,38	19,43	
Índice de Plasticidade LL= 26,6% LP = 16,7% IP= 9,9%							


RELATÓRIO FOTOGRAFICO DE SONDAGEM DE SUBLEITO

PERIODO

JULHO 2025

**ALEX FABIAN
FERREIRA DA
SILVA**

Assinado de forma
digital por ALEX FABIAN
FERREIRA DA SILVA
Dados: 2025.09.22
11:35:11 -04'00'

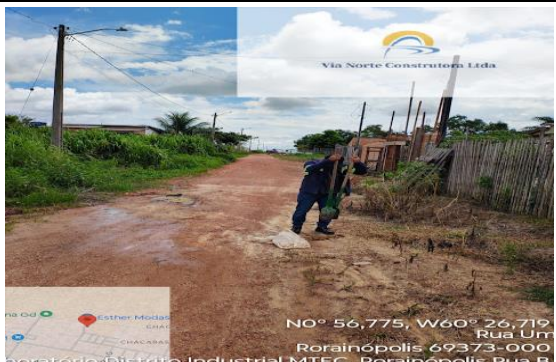 MTEC CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA  Via Norte Construtora Ltda	TRECHO: SEDE ROARAINÓPOLIS SUB TRECHO BAIRRO VITÓRIA Imagens de Campo SONDAGEM DE SUBLEITO	 PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS MÊS: JULHO / 2025
 SONDAGEM RUA A	 SONDAGEM RUA B	
 SONDAGEM RUA C	 SONDAGEM RUA D	
 SONDAGEM RUA E	 SONDAGEM RUA F	

ALEX FABIAN
FERREIRA DA
SILVA

Assinado de forma
digital por ALEX FABIAN
FERREIRA DA SILVA
Dados: 2025.09.22
11:36:42 -04'00'

 MTEC CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA  Via Norte Construtora Ltda	TRECHO: SEDE ROARAINÓPOLIS SUB TRECHO BAIRRO VITÓRIA Imagens de Campo SONDAGEM DE SUBLEITO	 PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS MÊS: JULHO / 2025
 SONDAGEM RUA G	 SONDAGEM RUA H	
 SONDAGEM RUA I	 SONDAGEM RUA J	
 SONDAGEM RUA L	 SONDAGEM RUA M	



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA



Via Norte Construtora Ltda

TRECHO: SEDE ROARAINÓPOLIS
SUB TRECHO BAIRRO VITÓRIA

Imagens de Campo

CAIXA DE EMPRESTIMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE

RORAINÓPOLIS

MÊS: JULHO / 2025




SONDAGEM RUA N



SONDAGEM RUA O



SONDAGEM RUA P

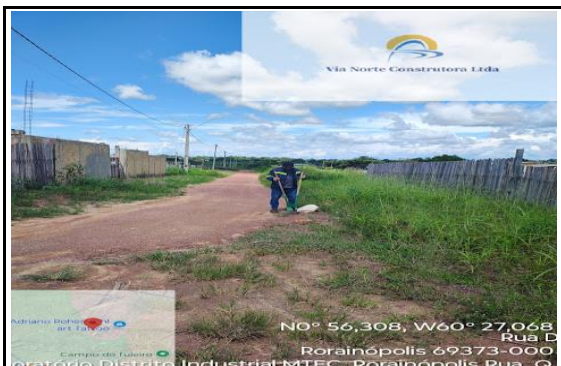

SONDAGEM RUA Q



SONDAGEM RUA S



SONDAGEM RUA V

 MTEC CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA  Via Norte Construtora Ltda	TRECHO: SEDE ROARAINÓPOLIS SUB TRECHO BAIRRO VITÓRIA LABORATORIO	 PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS MÊS: JULHO / 2025
		
ENSAIO DE EXPANSÃO	ENSAIO DE GRANULOMETRIA	
		
ENSAIO DE LIMITE FISICO LL	ENSAIO DE LIMITE FISICO IP	
		
ENSAIO DE UMIDADE HICLOSCOPICA	Foto 06 ENSAIO DE ISC	
		
SECAGEM DE SOLO	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO	

ALEX FABIAN
FERREIRA DA
SILVA

Assinado de forma digital
por ALEX FABIAN
FERREIRA DA SILVA
Dados: 2025.09.22
11:33:25 -04'00'

RELATÓRIO DE ENSAIO DE SUB-BASE

PERIODO

JULHO 2025

**ALEX FABIAN
FERREIRA DA
SILVA**

Assinado de forma
digital por ALEX FABIAN
FERREIRA DA SILVA
Dados: 2025.09.22
11:34:01 -04'00'

[illegible]



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DNIT- 139/2010 - ES

E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS

Folha:


Única

Data:


15/07/2025

Rodovia: BR : 174		Trecho: VICINAL 8 MARTIHIS PEREIRA			Sub-trecho: KM 20,900			Registro: ESTUDO DE JAZIDA			
Estaca:		Furo: 1		Profundidade: 0,15 1,20		Material: Solo Lateritico Argiloso Vermelho			SUB-BASE		
% Mat. Ret. # N° 4: 35,00%		Próctor: intermediario			Golpes: 26		Operador: GABRIEL		Lado L / E		
Item		Unid.	1	2	3	4	5	6	Umidade Higroscópica		
Cápsula N°		-							3	23	
Peso Bruto Úmido		g							83,97	88,56	
Peso Bruto Seco		g							81,87	86,54	
Peso da Água		g							2,10	2,02	
Peso da Cápsula		g							19,07	20,59	
Peso do Solo Seco		g							62,8	65,95	
Umidade		%							3,34%	3,06%	
Umidade calculada		%	5,7%	7,8%	9,8%	11,9%	14,0%		3,2%		
Água Total		g	387	527	667	807	947		Peso do Material		
Água Adicionada		g	170	310	450	590	730		7.000,00		
% Água Adicionada		%	2,43%	4,43%	6,43%	8,43%	10,43%		P. Mat. Seco	Peso Água	
Peso Bruto Úmido		g	8.180	8.300	8.860	8.690	9.050		6.783	217	
Peos do Solo Úmido		g	3.780	4.215	4.600	4.455	4.336		Moldes		
Dens. Solo Úmido		g / m³	1.809	2.101	2.234	2.221	2.076		N°	Peso	Volume
Dens. Solo Seco		g / m³	1.712	1.950	2.034	1.985	1.821		34	4.400	2.089
Resultados:				Observações:							
H. Ótima	Dens. Máx	ISC	Expansão	31	4.085	2.006					
10,1 %	2.035	46,4	0,10	7	4.260	2.059					
				22	4.235	2.006					
				42	4.714	2.089					


Análise Gráfica

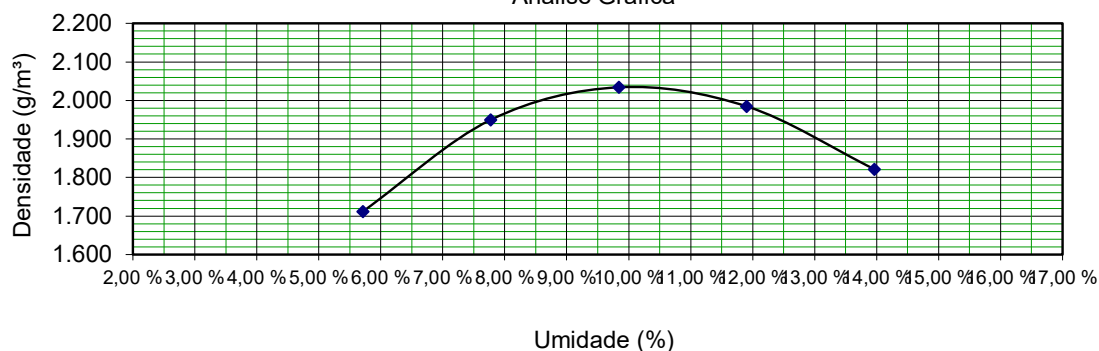

Índice de Suporte Califórnia

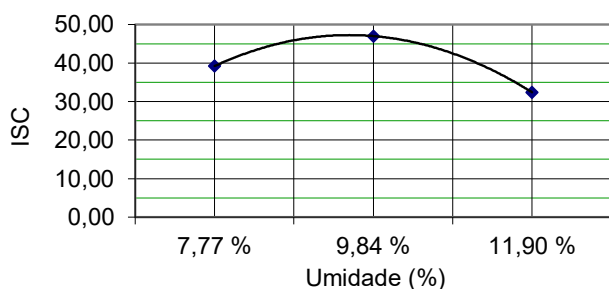

Expansão

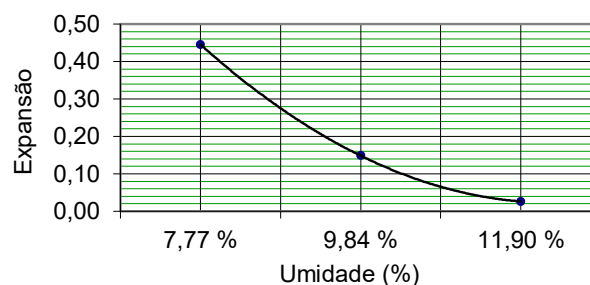



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE EXPANSÃO / I.S.C

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS




TRECHO:					DATA:	
VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA					15/07/2025	
RODOVIA:		SUB-TRECHO			OPERADO	
BR : 174		KM 20,900			GABRIEL	
ESTACA:	LADO:	FURO:	PROFUNDIDADE:	GOLPES:	ESTUDO:	
0	L / E	1	0,15 1,20	26	SUB-BASE	
% MATERIAL RET. PEN. Nº 4		PROCTOR:		MATERIAL:		
35,00%		intermediario		Solo Laterítico Argiloso Vermelho		

ENSAIO DE EXPANSÃO NORMA DNER - ME 049/94

MOLDE Nº	31	ALTURA			114,5	MOLDE Nº	7	ALTURA			114,5	MOLDE Nº	22	ALTURA			114,5
DATA	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%		HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%			HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%		
15/07/25	10:00	1,00		0,00		10:00	1,00		0,00			10:00	1,00	0,00	0,00		
19/07/25	09:00	1,51	0,51	0,45		09:00	1,17	0,17	0,15			09:00	1,03	0,03	0,03		

ENSAIO DE I.S.C NORMA DNIT 172/2016 - ME

MOLDE Nº 31			K-PRENSA = 0,110			MOLDE Nº 7				MOLDE Nº 22			
PENETR. mm	TEMPO min	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %
0.63	0.5	85	9,30			100	11,00			55	6,00		
1.27	1.0	115	12,60			140	15,40			100	11,00		
1.90	1.5	160	17,60			210	23,10			125	13,70		
2.54	2.0	210	23,10	70	33,00	280	30,70	70	43,90	185	20,30	70	29,00
3.81	3.0	285	31,30			330	36,20			245	26,90		
5.08	4.0	375	41,20	105	39,20	450	49,40	105	47,00	310	34,00	105	32,40
6.35	5.0	490	53,80			560	61,50			395	43,40		
7.62	6.0	540	59,30			680	74,70			485	53,30		
8.89	7.0	630	69,20			760	83,40			575	63,10		
10.16	8.0	720	79,10			850	93,30			650	71,40		
12.70	10.0	860	94,40			960	105,40			700	76,90		

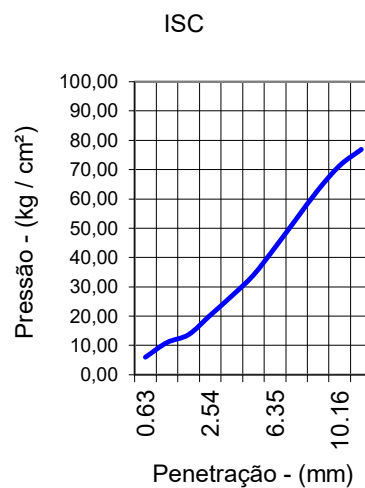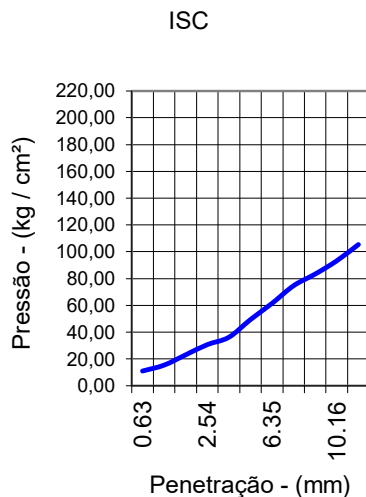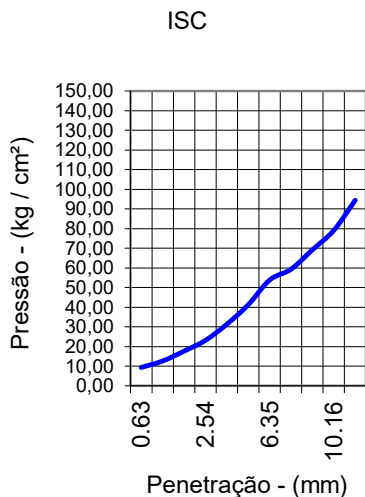

RESUMO

DENSIDADE MÁXIMA: 2035 g / cm³	ISC : 46,36 %
ÚMIDADE ÓTIMA: 10,11 %	EXPANSÃO : 0,10 %



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda

**Análise Granulométrica NORMA DNER ME -080/94 (Simples)**


PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

Rodovia:	BR : 174	Profundidade:	0,15 1,20
Trecho:	VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA	Furo :	1
Procedência:	ESTUDO DE JAZIDA	Estaca:	0
Camada:	SUB-BASE	OPERADO	GABRIEL
		Data:	15/07/25

UMIDADE HIDROSCÓPICA			DISCRIMINAÇÃO		AMOSTRA SECA	
					Total	Parcial
Cápsula (N°)	03	23	Cápsula (N°)		31	11
Peso Umido (g)	83,97	88,56	Peso Bruto Úmido (g)		2000,0	200,0
Peso Bruto Seco (g)	81,87	86,54	Peso Retido na # N° 10 (g)		847,95	
Peso da Água (g)	2,10	2,02	Peso Úmido Pass. na # N° 10 (g)		1152,05	
Peso da Cápsula (g)	19,07	20,59	Peso Seco Pass. na # N° 10 (g)		1116,30	
Peso do Solo Seco (g)	62,80	65,95	Peso da água (g)		35,75	
Umidade (%)	3,34	3,06	Peso da amostra Seca (g)		1964,3	193,8
Umidade Média (%)	3,2					

Peneiramento

Amostra Total	Peneiras		Peso Retido Parcial (g)	Peso que Passa Acumulado (g)	% que Passa Am.Total	FAIXA AASTHO		CONSTANTES
	Pol	mm				Mínimo	Máximo	
	2"	50,8	0,00	1964,3	100,0			K ₁ =100 = 0,051
	1 1/2"	38,1	0,00	1964,3	100,0			
	1"	25,4	61,71	1902,6	97,0			K ₂ = 4 = 0,294
	3/8"	9,5	230,84	1671,8	85,0			
	4	4,8	389,01	1282,8	65,0			
	10	2,0	166,39	1116,4	57,0			
Amostra Parcial	40	0,42	59,12	134,7	40,0			
	200	0,074	89,22	45,5	13,0			

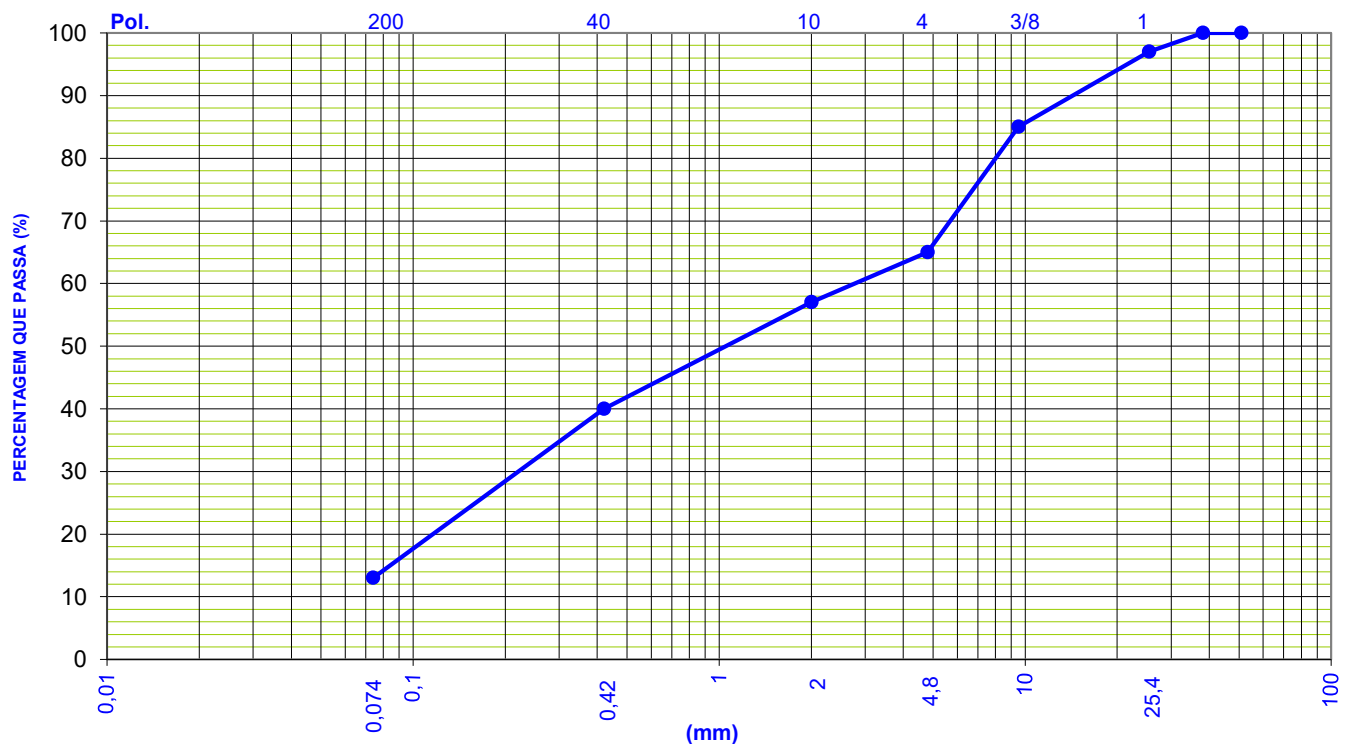**Resumo Granulometria (%)**

Pedregulho (> 4,8 mm)	35,0
Areia Grossa (4,8 - 2,0 mm)	8,0
Areia Média (2,0 - 0,42 mm)	17,0
Areia Fina (0,42 - 0,074 mm)	27,0
Passando (0,074 mm)	13,0
Total	100,0





MTEC
CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



LIMITES FÍSICOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS

Rodovia: RR - 171

Profund.: 0,15 1,20

OPERADO GABRIEL

Trecho: VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA

Furo : 1

Procedência: ESTUDO DE JAZIDA

Estaca: 0

Camada: SUB-BASE

Data: 16/07/2025

LADO L / E

LIMITE DE LIQUIDEZ NORMA DNER ME - 122/94

Cápsula	N.º	53	84	66	21	79
Golpes	g	10	20	29	40	50
Peso Bruto Úmido	g	25,55	35,55	21,23	24,78	25,79
Peso Bruto Seco	g	20,43	28,30	17,42	20,19	21,14
Peso da Cápsula	g	5,84	6,33	5,71	5,45	5,66
Peso da Água	g	5,12	7,25	3,81	4,59	4,65
Peso do Solo Seco	g	14,59	21,97	11,71	14,74	15,48
Umidade	%	35,09	33,00	32,54	31,14	30,04



LIMITE DE PLASTICIDADE NORMA DNER ME - 082/94

Cápsula	N.º	21	16	07	32	38
Peso Bruto Úmido	g	8,20	8,18	7,75	7,34	7,61
Peso Bruto Seco	g	7,80	7,75	7,34	7,01	7,28
Peso da Cápsula	g	6,15	5,96	5,61	5,52	5,80
Peso da Água	g	0,40	0,43	0,41	0,33	0,33
Peso do Solo Seco	g	1,65	1,79	1,73	1,49	1,48
Umidade	%	24,24	24,02	23,70	22,15	22,30




Índice de
Plasticidade

LL= 32,5%

LP = 23,3%

I P= 9,2%

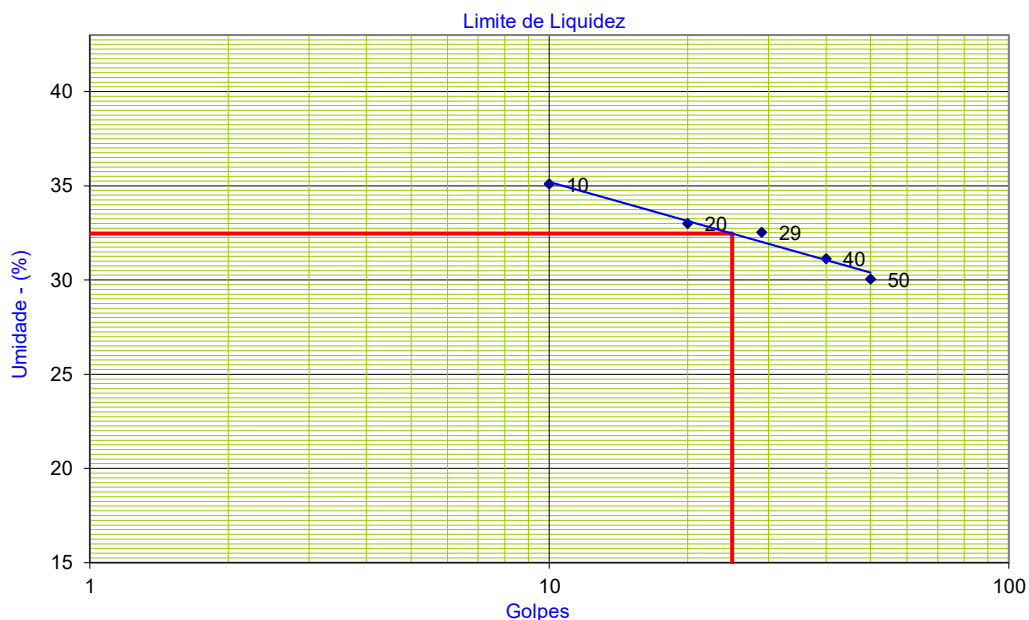



MTEC
CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA



Via Norte Construtora Ltda

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DNIT- 139/2010 - ES

E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS

Folha:


Única

Data:


16/07/2025

Rodovia: BR : 174		Trecho: VICINAL 8 MARTIHIS PEREIRA			Sub-trecho: KM 20,900			Registro: ESTUDO DE JAZIDA						
Estaca:		Furo: 2		Profundidade: 0,15 1,20		Material: Solo Lateritico Argiloso Vermelho			SUB-BASE					
% Mat. Ret. # N° 4: 63,00%		Próctor: intermediario			Golpes: 26		Operador: FERNANDO		Lado L / E					
Item		Unid.	1	2	3	4	5	6	Umidade Higroscópica					
Cápsula N°		-							2	31				
Peso Bruto Úmido		g							58,17	62,50				
Peso Bruto Seco		g							57,00	61,00				
Peso da Água		g							1,17	1,50				
Peso da Cápsula		g							19,11	20,59				
Peso do Solo Seco		g							37,89	40,41				
Umidade		%							3,09%	3,71%				
Umidade calculada		%	5,4%	7,5%	9,5%	11,6%	13,7%		3,4%					
Água Total		g	365	505	645	785	925		Peso do Material					
Água Adicionada		g	135	275	415	555	695		7.000,00					
% Água Adicionada		%	1,93%	3,93%	5,93%	7,93%	9,93%		P. Mat. Seco	Peso Água				
Peso Bruto Úmido		g	7.750	8.250	8.756	8.620	8.890		6.770	230				
Peos do Solo Úmido		g	3.625	4.165	4.716	4.422	4.176		Moldes					
Dens. Solo Úmido		g / m³	1.734	2.076	2.231	2.204	1.999		N°	Peso	Volume			
Dens. Solo Seco		g / m³	1.645	1.932	2.037	1.975	1.759		20	4.125	2.091			
Resultados:				Observações:								31	4.085	2.006
												14	4.040	2.114
H. Ótima	Dens. Máx	ISC	Expansão	3	4.198	2.006								
9,8 %	2.038	43,3	0,11	42	4.714	2.089								


Análise Gráfica

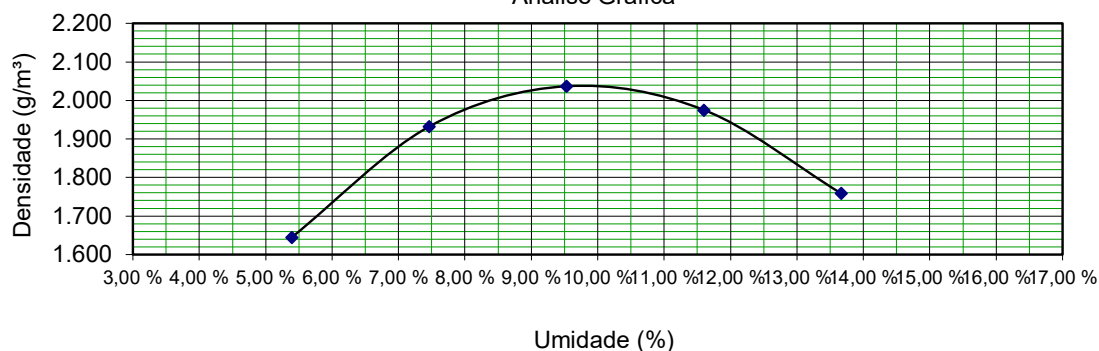

Índice de Suporte Califórnia

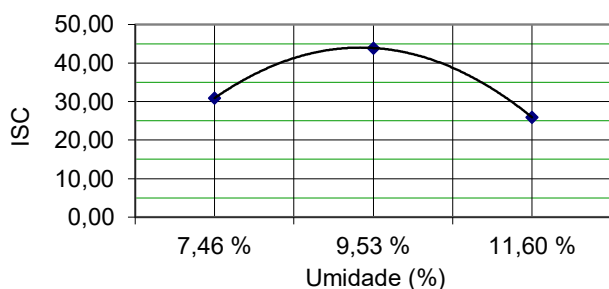

Expansão

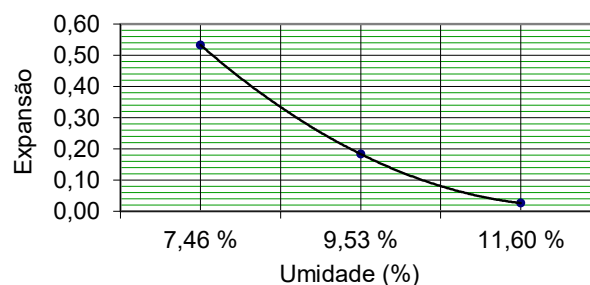



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE EXPANSÃO / I.S.C



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS




TRECHO: VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA					DATA: 16/07/2025		
RODOVIA: BR : 174			SUB-TRECHO KM 20,900			OPERADO FERNANDO	
ESTACA: 0		LADO: L / E	FURO: 2	PROFUNDIDADE: 0,15 1,20		GOLPES: 26	ESTUDO: SUB-BASE
% MATERIAL RET. PEN. Nº 4 63,00%			PROCTOR: intermediario			MATERIAL: Solo Laterítico Argiloso Vermelho	

ENSAIO DE EXPANSÃO NORMA DNER - ME 049/94

MOLDE Nº 31		ALTURA 114,5			MOLDE Nº 14		ALTURA 114,5		MOLDE Nº 3		ALTURA 114,5	
DATA	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%
16/07/25	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00	0,00	0,00
												
20/07/25	09:00	1,61	0,61	0,53	09:00	1,21	0,21	0,18	09:00	1,03	0,03	0,03

ENSAIO DE I.S.C NORMA DNIT 172/2016 - ME

MOLDE Nº 31			K-PRENSA = 0,110			MOLDE Nº 14				MOLDE Nº 3			
PENETR. mm	TEMPO min	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %
0.63	0.5	75	8,20			85	9,30			65	7,10		
1.27	1.0	115	12,60			130	14,30			85	9,30		
1.90	1.5	150	16,50			180	19,80			120	13,20		
2.54	2.0	195	21,40	70	30,60	280	30,70	70	43,90	165	18,10	70	25,90
3.81	3.0	230	25,30			320	35,10			185	20,30		
5.08	4.0	295	32,40	105	30,90	410	45,00	105	42,90	245	26,90	105	25,60
6.35	5.0	350	38,40			500	54,90			295	32,40		
7.62	6.0	420	46,10			575	63,10			350	38,40		
8.89	7.0	495	54,40			620	68,10			410	45,00		
10.16	8.0	560	61,50			690	75,80			495	54,40		
12.70	10.0	660	72,50			735	80,70			585	64,20		

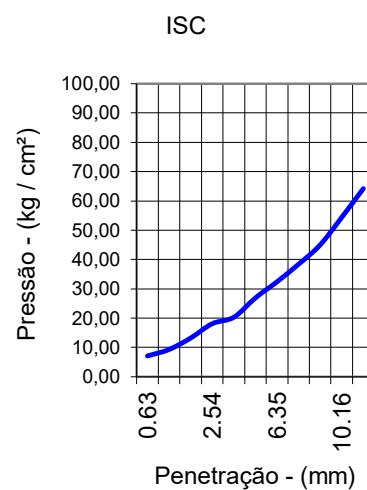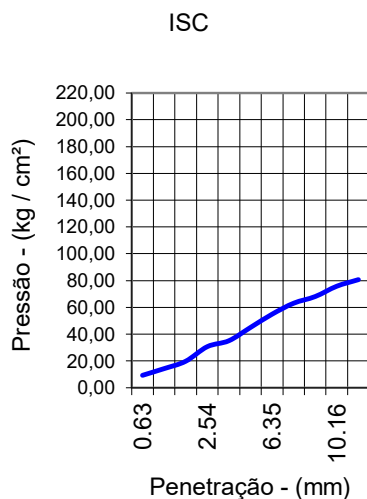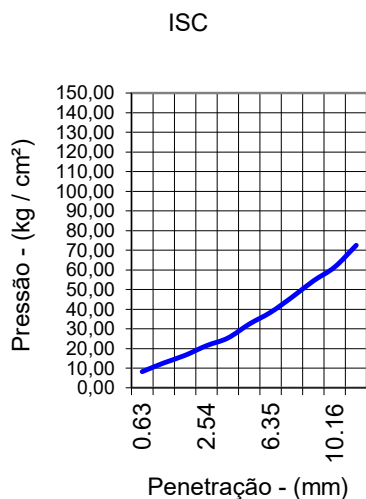

RESUMO

DENSIDADE MÁXIMA: 2038 g / cm³	ISC : 43,31 %
ÚMIDADE ÓTIMA: 9,80 %	EXPANSÃO : 0,11 %



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda


**Análise Granulométrica NORMA DNER ME -080/94 (Simples)**

Rodovia:	BR : 174	Profundidade:	0,15 1,20
Trecho:	VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA	Furo :	2
Procedência:	ESTUDO DE JAZIDA	Estaca:	0
Camada:	SUB-BASE	OPERADO	FERNANDO
		Data:	16/07/25

UMIDADE HIDROSCÓPICA			DISCRIMINAÇÃO		AMOSTRA SECA	
					Total	Parcial
Cápsula (N°)	02	31	Cápsula (N°)		33	31
Peso Umido (g)	58,17	62,50	Peso Bruto Úmido (g)		2000,0	200,0
Peso Bruto Seco (g)	57,00	61,00	Peso Retido na # N° 10 (g)		1365,73	
Peso da Água (g)	1,17	1,50	Peso Úmido Pass. na # N° 10 (g)		634,27	
Peso da Cápsula (g)	19,11	20,59	Peso Seco Pass. na # N° 10 (g)		613,40	
Peso do Solo Seco (g)	37,89	40,41	Peso da água (g)		20,87	
Umidade (%)	3,09	3,71	Peso da amostra Seca (g)		2	3
Umidade Média (%)	3,4				1979,1	193,4

Peneiramento

Amostra Total	Peneiras		Peso Retido Parcial (g)	Peso que Passa Acumulado (g)	% que Passa Am.Total	FAIXA AASTHO		CONSTANTES
	Pol	mm				Mínimo	Máximo	
	2"	50,8	0,00	1979,1	100,0			K ₁ =100 = 0,051
	1 1/2"	38,1	0,00	1979,1	100,0			2
	1"	25,4	95,11	1884,0	96,0			K ₂ = 4 = 0,160
	3/8"	9,5	690,10	1193,9	61,0			3
	4	4,8	460,12	733,8	37,0			
	10	2,0	120,40	613,4	31,0			
Amostra Parcial	40	0,42	45,78	147,6	24,0			
	200	0,074	71,20	76,4	12,0			

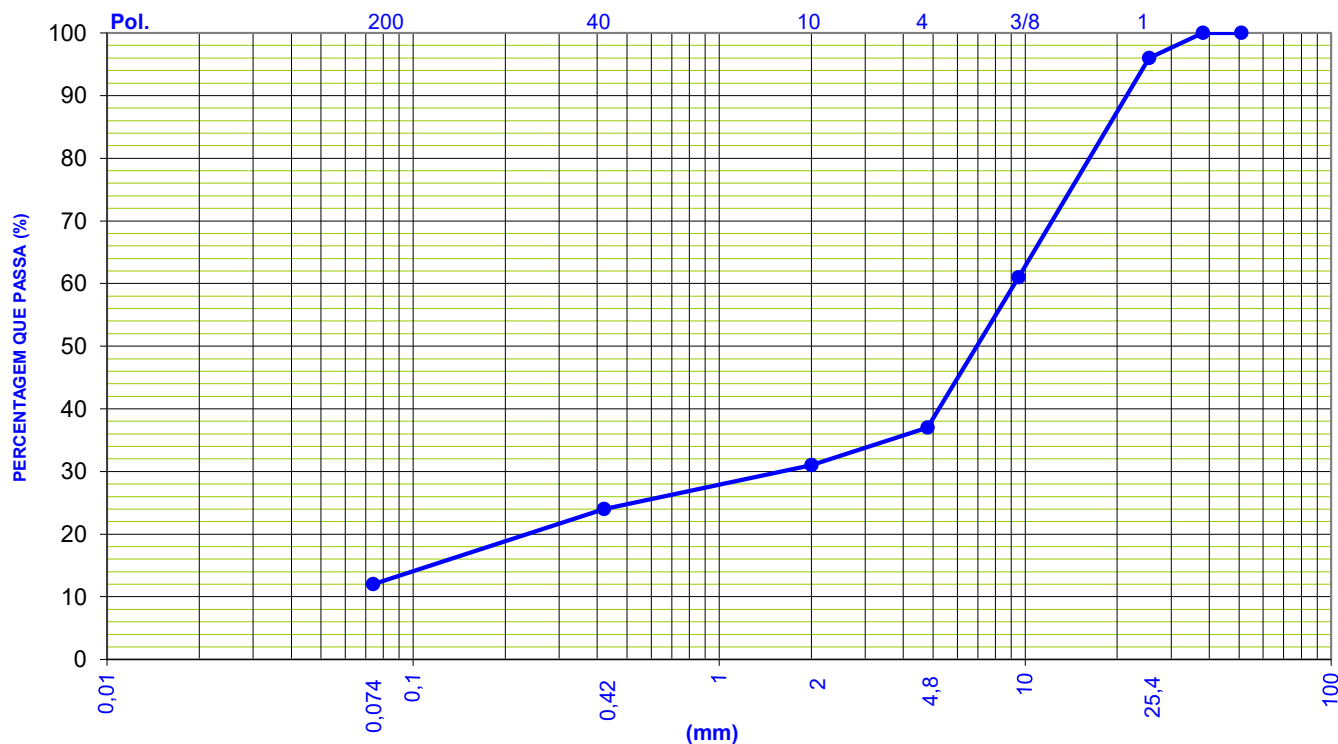**Resumo Granulometria (%)**


Pedregulho (> 4,8 mm)	63,0
Areia Grossa (4,8 - 2,0 mm)	6,0
Areia Média (2,0 - 0,42 mm)	7,0
Areia Fina (0,42 - 0,074 mm)	12,0
Passando (0,074 mm)	12,0
Total	100,0



  MTEC CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda		LIMITES FÍSICOS  PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	
Rodovia: RR - 171		Profund.: 0,15 1,20	OPERADO FERNANDO
Trecho: VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA		Furo : 2	
Procedência: ESTUDO DE JAZIDA		Estaca: 0	
Camada: SUB-BASE		Data: 17/07/2025	LADO L / E

LIMITE DE LIQUIDEZ NORMA DNER ME - 122/94						
Cápsula	N.º	09	14	27	81	89
Golpes	g	11	20	30	40	50
Peso Bruto Úmido	g	14,30	14,78	12,05	14,76	10,70
Peso Bruto Seco	g	12,29	12,71	10,49	12,79	9,52
Peso da Cápsula	g	6,33	6,33	5,53	6,40	5,53
Peso da Água	g	2,01	2,07	1,56	1,97	1,18
Peso do Solo Seco	g	5,96	6,38	4,96	6,39	3,99
Umidade	%	33,72	32,45	31,45	30,83	29,57

LIMITE DE PLASTICIDADE NORMA DNER ME - 082/94						
Cápsula	N.º	01	36	60	64	65
Peso Bruto Úmido	g	8,67	8,10	8,00	7,90	6,50
Peso Bruto Seco	g	8,27	7,67	7,56	7,56	6,30
Peso da Cápsula	g	6,43	5,68	5,54	5,81	5,33
Peso da Água	g	0,40	0,43	0,44	0,34	0,20
Peso do Solo Seco	g	1,84	1,99	2,02	1,75	0,97
Umidade	%	21,74	21,61	21,78	19,43	20,62

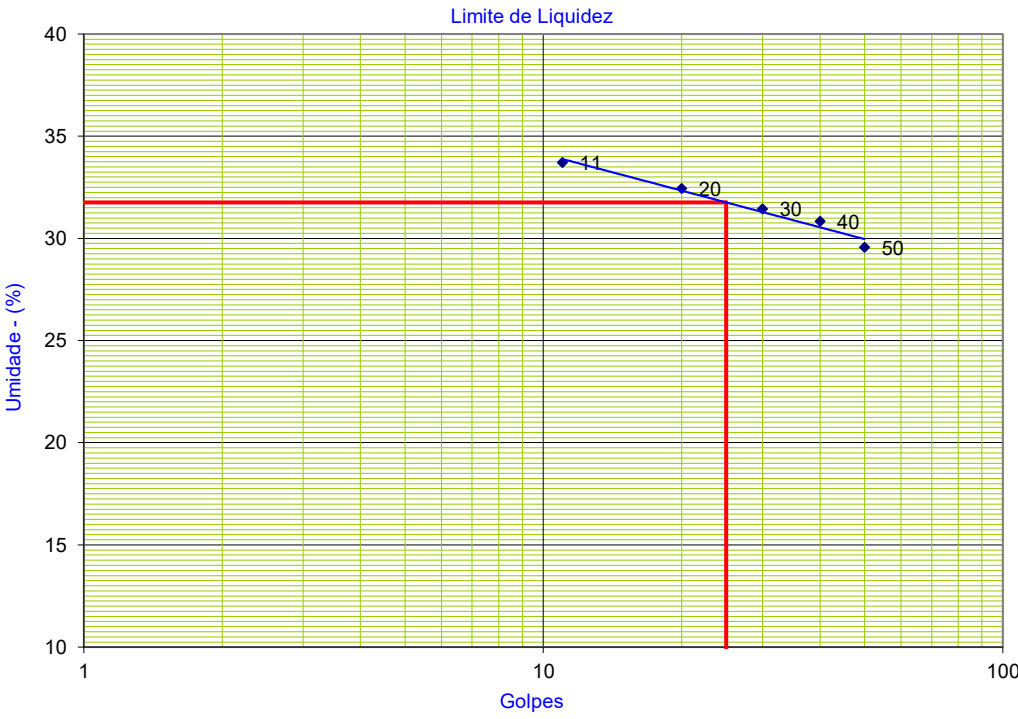Índice de Plasticidade LL= 31,8% LP = 21,4% IP= 10,4%		



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DNIT- 139/2010 - ES

E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS

Folha:


Única

Data:


16/07/2025

Rodovia: BR : 174		Trecho: VICINAL 8 MARTIHIS PEREIRA		Sub-trecho: KM 20,900			Registro: ESTUDO DE JAZIDA							
Estaca:	Furo: 3	Profundidade: 0,15 1,20		Material: Solo Laterítico Argiloso Vermelho			SUB-BASE							
% Mat. Ret. # N° 4: 66,00%	Próctor: intermediário		Golpes: 26		Operador: FERNANDO		Lado L / E							
Item	Unid.	1	2	3	4	5	6	Umidade Higroscópica						
Cápsula N°	-							78	31					
Peso Bruto Úmido	g							82,93	67,97					
Peso Bruto Seco	g							81,53	66,03					
Peso da Água	g							1,40	1,94					
Peso da Cápsula	g							19,11	20,59					
Peso do Solo Seco	g							62,42	45,44					
Umidade	%							2,24%	4,27%					
Umidade calculada	%	5,8%	7,8%	9,9%	12,0%	14,0%		3,3%						
Água Total	g	391	531	671	811	951		Peso do Material						
Água Adicionada	g	170	310	450	590	730		7.000,00						
% Água Adicionada	%	2,43%	4,43%	6,43%	8,43%	10,43%		P. Mat. Seco	Peso Água					
Peso Bruto Úmido	g	8.180	8.110	9.330	8.370	8.880		6.779	221					
Peos do Solo Úmido	g	3.780	4.025	4.522	4.245	4.166		Moldes						
Dens. Solo Úmido	g / m³	1.809	2.006	2.151	2.116	1.994		N°	Peso	Volume				
Dens. Solo Seco	g / m³	1.711	1.861	1.958	1.890	1.749		34	4.400	2.089				
Resultados:		Observações:												
H. Ótima	Dens. Máx	ISC	Expansão											
10,1 %	1.958	42,4	0,15											


Análise Gráfica

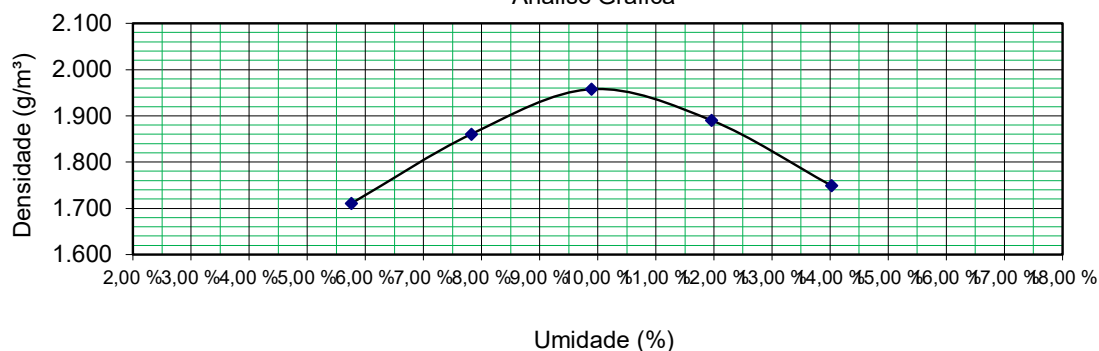

Índice de Suporte Califórnia

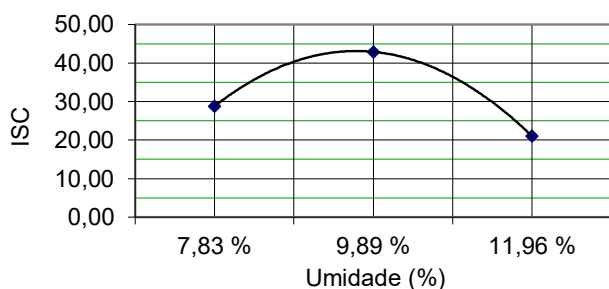

Expansão

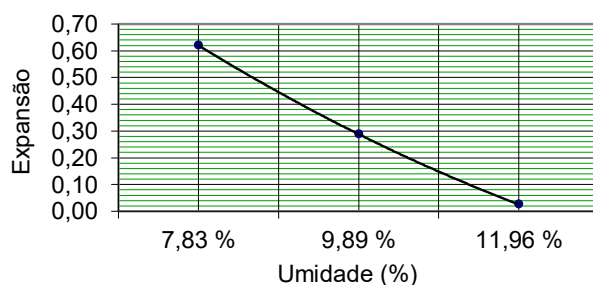



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE EXPANSÃO / I.S.C



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS

TRCHO:				DATA:	
VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA				16/07/2025	
RODOVIA:		SUB-TRECHO		OPERADO	
BR : 174		KM 20,900		FERNANDO	
ESTACA:	LADO:	FURO:	PROFUNDIDADE:	GOLPES:	ESTUDO:
0	L / E	3	0,15 1,20	26	SUB-BASE
% MATERIAL RET. PEN. Nº 4		PROCTOR:		MATERIAL:	
66,00%		intermediario		Solo Lateritico Argiloso Vermelho	




ENSAIO DE EXPANSÃO NORMA DNER - ME 049/94

MOLDE Nº 23		ALTURA 114,5			MOLDE Nº 50		ALTURA 114,5		MOLDE Nº 71		ALTURA 114,5	
DATA	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%
16/07/25	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00	0,00	0,00
												
20/07/25	09:00	1,71	0,71	0,62	09:00	1,33	0,33	0,29	09:00	1,03	0,03	0,03



ENSAIO DE I.S.C NORMA DNIT 172/2016 - ME

MOLDE Nº 23			K-PRENSA =			0,110	MOLDE Nº 50				MOLDE Nº 71			
PENETR. mm	TEMPO min	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	
0.63	0.5	40	4,40			60	6,60			30	3,30			
1.27	1.0	80	8,80			110	12,10			65	7,10			
1.90	1.5	120	13,20			175	19,20			95	10,40			
2.54	2.0	160	17,60	70	25,10	260	28,50	70	40,70	120	13,20	70	18,90	
3.81	3.0	210	23,10			350	38,40			165	18,10			
5.08	4.0	275	30,20	105	28,80	410	45,00	105	42,90	200	22,00	105	21,00	
6.35	5.0	350	38,40			490	53,80			240	26,40			
7.62	6.0	460	50,50			550	60,40			295	32,40			
8.89	7.0	540	59,30			660	72,50			350	38,40			
10.16	8.0	620	68,10			740	81,30			420	46,10			
12.70	10.0	695	76,30			800	87,80			490	53,80			

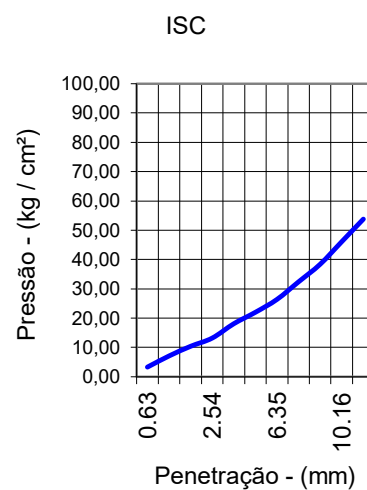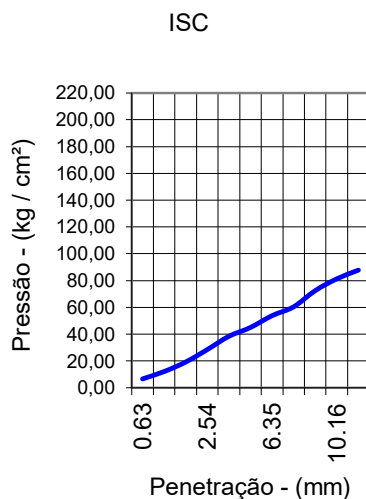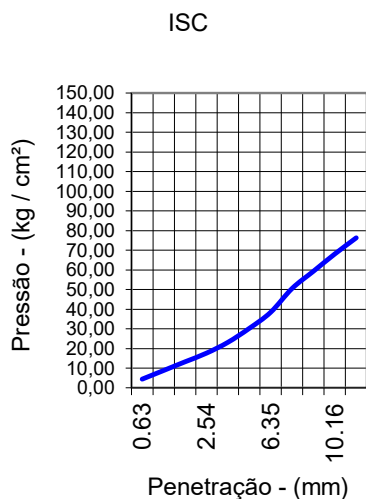

RESUMO


DENSIDADE MÁXIMA: 1958 g / cm³	ISC : 42,41 %
ÚMIDADE ÓTIMA: 10,08 %	EXPANSÃO : 0,15 %

Rodovia: BR : 174	Profundidade: 0,15 1,20
Trecho: VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA	Furo : 3
Procedência: ESTUDO DE JAZIDA	Estaca: 0
Camada: SUB-BASE	Operado FERNANDO Data: 16/07/25

UMIDADE HIDROSCÓPICA			DISCRIMINAÇÃO		AMOSTRA SECA	
					Total	Parcial
Cápsula (N°)	78	31	Cápsula (N°)		31	11
Peso Umido (g)	82,93	67,97	Peso Bruto Úmido (g)		2000,0	200,0
Peso Bruto Seco (g)	81,53	66,03	Peso Retido na # N° 10 (g)		1436,89	
Peso da Água (g)	1,40	1,94	Peso Úmido Pass. na # N° 10 (g)		563,11	
Peso da Cápsula (g)	19,11	20,59	Peso Seco Pass. na # N° 10 (g)		545,40	
Peso do Solo Seco (g)	62,42	45,44	Peso da água (g)		17,71	
Umidade (%)	2,24	4,27	Peso da amostra Seca (g)		2	3
Umidade Média (%)	3,3				1982,3	193,7

Peneiramento


Amostra Total	Peneiras		Peso Retido Parcial (g)	Peso que Passa Acumulado (g)	% que Passa Am.Total	FAIXA AASTHO		CONSTANTES
	Pol	mm				Mínimo	Máximo	
	2"	50,8	0,00	1982,3	100,0			K ₁ =100 = 0,050
	1 1/2"	38,1	0,00	1982,3	100,0			2
	1"	25,4	130,00	1852,3	93,0			K ₂ = 4 = 0,139
	3/8"	9,5	685,32	1167,0	58,0			3
	4	4,8	486,45	680,6	34,0			
	10	2,0	135,12	545,5	27,0			4
Amostra Parcial	40	0,42	41,45	152,3	21,0			
	200	0,074	78,45	73,9	10,0			

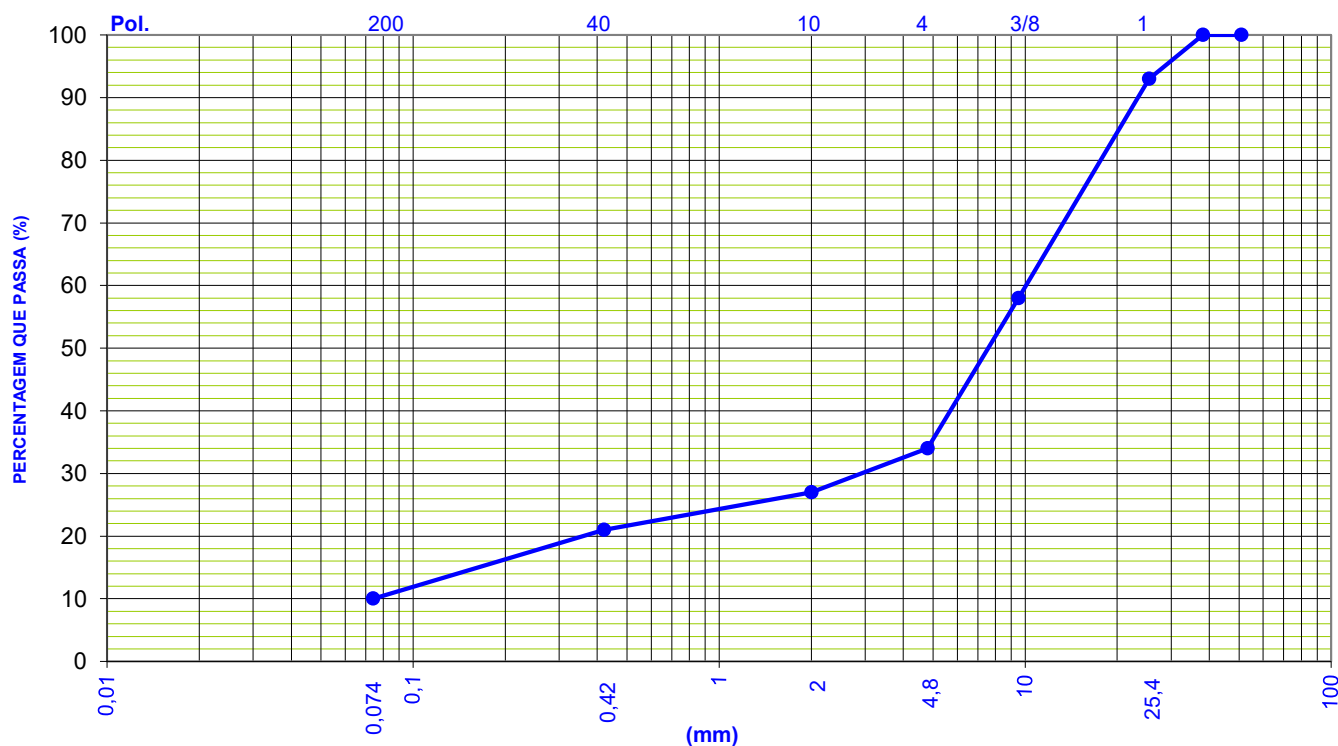

Resumo Granulometria (%)

Pedregulho (> 4,8 mm)	66,0
Areia Grossa (4,8 - 2,0 mm)	7,0
Areia Média (2,0 - 0,42 mm)	6,0
Areia Fina (0,42 - 0,074 mm)	11,0
Passando (0,074 mm)	10,0
Total	100,0



  MTEC CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda		LIMITES FÍSICOS  PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS					
Rodovia: RR - 171		Profund.: 0,15 1,20		OPERADO FERNANDO			
Trecho: VICINAL 8 MARTIHIS PEREIRA		Furo : 3					
Procedência: ESTUDO DE JAZIDA		Estaca: 0					
Camada: SUB-BASE		Data: 17/07/2025		LADO L / E			
LIMITE DE LIQUIDEZ NORMA DNER ME - 122/94							
Cápsula	N.º	31	95	85	77	41	
Golpes	g	10	20	29	40	50	
Peso Bruto Úmido	g	25,50	35,60	21,20	24,78	25,82	
Peso Bruto Seco	g	20,43	28,30	17,42	20,19	21,14	
Peso da Cápsula	g	5,84	6,33	5,71	5,45	5,66	
Peso da Água	g	5,07	7,30	3,78	4,59	4,68	
Peso do Solo Seco	g	14,59	21,97	11,71	14,74	15,48	
Umidade	%	34,75	33,23	32,28	31,14	30,23	
LIMITE DE PLASTICIDADE NORMA DNER ME - 082/94							
Cápsula	N.º	10	03	18	54	32	
Peso Bruto Úmido	g	8,16	8,14	7,72	7,34	7,58	
Peso Bruto Seco	g	7,80	7,75	7,34	7,01	7,28	
Peso da Cápsula	g	6,15	5,96	5,61	5,52	5,80	
Peso da Água	g	0,36	0,39	0,38	0,33	0,30	
Peso do Solo Seco	g	1,65	1,79	1,73	1,49	1,48	
Umidade	%	21,82	21,79	21,97	22,15	20,27	
Índice de Plasticidade LL= 32,4% LP = 21,9% IP= 10,5%		 Limite de Liquidez					



ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DNIT- 139/2010 - ES

E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA






Folha:

Única

Data:

17/07/2025

Rodovia: BR : 174		Trecho: VICINAL 8 MARTIHIS PEREIRA		Sub-trecho: KM 20,900			Registro: ESTUDO DE JAZIDA			
Estaca:	Furo: 4	Profundidade: 0,15 1,10		Material: Solo Laterítico Argiloso Vermelho			SUB-BASE			
% Mat. Ret. # Nº 4: 46,00%	Próctor: intermediário		Golpes: 26		Operador: FERNANDO		Lado L / E			
Item	Unid.	1	2	3	4	5	6	Umidade Higroscópica		
Cápsula Nº	-							52	46	
Peso Bruto Úmido	g							58,10	62,10	
Peso Bruto Seco	g							57,00	61,00	
Peso da Água	g							1,10	1,10	
Peso da Cápsula	g							19,11	20,59	
Peso do Solo Seco	g							37,89	40,41	
Umidade	%							2,90%	2,72%	
Umidade calculada	%	4,9%	6,9%	9,0%	11,0%	13,1%		2,8%		
Água Total	g	331	471	611	751	891		Peso do Material		
Água Adicionada	g	140	280	420	560	700		7.000,00		
% Água Adicionada	%	2,00%	4,00%	6,00%	8,00%	10,00%		P. Mat. Seco	Peso Água	
Peso Bruto Úmido	g	7.780	8.090	8.686	8.450	8.890		6.809	191	
Peos do Solo Úmido	g	3.655	4.005	4.470	4.215	4.176		Moldes		
Dens. Solo Úmido	g / m³	1.748	1.997	2.143	2.101	1.999		Nº	Peso	Volume
Dens. Solo Seco	g / m³	1.667	1.867	1.966	1.892	1.768		20	4.125	2.091
Resultados:			Observações:					23	4.085	2.006
								37	4.216	2.086
								61	4.235	2.006
								42	4.714	2.089
H. Ótima	Dens. Máx	ISC	Expansão							
9,1 %	1.967	39,0	0,13							

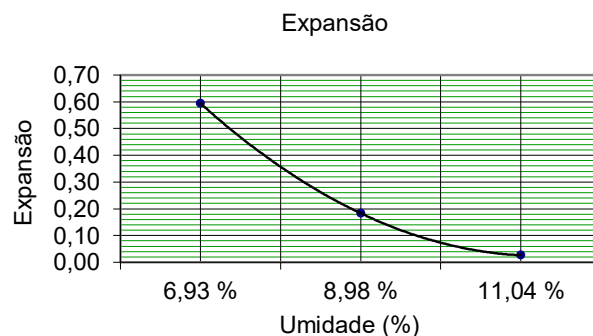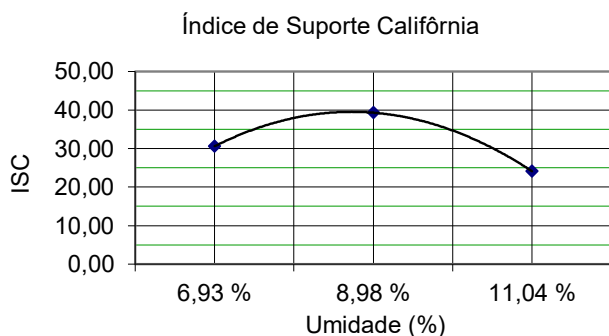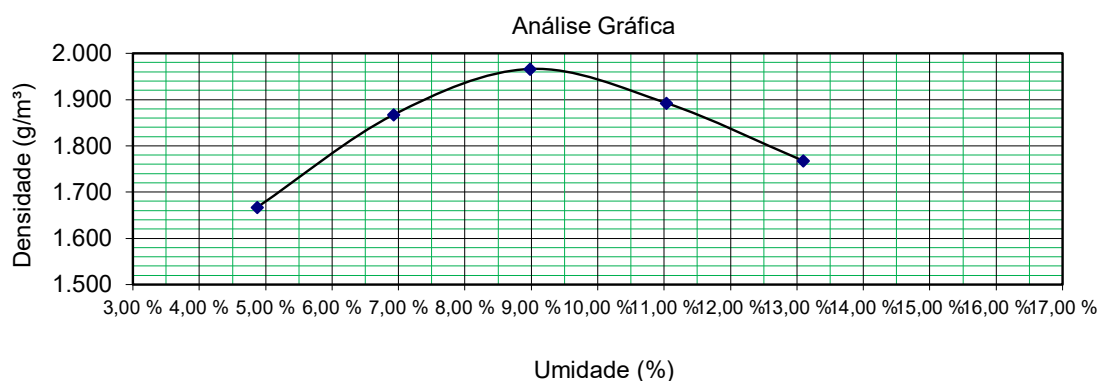



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE EXPANSÃO / I.S.C



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS




TRECHO: VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA					DATA: 17/07/2025		
RODOVIA: BR : 174			SUB-TRECHO: KM 20,900			OPERADO: FERNANDO	
ESTACA: 0		LADO: L / E	FURO: 4	PROFUNDIDADE: 0,15 1,10		GOLPES: 26	ESTUDO: SUB-BASE
% MATERIAL RET. PEN. Nº 4 46,00%			PROCTOR: intermediario			MATERIAL: Solo Laterítico Argiloso Vermelho	

ENSAIO DE EXPANSÃO NORMA DNER - ME 049/94

MOLDE Nº 23		ALTURA 114,5			MOLDE Nº 37		ALTURA 114,5			MOLDE Nº 61		ALTURA 114,5	
DATA	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	
17/07/25	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00	0,00	0,00	
21/07/25	09:00	1,68	0,68	0,59	09:00	1,21	0,21	0,18	09:00	1,03	0,03	0,03	

ENSAIO DE I.S.C NORMA DNIT 172/2016 - ME

MOLDE Nº 23			K-PRENSA = 0,110				MOLDE Nº 37				MOLDE Nº 61			
PENETR. mm	TEMPO min	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	
0.63	0.5	50	5,50			80	8,80			35	3,80			
1.27	1.0	95	10,40			150	16,50			65	7,10			
1.90	1.5	145	15,90			210	23,10			100	11,00			
2.54	2.0	195	21,40	70	30,60	250	27,50	70	39,30	135	14,80	70	21,10	
3.81	3.0	240	26,40			310	34,00			190	20,90			
5.08	4.0	275	30,20	105	28,80	365	40,10	105	38,20	230	25,30	105	24,10	
6.35	5.0	320	35,10			460	50,50			300	32,90			
7.62	6.0	400	43,90			520	57,10			365	40,10			
8.89	7.0	475	52,20			600	65,90			420	46,10			
10.16	8.0	565	62,00			685	75,20			495	54,40			
12.70	10.0	675	74,10			760	83,40			530	58,20			

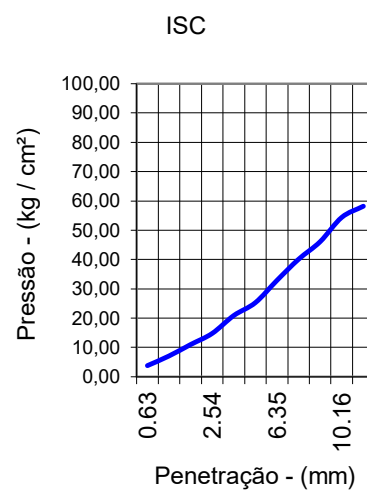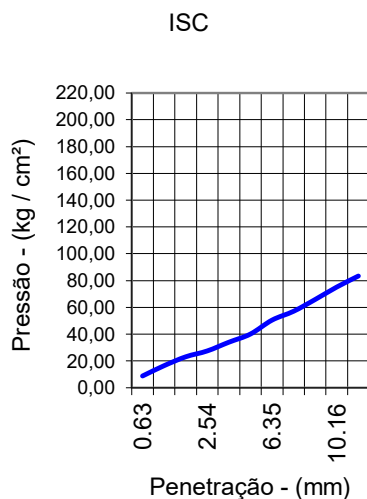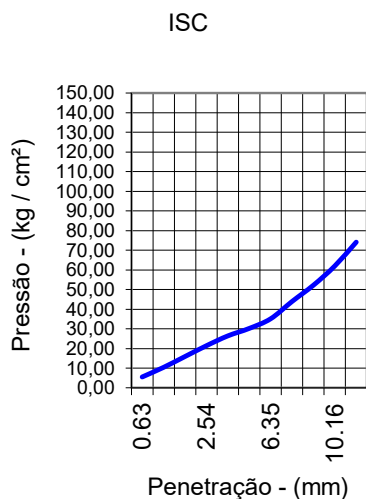

RESUMO

DENSIDADE MÁXIMA: 1967 g / cm³	ISC : 39,00 %
ÚMIDADE ÓTIMA: 9,13 %	EXPANSÃO : 0,13 %



CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA Via Norte Construtora Ltda


**Análise Granulométrica NORMA DNER ME -080/94 (Simples)**

Rodovia:	BR : 174	Profundidade:	0,15 1,10
Trecho:	VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA	Furo :	4
Procedência:	ESTUDO DE JAZIDA	Estaca:	0
Camada:	SUB-BASE	OPERADO	FERNANDO
		Data:	17/07/25

UMIDADE HIDROSCÓPICA		DISCRIMINAÇÃO		AMOSTRA SECA	
				Total	Parcial
Cápsula (N°)	52	46	Cápsula (N°)	33	31
Peso Umido (g)	58,10	62,10	Peso Bruto Úmido (g)	2000,0	200,0
Peso Bruto Seco (g)	57,00	61,00	Peso Retido na # N° 10 (g)	1028,95	
Peso da Água (g)	1,10	1,10	Peso Úmido Pass. na # N° 10 (g)	971,05	
Peso da Cápsula (g)	19,11	20,59	Peso Seco Pass. na # N° 10 (g)	944,50	
Peso do Solo Seco (g)	37,89	40,41	Peso da água (g)	26,55	
Umidade (%)	2,90	2,72	Peso da amostra Seca (g)	2 1973,5	3 194,5
Umidade Média (%)	2,8				



Peneiramento

Amostra Total	Peneiras		Peso Retido Parcial (g)	Peso que Passa Acumulado (g)	% que Passa Am.Total	FAIXA AASTHO		CONSTANTES
	Pol	mm				Mínimo	Máximo	
	2"	50,8	0,00	1973,5	100,0			K ₁ =100 = 0,051 2
	1 1/2"	38,1	0,00	1973,5	100,0			
	1"	25,4	120,00	1853,5	95,0			K ₂ = 4 = 0,247 3
	3/8"	9,5	438,45	1415,1	72,0			
	4	4,8	360,30	1054,8	54,0			
	10	2,0	110,20	944,6	48,0			
Amostra Parcial	40	0,42	68,43	126,1	31,0			
	200	0,074	78,12	48,0	12,0			

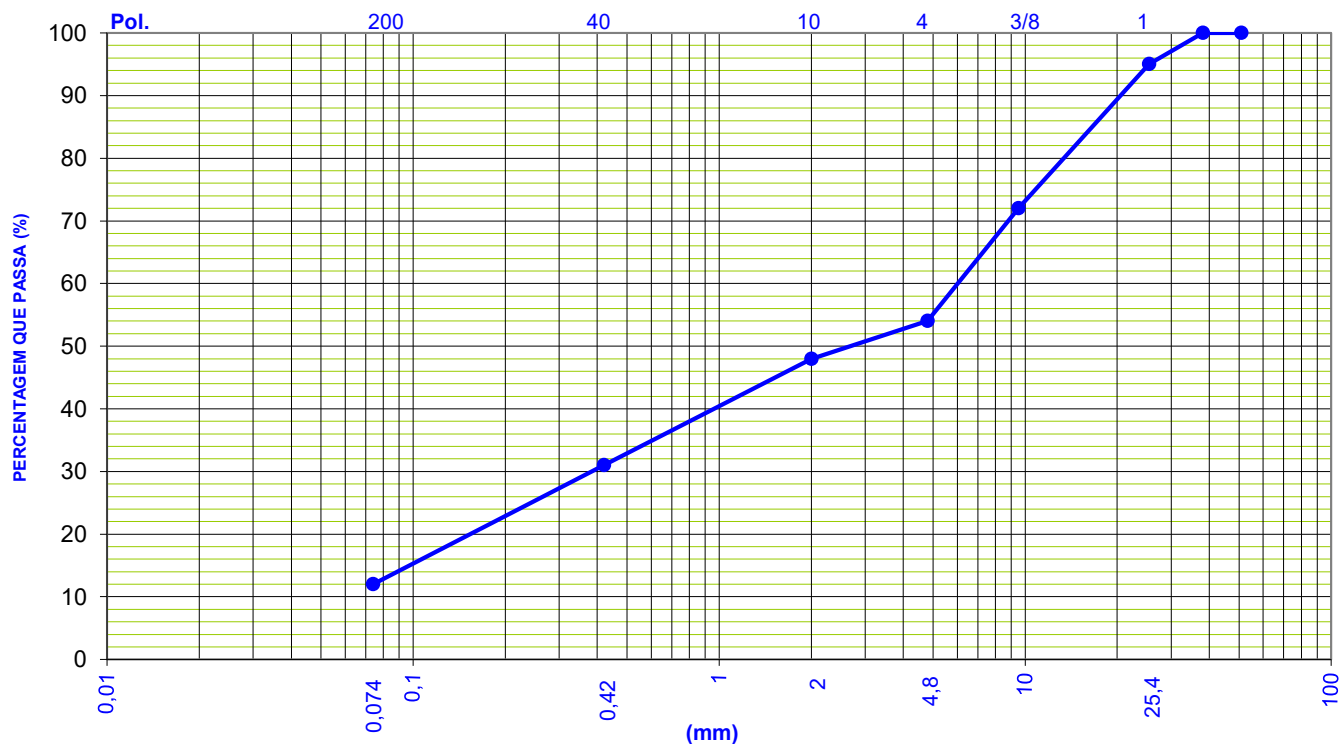**Resumo Granulometria (%)**

Pedregulho (> 4,8 mm)	46,0
Areia Grossa (4,8 - 2,0 mm)	6,0
Areia Média (2,0 - 0,42 mm)	17,0
Areia Fina (0,42 - 0,074 mm)	19,0
Passando (0,074 mm)	12,0
Total	100,0

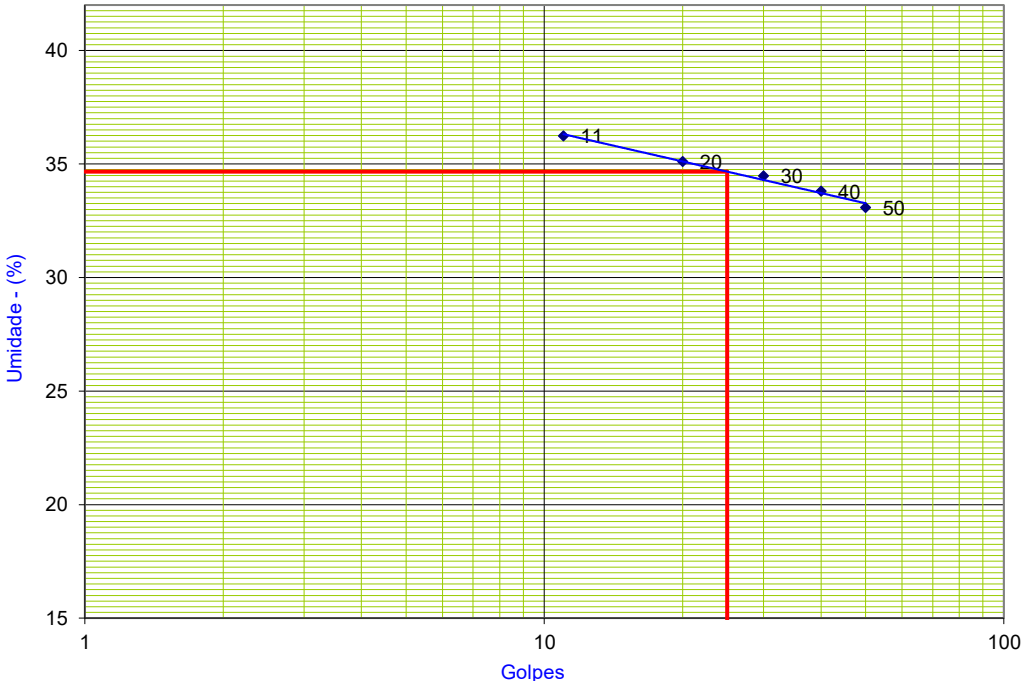

  MTEC CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda		LIMITES FÍSICOS		 PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS										
Rodovia: RR 171		Profund.: 0,15 1,10		OPERADO FERNANDO										
Trecho: VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA		Furo : 4												
Procedência: ESTUDO DE JAZIDA		Estaca: 0												
Camada: SUB-BASE		Data: 17/07/2025		LADO L / E										
LIMITE DE LIQUEDEZ NORMA DNER ME - 122/94														
Cápsula	N.º	58	47	96	37	45								
Golpes	g	11	20	30	40	50								
Peso Bruto Úmido	g	14,45	14,95	12,20	14,95	10,84								
Peso Bruto Seco	g	12,29	12,71	10,49	12,79	9,52								
Peso da Cápsula	g	6,33	6,33	5,53	6,40	5,53								
Peso da Água	g	2,16	2,24	1,71	2,16	1,32								
Peso do Solo Seco	g	5,96	6,38	4,96	6,39	3,99								
Umidade	%	36,24	35,11	34,48	33,80	33,08								
LIMITE DE PLASTICIDADE NORMA DNER ME - 082/94														
Cápsula	N.º	23	14	56	95	35								
Peso Bruto Úmido	g	8,73	8,15	8,06	7,98	6,55								
Peso Bruto Seco	g	8,27	7,67	7,56	7,56	6,30								
Peso da Cápsula	g	6,43	5,68	5,54	5,81	5,33								
Peso da Água	g	0,46	0,48	0,50	0,42	0,25								
Peso do Solo Seco	g	1,84	1,99	2,02	1,75	0,97								
Umidade	%	25,00	24,12	24,75	24,00	25,77								
<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Índice de Plasticidade</td> </tr> <tr> <td>LL=</td> <td>34,7%</td> </tr> <tr> <td>LP =</td> <td>24,7%</td> </tr> <tr> <td>IP=</td> <td>10,0%</td> </tr> </table> Limite de Liqueidez 								Índice de Plasticidade		LL=	34,7%	LP =	24,7%	IP=
Índice de Plasticidade														
LL=	34,7%													
LP =	24,7%													
IP=	10,0%													



MTEC
CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DNIT- 139/2010 - ES

E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA



Folha:


Única

Data:


17/07/2025

Rodovia: BR : 174		Trecho: VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA			Sub-trecho: KM 20,900			Registro: ESTUDO DE JAZIDA			
Estaca:		Furo: 5		Profundidade: 0,15 1,10		Material: Solo Lateritico Argiloso Vermelho			SUB-BASE		
% Mat. Ret. # N° 4: 36,00%		Próctor: intermediario			Golpes: 26		Operador: FERNANDO		Lado L / E		
Item		Unid.	1	2	3	4	5	6	Umidade Higroscópica		
Cápsula N°		-							85	95	
Peso Bruto Úmido		g							58,15	62,20	
Peso Bruto Seco		g							57,00	61,00	
Peso da Água		g							1,15	1,20	
Peso da Cápsula		g							19,11	20,59	
Peso do Solo Seco		g							37,89	40,41	
Umidade		%							3,04%	2,97%	
Umidade calculada		%	5,1%	7,1%	9,2%	11,2%	13,3%		3,0%		
Água Total		g	344	484	624	764	904		Peso do Material		
Água Adicionada		g	140	280	420	560	700		7.000,00		
% Água Adicionada		%	2,00%	4,00%	6,00%	8,00%	10,00%		P. Mat. Seco	Peso Água	
Peso Bruto Úmido		g	7.750	8.120	8.616	8.380	8.850		6.796	204	
Peos do Solo Úmido		g	3.625	4.035	4.471	4.255	4.136		Moldes		
Dens. Solo Úmido		g / m³	1.734	2.011	2.152	2.121	1.980		N°	Peso	Volume
Dens. Solo Seco		g / m³	1.650	1.878	1.971	1.907	1.747		20	4.125	2.091
Resultados:				Observações: 				34	4.085	2.006	
H. Ótima								7	4.145	2.078	
Dens. Máx								1	4.125	2.006	
ISC								42	4.714	2.089	
Expansão											
9,4 %											
1.971											
40,5											
0,10											


Análise Gráfica

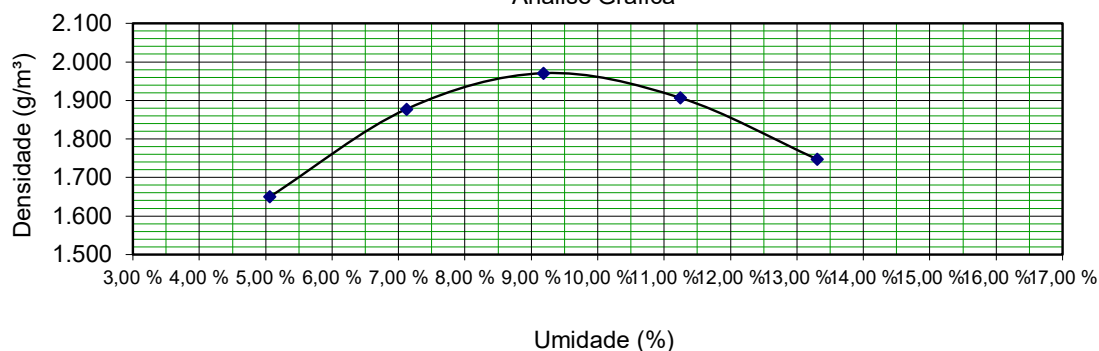

Índice de Suporte Califórnia

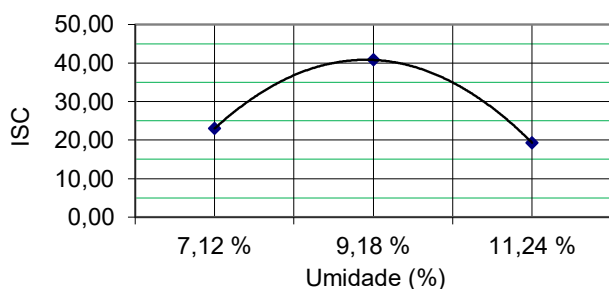

Expansão

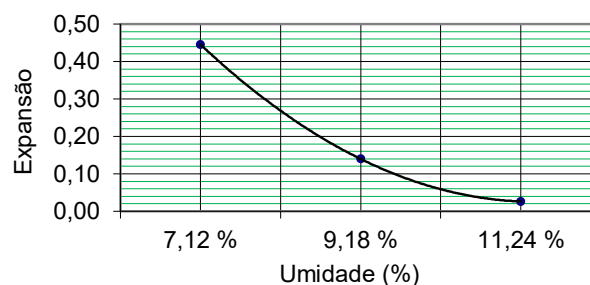



MTEC CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA Via Norte Construtora Ltda

ENSAIO DE EXPANSÃO / I.S.C



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

TRECHO:					DATA:	
VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA					17/07/2025	
RODOVIA:		SUB-TRECHO:			OPERADO	
BR : 174		KM 20,900			FERNANDO	
ESTACA:	LADO:	FURO:	PROFUNDIDADE:	GOLPES:	ESTUDO:	
0	L / E	5	0,15 1,10	26	SUB-BASE	
% MATERIAL RET. PEN. Nº 4		PROCTOR:		MATERIAL:		
36,00%		intermediario		Solo Laterítico Argiloso Vermelho		




ENSAIO DE EXPANSÃO NORMA DNER - ME 049/94

MOLDE Nº 34		ALTURA 114,5			MOLDE Nº 7		ALTURA 114,5		MOLDE Nº 1		ALTURA 114,5	
DATA	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%
17/07/25	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00	0,00	0,00
												
21/07/25	09:00	1,51	0,51	0,45	09:00	1,16	0,16	0,14	09:00	1,03	0,03	0,03



ENSAIO DE I.S.C NORMA DNIT 172/2016 - ME

MOLDE N° 34			K-PRENSA =			0,110	MOLDE N° 7				MOLDE N° 1			
PENETR. mm	TEMPO min	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	
0.63	0.5	45	4,90			65	7,10			30	3,30			
1.27	1.0	75	8,20			110	12,10			55	6,00			
1.90	1.5	110	12,10			160	17,60			85	9,30			
2.54	2.0	145	15,90	70	22,70	255	28,00	70	40,00	110	12,10	70	17,30	
3.81	3.0	185	20,30			295	32,40			145	15,90			
5.08	4.0	220	24,20	105	23,00	390	42,80	105	40,80	185	20,30	105	19,30	
6.35	5.0	265	29,10			460	50,50			220	24,20			
7.62	6.0	310	34,00			500	54,90			275	30,20			
8.89	7.0	355	39,00			585	64,20			320	35,10			
10.16	8.0	430	47,20			640	70,30			375	41,20			
12.70	10.0	495	54,40			710	78,00			420	46,10			

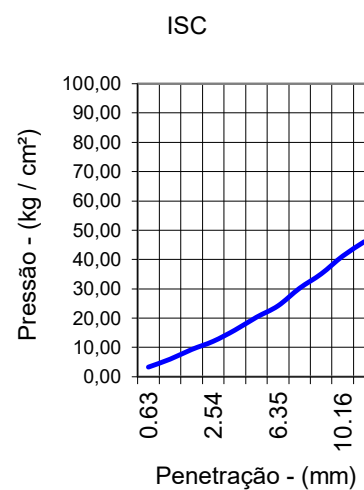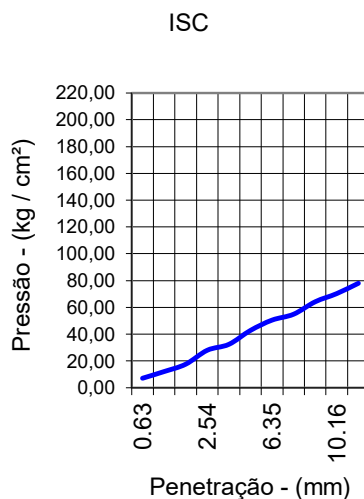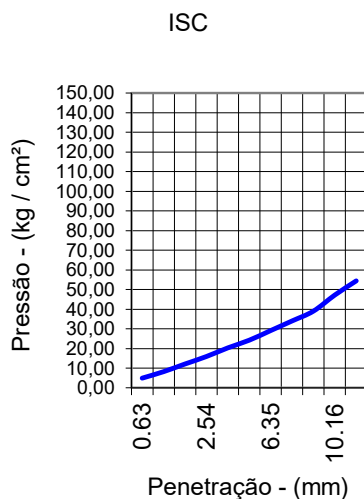

RESUMO

DENSIDADE MÁXIMA:	1971 g / cm³	ISC :	40,46 %
ÚMIDADE ÓTIMA:	9,37 %	EXPANSÃO :	0,10 %



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA. Via Norte Construtora Ltda



Análise Granulométrica NORMA DNER ME -080/94 (Simples)




Rodovia:	BR : 174	Profundidade:	0,15 1,10
Trecho:	VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA	Furo :	5
Procedência:	ESTUDO DE JAZIDA	Estaca:	0
Camada:	SUB-BASE	OPERADO	FERNANDO
		Data:	17/07/25

UMIDADE HIDROSCÓPICA		DISCRIMINAÇÃO		AMOSTRA SECA	
				Total	Parcial
Cápsula (N°)	85	95	Cápsula (N°)	33	31
Peso Umido (g)	58,15	62,20	Peso Bruto Úmido (g)	2000,0	200,0
Peso Bruto Seco (g)	57,00	61,00	Peso Retido na # N° 10 (g)	875,18	
Peso da Água (g)	1,15	1,20	Peso Úmido Pass. na # N° 10 (g)	1124,82	
Peso da Cápsula (g)	19,11	20,59	Peso Seco Pass. na # N° 10 (g)	1092,00	
Peso do Solo Seco (g)	37,89	40,41	Peso da água (g)	32,82	
Umidade (%)	3,04	2,97	Peso da amostra Seca (g)	2 1967,2	3 194,2
Umidade Média (%)	3,0				

Peneiramento



Amostra Total	Peneiras		Peso Retido Parcial (g)	Peso que Passa Acumulado (g)	% que Passa Am.Total	FAIXA AASTHO		CONSTANTES
	Pol	mm				Mínimo	Máximo	
	2"	50,8	0,00	1967,2	100,0			K ₁ =100 = 0,051 2
	1 1/2"	38,1	0,00	1967,2	100,0			
	1"	25,4	45,11	1922,1	98,0			K ₂ = 4 = 0,288 3
	3/8"	9,5	438,45	1483,7	76,0			
	4	4,8	230,68	1253,0	64,0			
	10	2,0	160,94	1092,1	4 56,0			
Amostra Parcial	40	0,42	61,43	132,8	38,0			
	200	0,074	88,88	43,9	13,0			

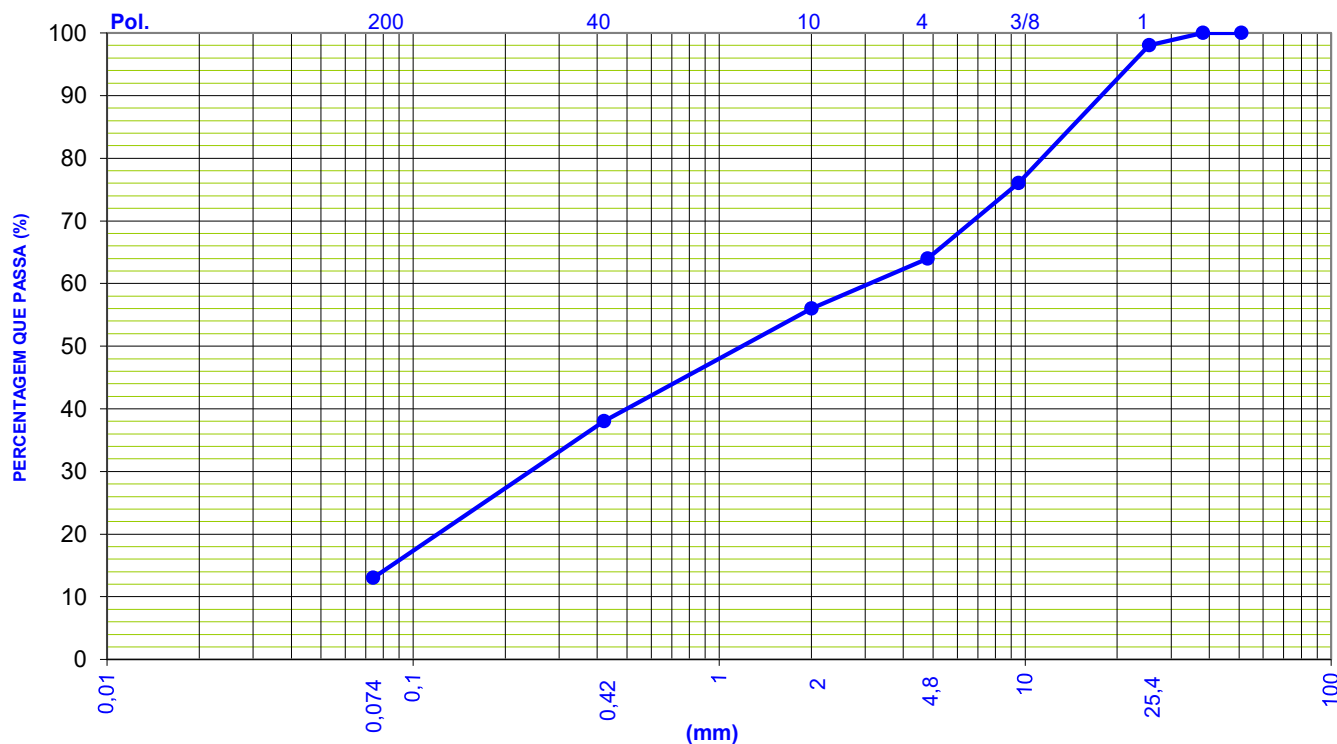

Resumo Granulometria (%)

Pedregulho (> 4,8 mm)	36,0
Areia Grossa (4,8 - 2,0 mm)	8,0
Areia Média (2,0 - 0,42 mm)	18,0
Areia Fina (0,42 - 0,074 mm)	25,0
Passando (0,074 mm)	13,0
Total	100,0

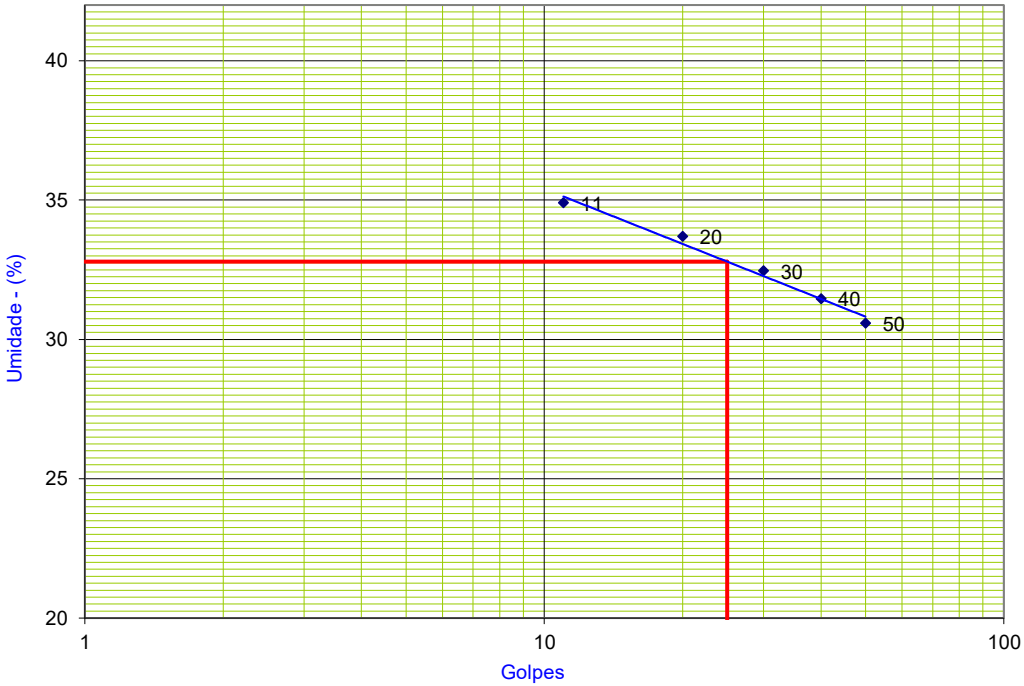

  MTEC CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda		LIMITES FÍSICOS  PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS					
Rodovia: RR 171		Profund.: 0,15 1,10		OPERADO FERNANDO			
Trecho: VICINAL 8 MARTIHIS PEREIRA		Furo : 5					
Procedência: ESTUDO DE JAZIDA		Estaca: 0					
Camada: SUB-BASE		Data: 18/07/2025		LADO L / E			
LIMITE DE LIQUIDEZ NORMA DNER ME - 122/94							
Cápsula	N.º	65	74	12	32	98	
Golpes	g	11	20	30	40	50	
Peso Bruto Úmido	g	14,37	14,86	12,10	14,80	10,74	
Peso Bruto Seco	g	12,29	12,71	10,49	12,79	9,52	
Peso da Cápsula	g	6,33	6,33	5,53	6,40	5,53	
Peso da Água	g	2,08	2,15	1,61	2,01	1,22	
Peso do Solo Seco	g	5,96	6,38	4,96	6,39	3,99	
Umidade	%	34,90	33,70	32,46	31,46	30,58	
LIMITE DE PLASTICIDADE NORMA DNER ME - 082/94							
Cápsula	N.º	25	58	47	69	35	
Peso Bruto Úmido	g	8,67	8,10	7,97	7,91	6,50	
Peso Bruto Seco	g	8,27	7,67	7,56	7,56	6,30	
Peso da Cápsula	g	6,43	5,68	5,54	5,81	5,33	
Peso da Água	g	0,40	0,43	0,41	0,35	0,20	
Peso do Solo Seco	g	1,84	1,99	2,02	1,75	0,97	
Umidade	%	21,74	21,61	20,30	20,00	20,62	
Índice de Plasticidade LL= 32,8% LP = 20,9% IP= 11,9%		Limite de Liquidez 					



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DNIT- 139/2010 - ES

E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

Folha:

Única


Data:

18/07/2025


Rodovia: BR : 174		Trecho: VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA			Sub-trecho: KM 20,900			Registro: ESTUDO DE JAZIDA		
Estaca:	Furo: 6		Profundidade: 0,15 1,10		Material: Solo Laterítico Argiloso Vermelho			SUB-BASE		
% Mat. Ret. # Nº 4: 61,00%	Próctor: intermediario			Golpes: 26		Operador: FERNANDO		Lado L / E		
Item	Unid.	1	2	3	4	5	6	Umidade Higroscópica		
Cápsula Nº	-							45	78	
Peso Bruto Úmido	g							55,11	67,17	
Peso Bruto Seco	g							54,00	66,03	
Peso da Água	g							1,11	1,14	
Peso da Cápsula	g							19,11	20,59	
Peso do Solo Seco	g							34,89	45,44	
Umidade	%							3,18%	2,51%	
Umidade calculada	%	5,3%	7,4%	9,5%	11,5%	13,6%		2,8%		
Água Total	g	364	504	644	784	924		Peso do Material		
Água Adicionada	g	170	310	450	590	730		7.000,00		
% Água Adicionada	%	2,43%	4,43%	6,43%	8,43%	10,43%		P. Mat. Seco	Peso Água	
Peso Bruto Úmido	g	8.170	8.130	8.610	8.380	8.910		6.806	194	
Peos do Solo Úmido	g	3.770	4.045	4.485	4.255	4.196		Moldes		
Dens. Solo Úmido	g / m³	1.805	2.016	2.145	2.121	2.009		Nº	Peso	Volume
Dens. Solo Seco	g / m³	1.713	1.878	1.960	1.902	1.769		34	4.400	2.089
Resultados:				Observações:						
H. Ótima	Dens. Máx	ISC	Expansão							
9,6 %	1.960	39,3	0,15							




Análise Gráfica

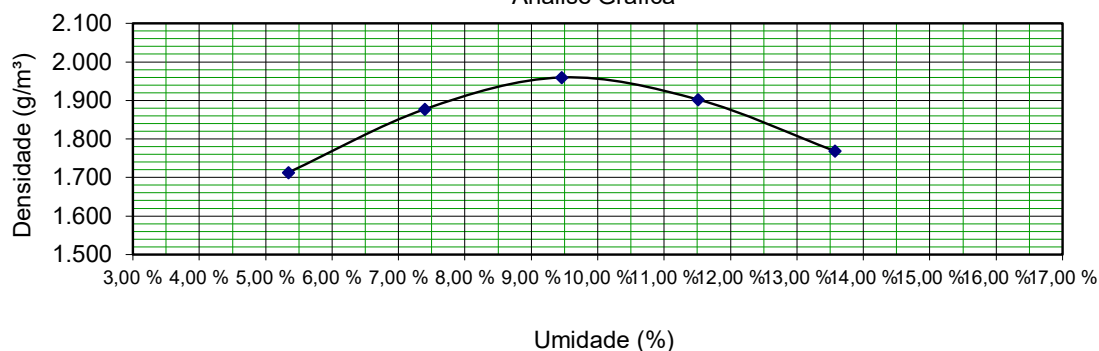

Índice de Suporte Califórnia

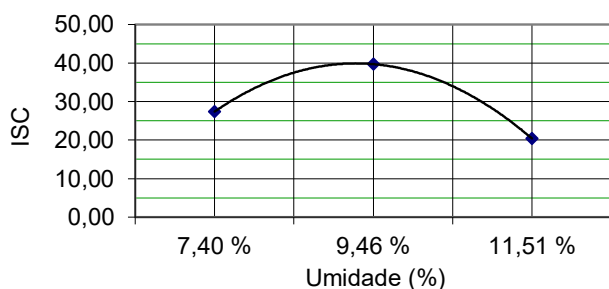

Expansão

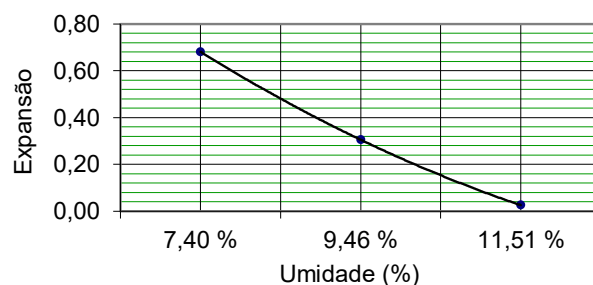



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE EXPANSÃO / I.S.C



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS

TRECHO:					DATA:	
VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA					18/07/2025	
RODOVIA:		SUB-TRECHO:			OPERADO	
BR : 174		KM 20,900			FERNANDO	
ESTACA:	LADO:	FURO:	PROFUNDIDADE:	GOLPES:	ESTUDO:	
0	L / E	6	0,15 1,10	26	SUB-BASE	
% MATERIAL RET. PEN. Nº 4		PROCTOR:		MATERIAL:		
61,00%		intermediario		Solo Laterítico Argiloso Vermelho		




ENSAIO DE EXPANSÃO NORMA DNER - ME 049/94

MOLDE Nº 33		ALTURA 114,5			MOLDE Nº 20		ALTURA 114,5			MOLDE Nº 11		ALTURA 114,5	
DATA	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	
18/07/25	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00	0,00	0,00	
22/07/25	09:00	1,78	0,78	0,68	09:00	1,35	0,35	0,31	09:00	1,03	0,03	0,03	



ENSAIO DE I.S.C NORMA DNIT 172/2016 - ME

MOLDE Nº 33			K-PRENSA = 0,110				MOLDE Nº 20				MOLDE Nº 11			
PENETR. mm	TEMPO min	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %		LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %
0.63	0.5	50	5,50				94	10,30			35	3,80		
1.27	1.0	95	10,40				130	14,30			65	7,10		
1.90	1.5	130	14,30				178	19,50			95	10,40		
2.54	2.0	175	19,20	70	27,40		230	25,30	70	36,10	125	13,70	70	19,60
3.81	3.0	200	22,00				310	34,00			160	17,60		
5.08	4.0	240	26,40	105	25,10		380	41,70	105	39,70	195	21,40		20,40
6.35	5.0	310	34,00				430	47,20			230	25,30		
7.62	6.0	385	42,30				500	54,90			275	30,20		
8.89	7.0	430	47,20				560	61,50			320	35,10		
10.16	8.0	485	53,30				700	76,90			385	42,30		
12.70	10.0	540	59,30				760	83,40			460	50,50		

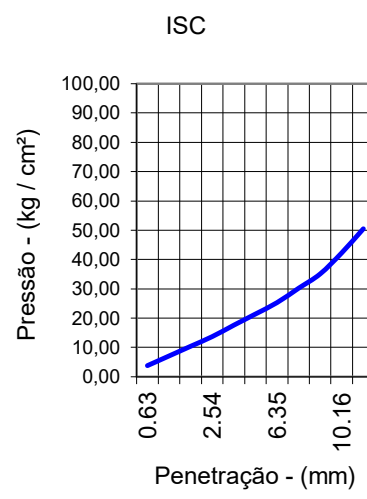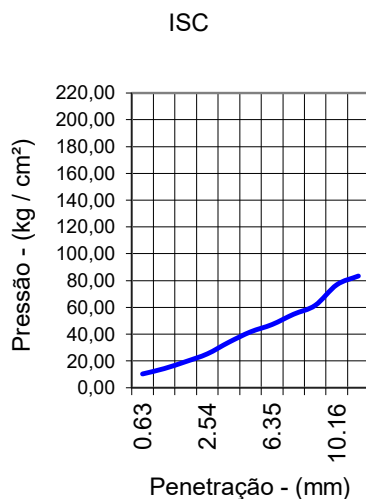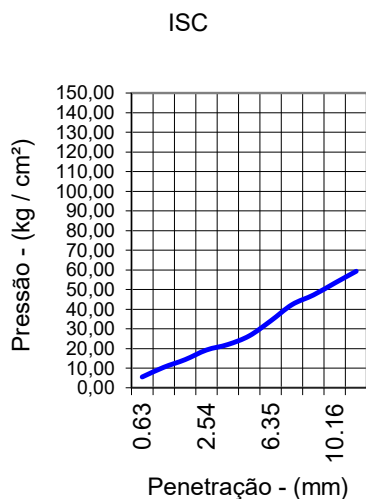

RESUMO

DENSIDADE MÁXIMA: 1960 g / cm³	ISC : 39,27 %
ÚMIDADE ÓTIMA: 9,64 %	EXPANSÃO : 0,15 %



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



Análise Granulométrica NORMA DNER ME -080/94 (Simples)




Rodovia: BR : 174		Profundidade: 0,15 1,10	
Trecho: VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA		Furo : 6	
Procedência: ESTUDO DE JAZIDA		Estaca: 0	
Camada: SUB-BASE	OPERADO	Data:	18/07/25

UMIDADE HIDROSCÓPICA		DISCRIMINAÇÃO		AMOSTRA SECA	
				Total	Parcial
Cápsula (N°)	45	78	Cápsula (N°)	31	11
Peso Umido (g)	55,11	67,17	Peso Bruto Úmido (g)	2000,0	200,0
Peso Bruto Seco (g)	54,00	66,03	Peso Retido na # N° 10 (g)	1384,41	
Peso da Água (g)	1,11	1,14	Peso Úmido Pass. na # N° 10 (g)	615,59	
Peso da Cápsula (g)	19,11	20,59	Peso Seco Pass. na # N° 10 (g)	598,60	
Peso do Solo Seco (g)	34,89	45,44	Peso da água (g)	16,99	
Umidade (%)	3,18	2,51	Peso da amostra Seca (g)	2 1983,0	3 194,5
Umidade Média (%)	2,8				

Peneiramento



Amostra Total	Peneiras		Peso Retido Parcial (g)	Peso que Passa Acumulado (g)	% que Passa Am.Total	FAIXA AASTHO		CONSTANTES
	Pol	mm				Mínimo	Máximo	
	2"	50,8	0,00	1983,0	100,0			$K_1=100 = 0,050$ 2
	1 1/2"	38,1	0,00	1983,0	100,0			
	1"	25,4	135,45	1847,6	92,0			$K_2= 4 = 0,154$ 3
	3/8"	9,5	675,41	1172,2	59,0			
	4	4,8	401,23	771,0	39,0			
	10	2,0	172,32	598,7	30,0	4		
Amostra Parcial	40	0,42	57,32	137,2	21,0			
	200	0,074	60,12	77,1	12,0			

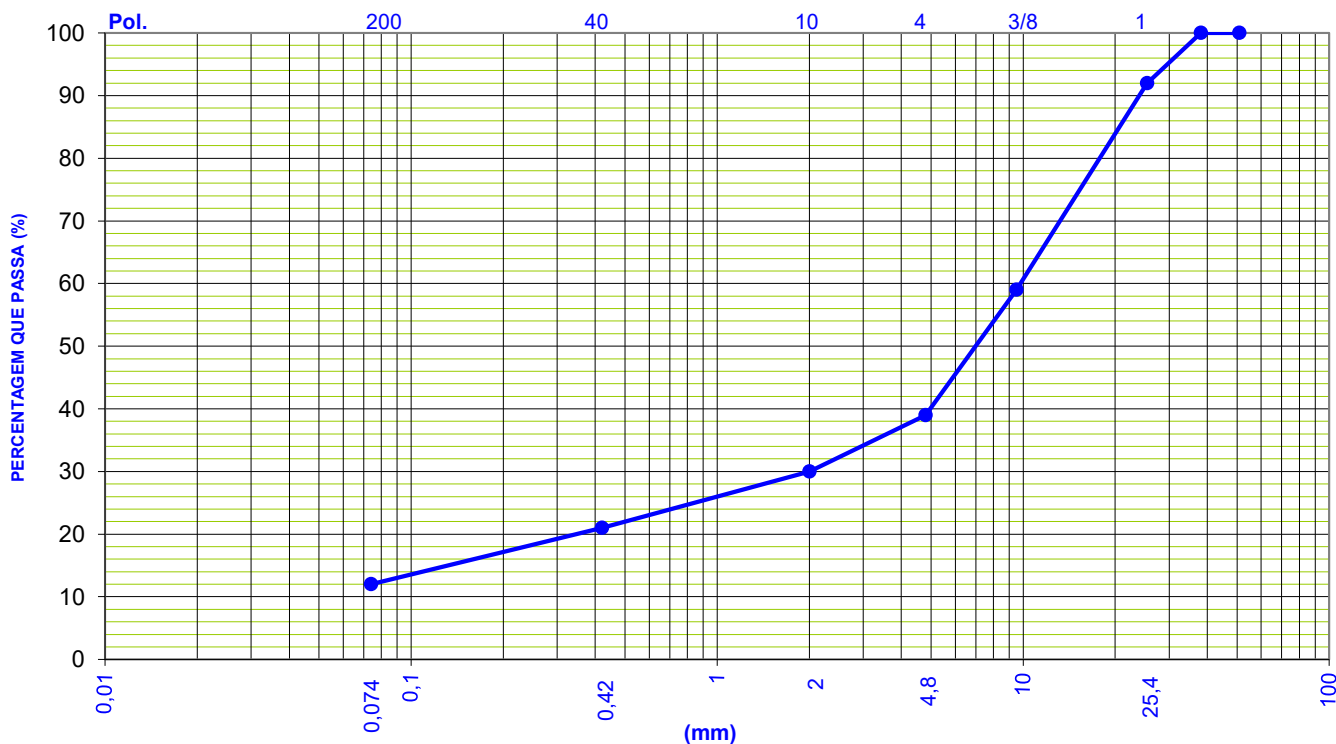

Resumo Granulometria (%)

Pedregulho (> 4,8 mm)	61,0
Areia Grossa (4,8 - 2,0 mm)	9,0
Areia Média (2,0 - 0,42 mm)	9,0
Areia Fina (0,42 - 0,074 mm)	9,0
Passando (0,074 mm)	12,0
Total	100,0

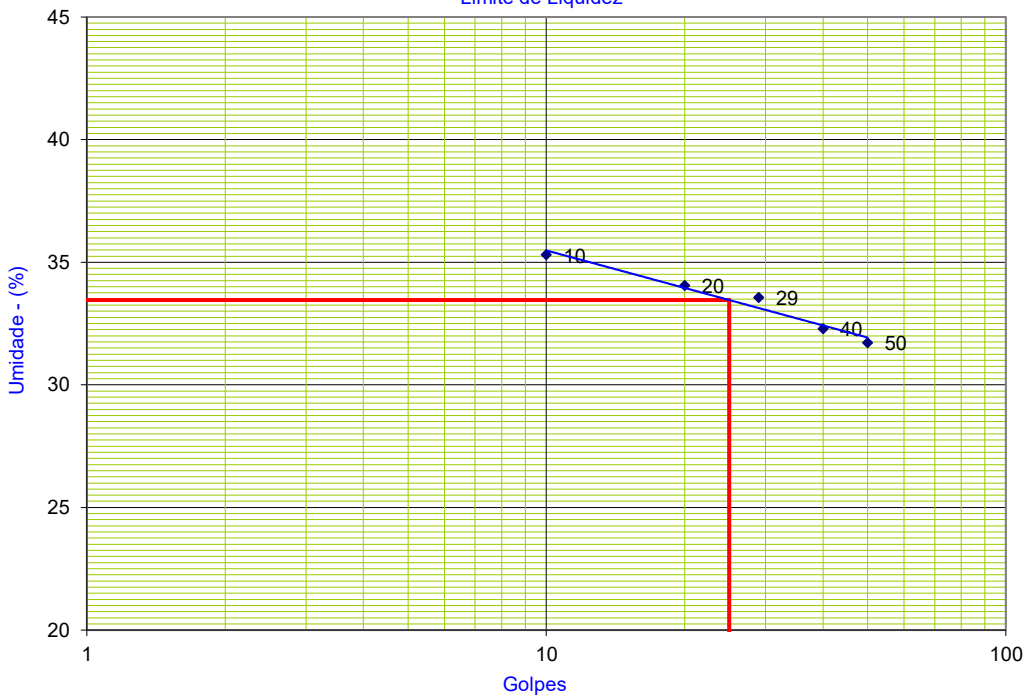

  MTEC CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda		LIMITES FÍSICOS  PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS					
Rodovia: RR – 171		Profund.: 0,15 1,10		OPERADO FERNANDO			
Trecho: VICINAL 8 MARTIHIS PEREIRA		Furo : 6					
Procedência: ESTUDO DE JAZIDA		Estaca: 0					
Camada: SUB-BASE		Data: 19/07/2025		LADO L / E			
LIMITE DE LIQUIDEZ NORMA DNER ME - 122/94							
Cápsula	N.º	85	35	47	85	95	
Golpes	g	10	20	29	40	50	
Peso Bruto Úmido	g	25,58	35,78	21,35	24,95	26,05	
Peso Bruto Seco	g	20,43	28,30	17,42	20,19	21,14	
Peso da Cápsula	g	5,84	6,33	5,71	5,45	5,66	
Peso da Água	g	5,15	7,48	3,93	4,76	4,91	
Peso do Solo Seco	g	14,59	21,97	11,71	14,74	15,48	
Umidade	%	35,30	34,05	33,56	32,29	31,72	
LIMITE DE PLASTICIDADE NORMA DNER ME - 082/94							
Cápsula	N.º	75	35	95	45	75	
Peso Bruto Úmido	g	8,18	8,16	7,74	7,32	7,60	
Peso Bruto Seco	g	7,80	7,75	7,34	7,01	7,28	
Peso da Cápsula	g	6,15	5,96	5,61	5,52	5,80	
Peso da Água	g	0,38	0,41	0,40	0,31	0,32	
Peso do Solo Seco	g	1,65	1,79	1,73	1,49	1,48	
Umidade	%	23,03	22,91	23,12	20,81	21,62	
Índice de Plasticidade LL= 33,5% LP = 22,7% IP= 10,8%		 Limite de Liquidez					



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA



Via Norte Construtora Ltda

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DNIT- 139/2010 - ES

E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA



Folha:

Única


Data:

17/07/2025


Rodovia: BR : 174		Trecho: VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA		Sub-trecho: KM 20,900			Registro: ESTUDO DE JAZIDA	
Estaca:	Furo: 7	Profundidade: 0,15 1,10		Material: Solo Laterítico Argiloso Vermelho			SUB-BASE	
% Mat. Ret. # N° 4: 38,00%	Próctor: intermediario		Golpes: 26		Operador: GABRIEL		Lado L / E	
Item	Unid.	1	2	3	4	5	6	Umidade Higroscópica
Cápsula N°	-							11 21
Peso Bruto Úmido	g							55,11 67,17
Peso Bruto Seco	g							54,00 66,03
Peso da Água	g							1,11 1,14
Peso da Cápsula	g							19,11 20,59
Peso do Solo Seco	g							34,89 45,44
Umidade	%							3,18% 2,51%
Umidade calculada	%	4,8%	6,8%	8,9%	10,9%	13,0%		2,8%
Água Total	g	324	464	604	744	884		Peso do Material
Água Adicionada	g	130	270	410	550	690		7.000,00
% Água Adicionada	%	1,86%	3,86%	5,86%	7,86%	9,86%		P. Mat. Seco Peso Água
Peso Bruto Úmido	g	8.100	8.080	8.620	8.350	8.850		6.806 194
Peos do Solo Úmido	g	3.700	3.995	4.385	4.205	4.136		Moldes
Dens. Solo Úmido	g / m³	1.771	1.992	2.130	2.096	1.980		N° Peso Volume
Dens. Solo Seco	g / m³	1.691	1.865	1.956	1.890	1.752		34 4.400 2.089
Resultados:		Observações:					81	4.085 2.006
							22	4.235 2.059
							10	4.145 2.006
							42	4.714 2.089
H. Ótima 9,0 %	Dens. Máx 1.957	ISC 38,1	Expansão 0,11					




Análise Gráfica

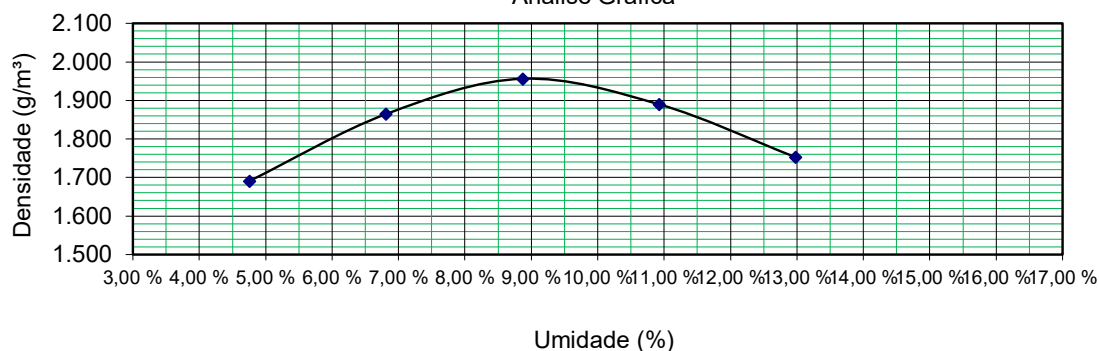

Índice de Suporte Califórnia

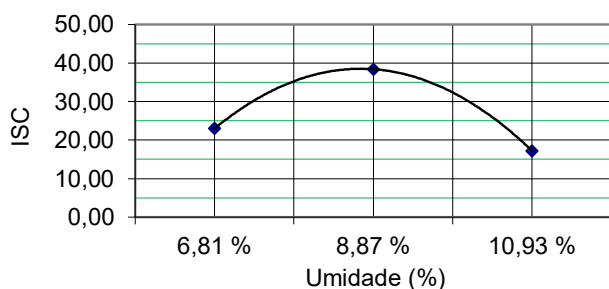

Expansão

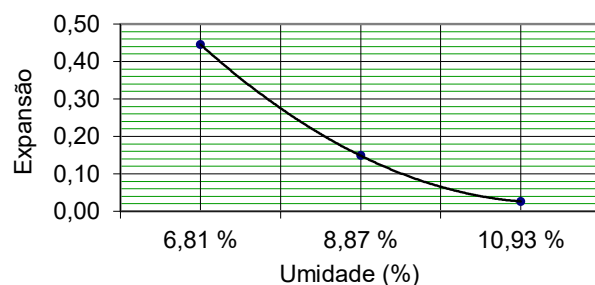



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE EXPANSÃO / I.S.C



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS


TRECHO:					DATA:					
VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA					17/07/2025					
RODOVIA:			SUB-TRECHO			OPERADO				
BR : 174			KM 20,900			GABRIEL				
ESTACA:		LADO:	FURO:		PROFUNDIDADE:		GOLPES:		ESTUDO:	
0		L / E	7		0,15 1,10		26		SUB-BASE	
% MATERIAL RET. PEN. Nº 4			PROCTOR:			MATERIAL:				
38,00%			intermediario			Solo Lateritico Argiloso Vermelho				

ENSAIO DE EXPANSÃO NORMA DNER - ME 049/94


MOLDE Nº 81		ALTURA 114,5			MOLDE Nº 22		ALTURA 114,5		MOLDE Nº 10		ALTURA 114,5	
DATA	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%
17/07/25	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00	0,00	0,00
												
21/07/25	09:00	1,51	0,51	0,45	09:00	1,17	0,17	0,15	09:00	1,03	0,03	0,03

ENSAIO DE I.S.C NORMA DNIT 172/2016 - ME


MOLDE Nº 81			K-PRENSA = 0,110				MOLDE Nº 22				MOLDE Nº 10			
PENETR. mm	TEMPO min	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %		LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %
0.63	0.5	60	6,60				85	9,30			35	3,80		
1.27	1.0	97	10,70				130	14,30			65	7,10		
1.90	1.5	125	13,70				175	19,20			95	10,40		
2.54	2.0	140	15,40	70	22,00		245	26,90	70	38,40	105	11,50	70	16,40
3.81	3.0	185	20,30				298	32,70			135	14,80		
5.08	4.0	220	24,20	105	23,00		360	39,50	105	37,60	165	18,10		17,20
6.35	5.0	275	30,20				400	43,90			195	21,40		
7.62	6.0	320	35,10				475	52,20			235	25,80		
8.89	7.0	375	41,20				560	61,50			285	31,30		
10.16	8.0	460	50,50				655	71,90			320	35,10		
12.70	10.0	530	58,20				785	86,20			356	39,10		

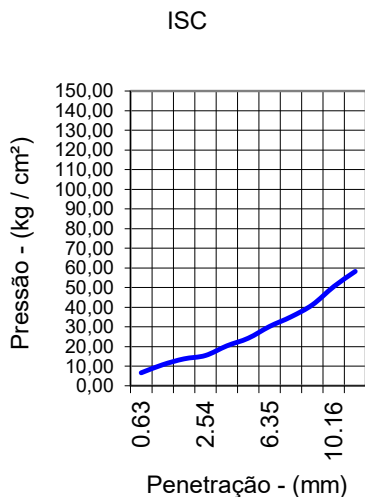

ISC = 23,00 %

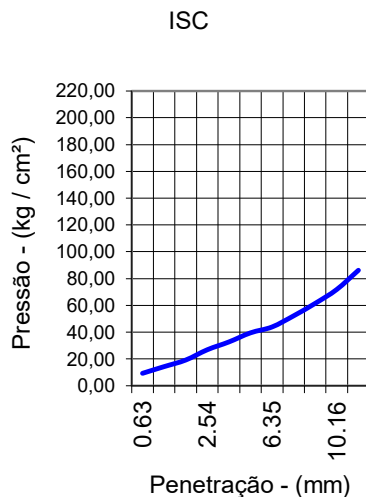

ISC = 38,40 %

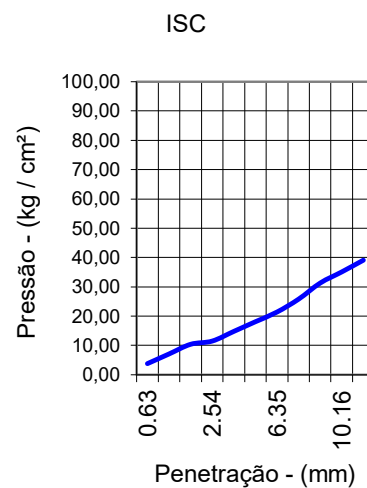

ISC = 17,20 %

RESUMO


DENSIDADE MÁXIMA: 1957 g / cm³	ISC : 38,05 %
ÚMIDADE ÓTIMA: 9,03 %	EXPANSÃO : 0,11 %

Rodovia: BR : 174	Profundidade: 0,15 1,10
Trecho: VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA	Furo : 7
Procedência: ESTUDO DE JAZIDA	Estaca: 0
Camada: SUB-BASE	Operado GABRIEL Data: 17/07/25

UMIDADE HIDROSCÓPICA			DISCRIMINAÇÃO		AMOSTRA SECA	
					Total	Parcial
Cápsula (N°)	11	21	Cápsula (N°)		31	11
Peso Umido (g)	55,11	67,17	Peso Bruto Úmido (g)		2000,0	200,0
Peso Bruto Seco (g)	54,00	66,03	Peso Retido na # N° 10 (g)		902,02	
Peso da Água (g)	1,11	1,14	Peso Úmido Pass. na # N° 10 (g)		1097,98	
Peso da Cápsula (g)	19,11	20,59	Peso Seco Pass. na # N° 10 (g)		1067,60	
Peso do Solo Seco (g)	34,89	45,44	Peso da água (g)		30,38	
Umidade (%)	3,18	2,51	Peso da amostra Seca (g)		2 1969,6	3 194,5
Umidade Média (%)	2,8					

Peneiramento


Amostra Total	Peneiras		Peso Retido Parcial (g)	Peso que Passa Acumulado (g)	% que Passa Am.Total	FAIXA AASTHO		CONSTANTES
	Pol	mm				Mínimo	Máximo	
	2"	50,8	0,00	1969,6	100,0			K ₁ =100 = 0,051 2
	1 1/2"	38,1	0,00	1969,6	100,0			K ₂ = 4 = 0,278 3
	1"	25,4	110,52	1859,1	95,0			
	3/8"	9,5	395,12	1464,0	75,0			
	4	4,8	251,25	1212,8	62,0			
	10	2,0	145,13	1067,7	54,0			
	40	0,42	58,91	135,6	38,0			
Amostra Parcial	200	0,074	82,85	52,8	15,0			

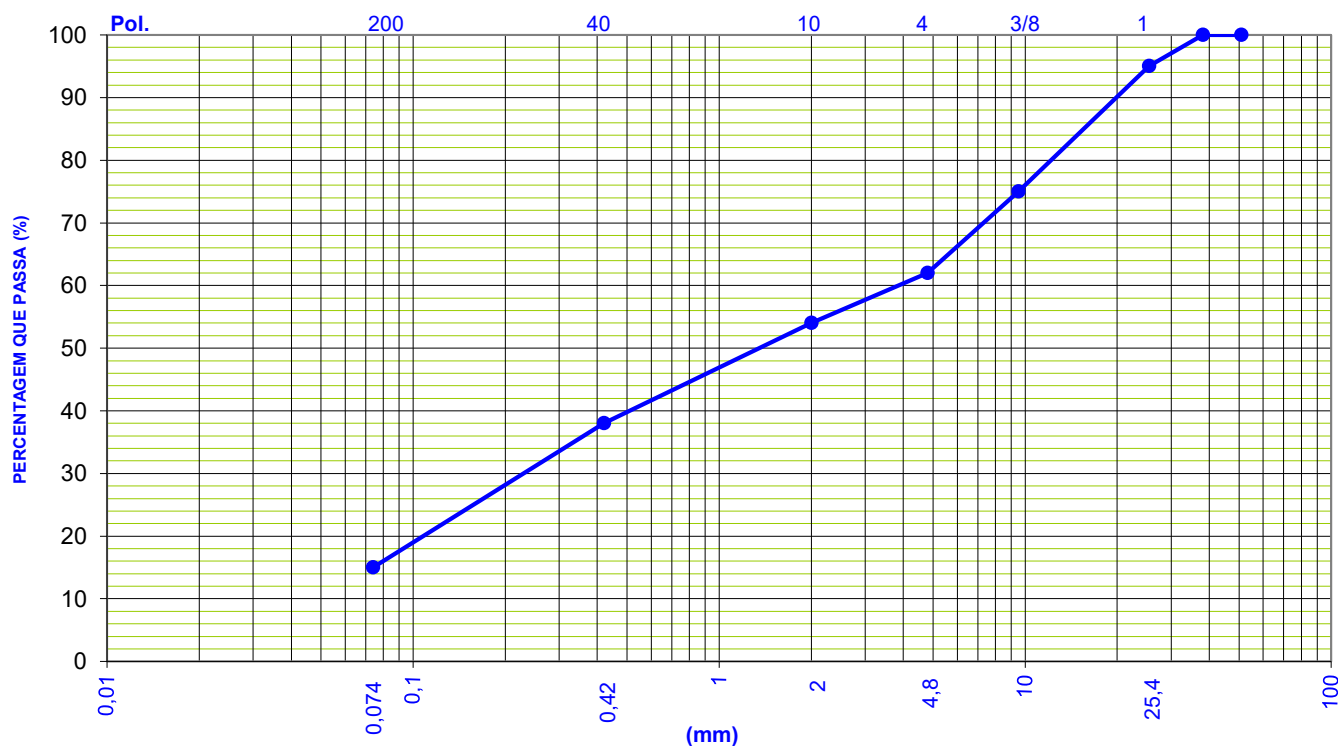

Resumo Granulometria (%)

Pedregulho (> 4,8 mm)	38,0
Areia Grossa (4,8 - 2,0 mm)	8,0
Areia Média (2,0 - 0,42 mm)	16,0
Areia Fina (0,42 - 0,074 mm)	23,0
Passando (0,074 mm)	15,0
Total	100,0

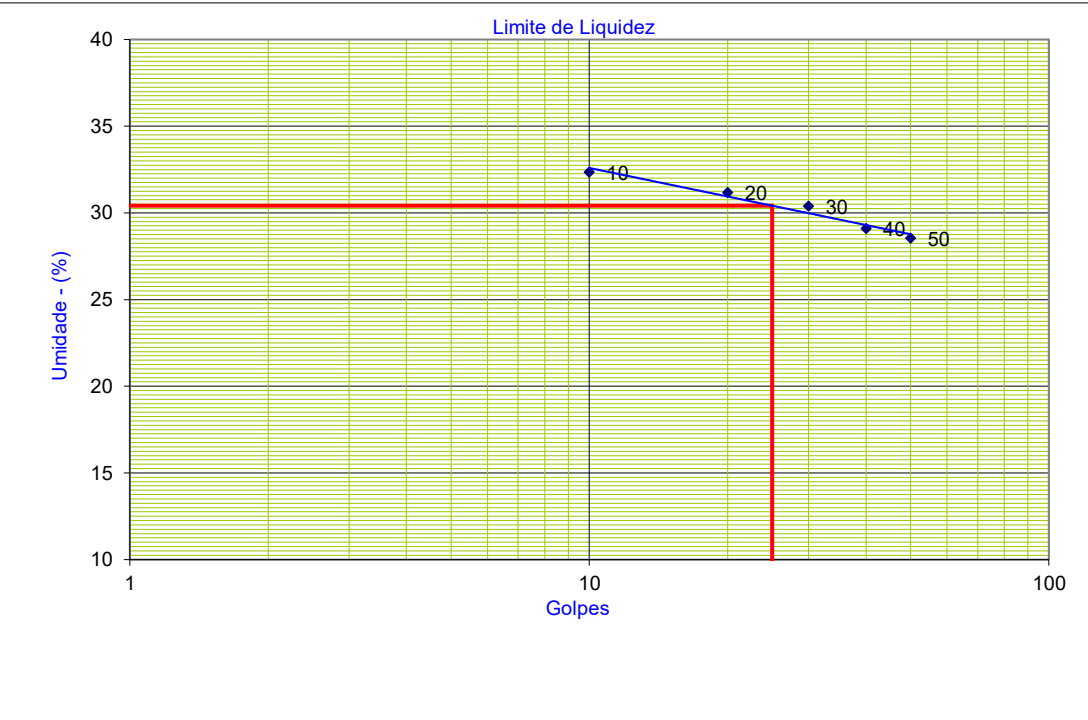

  MTEC CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda		LIMITES FÍSICOS  PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS					
Rodovia: RR 171		Profund.: 0,15 1,10		OPERADO GABRIEL			
Trecho: VICINAL 8 MARTIHIS PEREIRA		Furo : 7					
Procedência: ESTUDO DE JAZIDA		Estaca: 0					
Camada: SUB-BASE		Data: 18/07/2025		LADO L / E			
LIMITE DE LIQUIDEZ NORMA DNER ME - 122/94							
Cápsula	N.º	85	74	25	34	44	
Golpes	g	10	20	30	40	50	
Peso Bruto Úmido	g	25,15	35,15	20,98	24,48	25,56	
Peso Bruto Seco	g	20,43	28,30	17,42	20,19	21,14	
Peso da Cápsula	g	5,84	6,33	5,71	5,45	5,66	
Peso da Água	g	4,72	6,85	3,56	4,29	4,42	
Peso do Solo Seco	g	14,59	21,97	11,71	14,74	15,48	
Umidade	%	32,35	31,18	30,40	29,10	28,55	
LIMITE DE PLASTICIDADE NORMA DNER ME - 082/94							
Cápsula	N.º	74	05	01	08	40	
Peso Bruto Úmido	g	8,14	8,13	7,70	7,32	7,58	
Peso Bruto Seco	g	7,80	7,75	7,34	7,01	7,28	
Peso da Cápsula	g	6,15	5,96	5,61	5,52	5,80	
Peso da Água	g	0,34	0,38	0,36	0,31	0,30	
Peso do Solo Seco	g	1,65	1,79	1,73	1,49	1,48	
Umidade	%	20,61	21,23	20,81	20,81	20,27	
Índice de Plasticidade LL= 30,4% LP = 20,7% IP= 9,7%		 Limite de Liquidez					



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DNIT- 139/2010 - ES

E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS

Folha:


Única

Data:


17/07/2025

Rodovia: BR : 174		Trecho: VICINAL 8 MARTIHIS PEREIRA			Sub-trecho: KM 20,900			Registro: ESTUDO DE JAZIDA			
Estaca:		Furo: 8		Profundidade: 0,15 1,10		Material: Solo Laterítico Argiloso Vermelho			SUB-BASE		
% Mat. Ret. # Nº 4: 32,00%		Próctor: intermediário			Golpes: 26		Operador: GABRIEL		Lado L / E		
Item		Unid.	1	2	3	4	5	6	Umidade Higroscópica		
Cápsula Nº		-							2	31	
Peso Bruto Úmido		g							58,17	62,19	
Peso Bruto Seco		g							57,00	61,00	
Peso da Água		g							1,17	1,19	
Peso da Cápsula		g							19,11	20,59	
Peso do Solo Seco		g							37,89	40,41	
Umidade		%							3,09%	2,94%	
Umidade calculada		%	5,1%	7,1%	9,2%	11,3%	13,3%		3,0%		
Água Total		g	345	485	625	765	905		Peso do Material		
Água Adicionada		g	140	280	420	560	700		7.000,00		
% Água Adicionada		%	2,00%	4,00%	6,00%	8,00%	10,00%		P. Mat. Seco	Peso Água	
Peso Bruto Úmido		g	7.750	8.060	8.576	8.430	8.890		6.795	205	
Peos do Solo Úmido		g	3.625	3.975	4.469	4.226	4.176		Moldes		
Dens. Solo Úmido		g / m³	1.734	1.982	2.141	2.107	1.999		Nº	Peso	Volume
Dens. Solo Seco		g / m³	1.650	1.850	1.961	1.894	1.764		20	4.125	2.091
Resultados:				Observações:							
H. Ótima	Dens. Máx	ISC	Expansão	62	4.085	2.006					
9,5 %	1.962	36,7	0,10	67	4.107	2.087					
				71	4.204	2.006					
				42	4.714	2.089					


Análise Gráfica

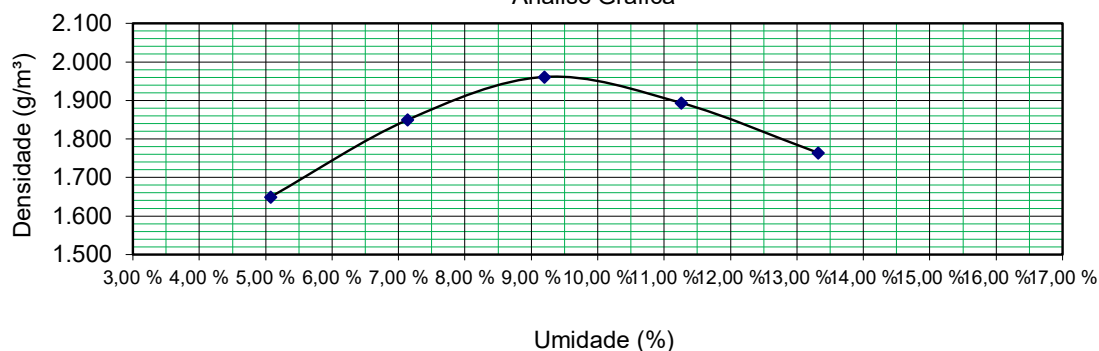

Índice de Suporte Califórnia

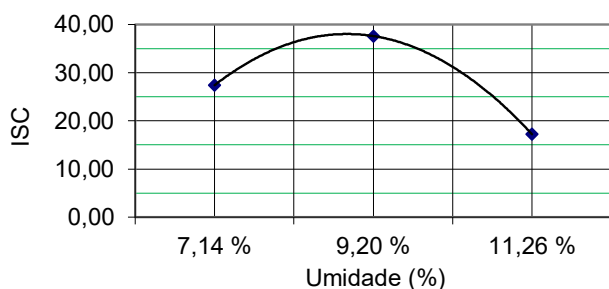

Expansão

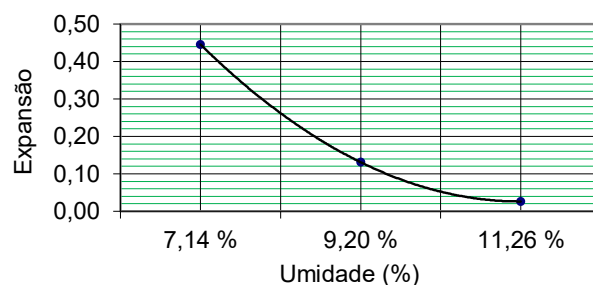



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE EXPANSÃO / I.S.C



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS

TRECHO: VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA					DATA: 17/07/2025			
RODOVIA: BR : 174			TRECHO: KM 20,900			OPERADO: GABRIEL		
ESTACA: 0		LADO: L / E	FURO: 8	PROFUNDIDADE: 0,15 1,10		GOLPES: 26		ESTUDO: SUB-BASE
% MATERIAL RET. PEN. Nº 4 32,00%			PROCTOR: intermediario			MATERIAL: Solo Laterítico Argiloso Vermelho		

ENSAIO DE EXPANSÃO NORMA DNER - ME 049/94

MOLDE N°	62	ALTURA			114,5	MOLDE N°	67	ALTURA			114,5	MOLDE N°	71	ALTURA			114,5
DATA	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%		HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%			HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%		
17/07/25	10:00	1,00		0,00		10:00	1,00		0,00			10:00	1,00	0,00	0,00		
21/07/25	09:00	1,51	0,51	0,45		09:00	1,15	0,15	0,13			09:00	1,03	0,03	0,03		




ENSAIO DE I.S.C NORMA DNIT 172/2016 - ME

MOLDE Nº			62			K-PRENSA =			0,110	MOLDE Nº				67				MOLDE Nº				71			
PENETR. mm	TEMPO min	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %				
0.63	0.5	55	6,00			85	9,30			40	4,40														
1.27	1.0	90	9,90			130	14,30			65	7,10														
1.90	1.5	120	13,20			185	20,30			85	9,30														
2.54	2.0	175	19,20	70	27,40	235	25,80	70	36,90	105	11,50	70	16,40												
3.81	3.0	210	23,10			300	32,90			135	14,80														
5.08	4.0	255	28,00	105	26,70	360	39,50	105	37,60	165	18,10	105	17,20												
6.35	5.0	300	32,90			460	50,50			200	22,00														
7.62	6.0	350	38,40			535	58,70			235	25,80														
8.89	7.0	410	45,00			674	74,00			275	30,20														
10.16	8.0	460	50,50			760	83,40			320	35,10														
12.70	10.0	510	56,00			890	97,70			365	40,10														






ISC

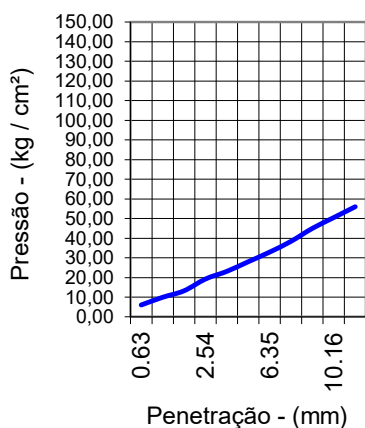


ISC = 27,40 %

ISC

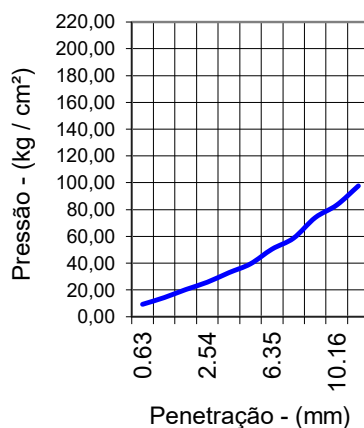

ISC = 37,60 %

ISC

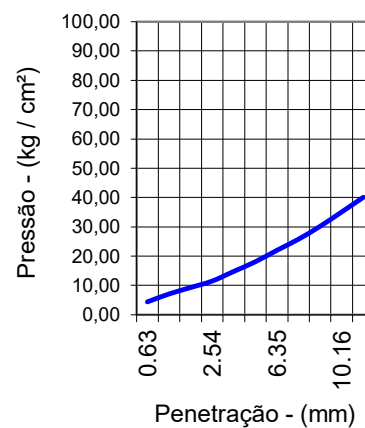

ISC = 17,20 %

RESUMO


DENSIDADE MÁXIMA:	1962	g / cm³	ISC :	36,74	%
ÚMIDADE ÓTIMA:	9,45	%	EXPANSÃO :	0,10	%

Rodovia: BR : 174	Profundidade: 0,15 1,10
Trecho: VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA	Furo : 8
Procedência: ESTUDO DE JAZIDA	Estaca: 0
Camada: SUB-BASE	Operado GABRIEL Data: 17/07/25

UMIDADE HIDROSCÓPICA			DISCRIMINAÇÃO		AMOSTRA SECA	
					Total	Parcial
Cápsula (N°)	02	31	Cápsula (N°)		33	31
Peso Umido (g)	58,17	62,19	Peso Bruto Úmido (g)		2000,0	200,0
Peso Bruto Seco (g)	57,00	61,00	Peso Retido na # N° 10 (g)		741,04	
Peso da Água (g)	1,17	1,19	Peso Úmido Pass. na # N° 10 (g)		1258,96	
Peso da Cápsula (g)	19,11	20,59	Peso Seco Pass. na # N° 10 (g)		1222,10	
Peso do Solo Seco (g)	37,89	40,41	Peso da água (g)		36,86	
Umidade (%)	3,09	2,94	Peso da amostra Seca (g)		2	3
Umidade Média (%)	3,0				1963,1	194,1

Peneiramento

Amostra Total	Peneiras		Peso Retido Parcial (g)	Peso que Passa Acumulado (g)	% que Passa Am.Total	FAIXA AASTHO		CONSTANTES
	Pol	mm				Mínimo	Máximo	
	2"	50,8	0,00	1963,1	100,0			K ₁ =100 = 0,051
	1 1/2"	38,1	0,00	1963,1	100,0			2
	1"	25,4	80,65	1882,5	96,0			K ₂ = 4 = 0,319
	3/8"	9,5	348,45	1534,1	78,0			3
	4	4,8	205,00	1329,1	68,0			
	10	2,0	106,94	1222,2	62,0			
Amostra Parcial	40	0,42	81,43	112,7	36,0			
	200	0,074	74,88	37,8	12,0			

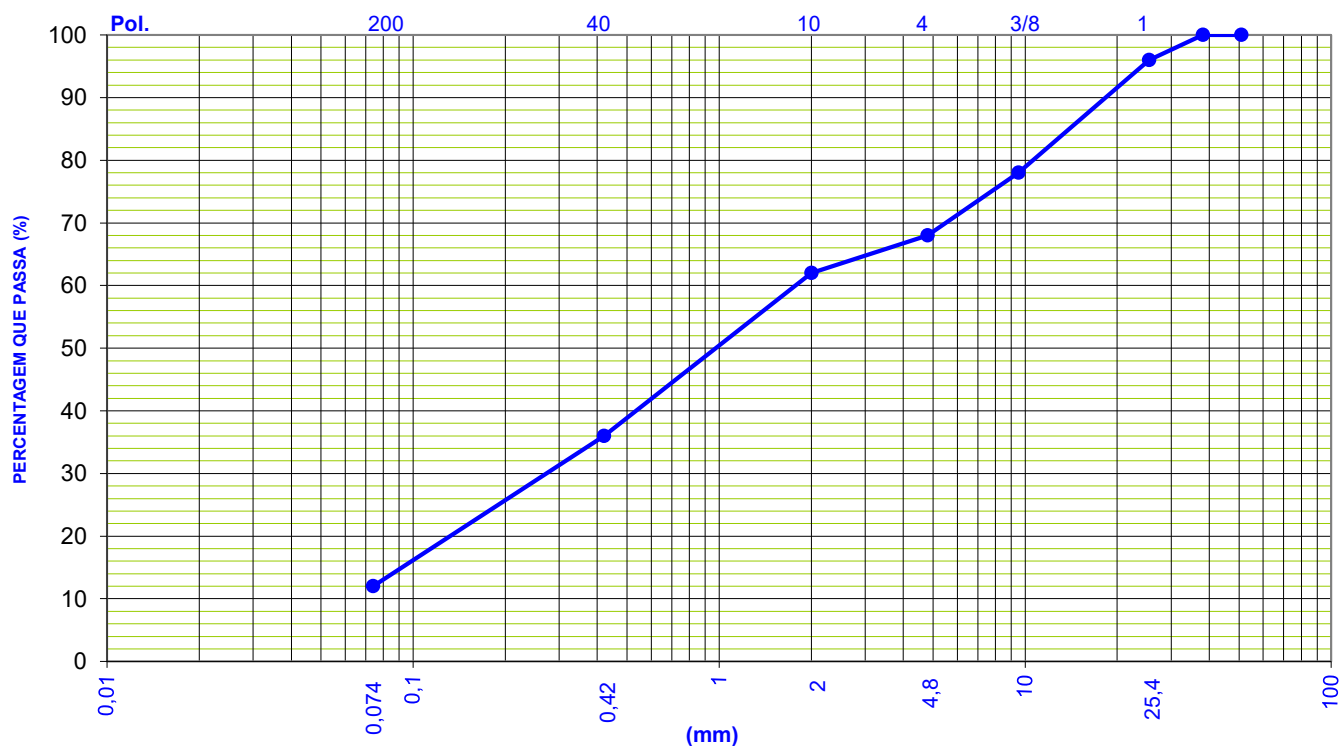

Resumo Granulometria (%)

Pedregulho (> 4,8 mm)	32,0
Areia Grossa (4,8 - 2,0 mm)	6,0
Areia Média (2,0 - 0,42 mm)	26,0
Areia Fina (0,42 - 0,074 mm)	24,0
Passando (0,074 mm)	12,0
Total	100,0





CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



LIMITES FÍSICOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS


Rodovia: RR 171	Profund.: 0,15 1,10	OPERADO GABRIEL
Trecho: VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA	Furo : 8	
Procedência: ESTUDO DE JAZIDA	Estaca: 0	
Camada: SUB-BASE	Data: 18/07/2025	LADO L / E

LIMITE DE LIQUIDEZ NORMA DNER ME - 122/94

Cápsula	N.º	10	65	23	40	74	
Golpes	g	11	20	30	40	50	
Peso Bruto Úmido	g	14,25	14,74	12,00	14,67	10,68	
Peso Bruto Seco	g	12,29	12,71	10,49	12,79	9,52	
Peso da Cápsula	g	6,33	6,33	5,53	6,40	5,53	
Peso da Água	g	1,96	2,03	1,51	1,88	1,16	
Peso do Solo Seco	g	5,96	6,38	4,96	6,39	3,99	
Umidade	%	32,89	31,82	30,44	29,42	29,07	

LIMITE DE PLASTICIDADE NORMA DNER ME - 082/94

Cápsula	N.º	22	55	32	46	85	
Peso Bruto Úmido	g	8,66	8,09	7,98	7,91	6,50	
Peso Bruto Seco	g	8,27	7,67	7,56	7,56	6,30	
Peso da Cápsula	g	6,43	5,68	5,54	5,81	5,33	
Peso da Água	g	0,39	0,42	0,42	0,35	0,20	
Peso do Solo Seco	g	1,84	1,99	2,02	1,75	0,97	
Umidade	%	21,20	21,11	20,79	20,00	20,62	

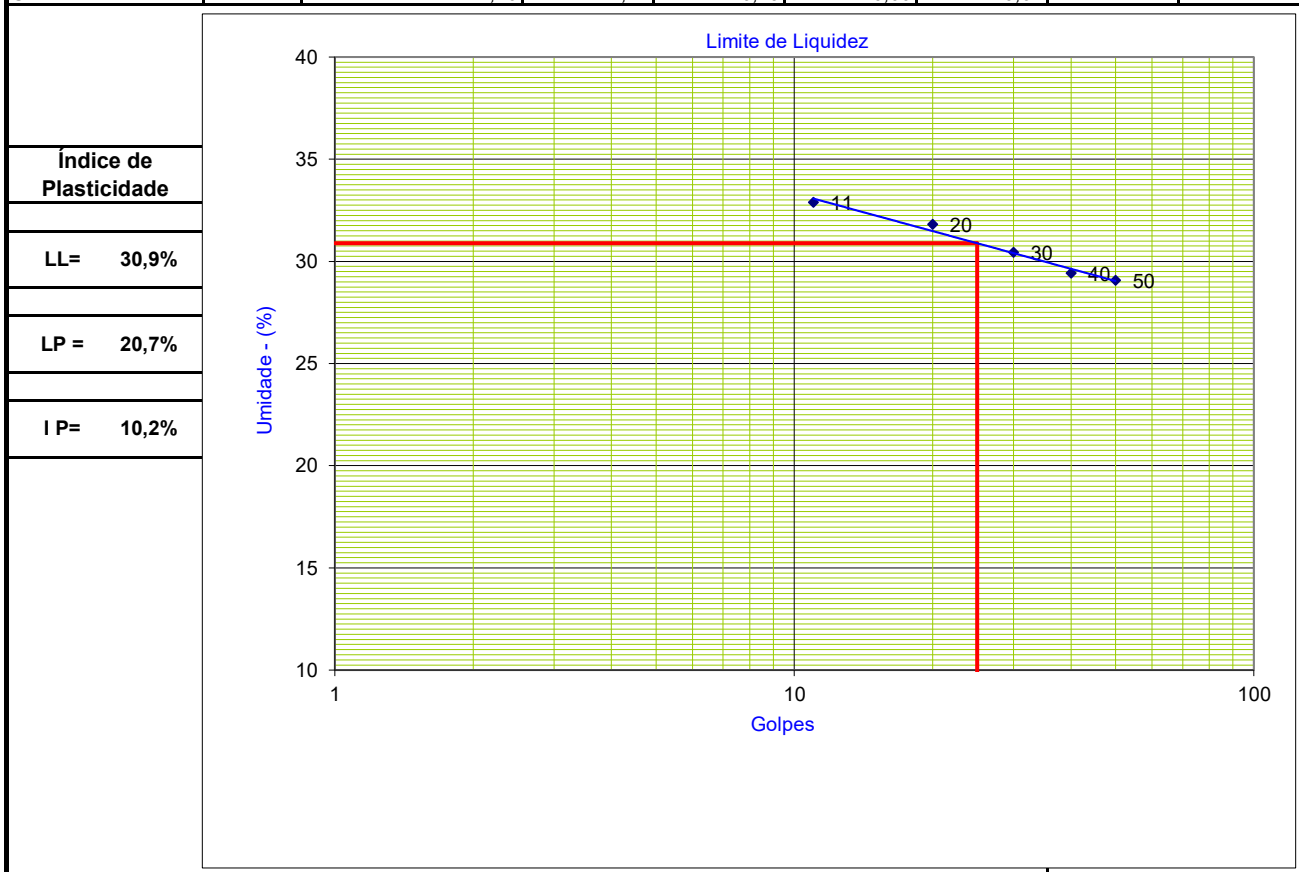



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA. Via Norte Construtora Ltda.



ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DNIT- 139/2010 - ES

E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

Folha:

Única


Data:

26/04/2025


Rodovia: BR : 174		Trecho: VICINAL 8 MARTIHIS PEREIRA			Sub-trecho: KM 20,900			Registro: ESTUDO DE JAZIDA			
Estaca: KM 615		Furo: 9		Profundidade: 0,15 1,10		Material: Solo Laterítico Argiloso Vermelho			SUB-BASE		
% Mat. Ret. # Nº 4: 49,00%		Próctor: intermediario			Golpes: 26		Operador: GABRIEL		Lado L / E		
Item		Unid.	1	2	3	4	5	6	Umidade Higroscópica		
Cápsula Nº		-							2	31	
Peso Bruto Úmido		g							58,17	62,11	
Peso Bruto Seco		g							57,00	61,00	
Peso da Água		g							1,17	1,11	
Peso da Cápsula		g							19,11	20,59	
Peso do Solo Seco		g							37,89	40,41	
Umidade		%							3,09%	2,75%	
Umidade calculada		%	4,8%	6,9%	8,9%	11,0%	13,1%		2,9%		
Água Total		g	328	468	608	748	888		Peso do Material		
Água Adicionada		g	130	270	410	550	690		7.000,00		
% Água Adicionada		%	1,86%	3,86%	5,86%	7,86%	9,86%		P. Mat. Seco	Peso Água	
Peso Bruto Úmido		g	7.750	8.120	8.756	8.620	8.890		6.802	198	
Peos do Solo Úmido		g	3.625	4.035	4.512	4.288	4.176		Moldes		
Dens. Solo Úmido		g / m³	1.734	2.011	2.149	2.138	1.999		Nº	Peso	Volume
Dens. Solo Seco		g / m³	1.654	1.882	1.972	1.926	1.768		20	4.125	2.091
Resultados:				Observações:							
H. Ótima	Dens. Máx	ISC	Expansão	22	4.085	2.006					
9,3 %	1.974	38,0	0,09	35	4.244	2.100					
				27	4.332	2.006					
				42	4.714	2.089					




Análise Gráfica

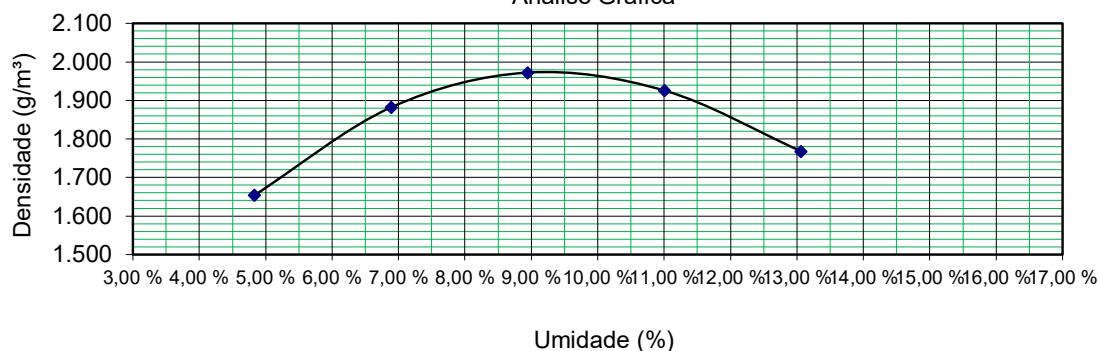

Índice de Suporte Califórnia

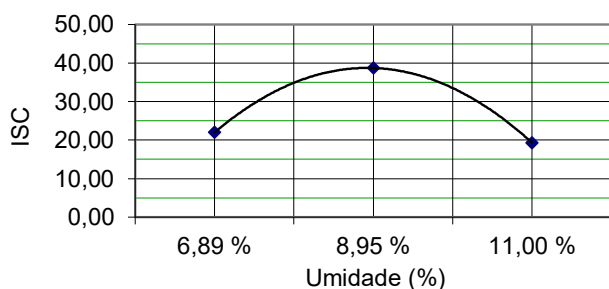

Expansão

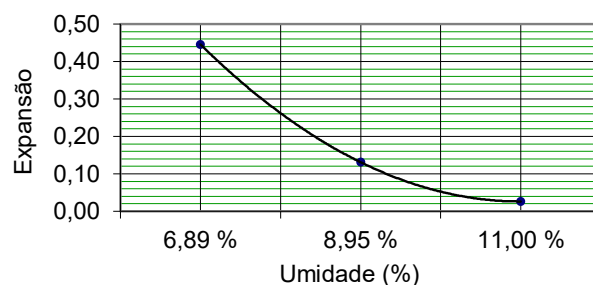



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE EXPANSÃO / I.S.C



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS

TRCHO:	VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA				DATA:	26/04/2025	
RODOVIA:	BR : 174		SUB-TRECHO	KM 20,900		OPERADO	GABRIEL
ESTACA:	KM 615	LADO:	L / E	FURO:	9	PROFUNDIDADE:	0,15 1,10
GOLPES:	26		ESTUDO:	SUB-BASE			
% MATERIAL RET. PEN. N° 4	49,00%		PROCTOR:	intermediario		MATERIAL:	Solo Laterítico Argiloso Vermelho




ENSAIO DE EXPANSÃO NORMA DNER - ME 049/94

MOLDE N°	22	ALTURA			114,5	MOLDE N°	35	ALTURA			114,5	MOLDE N°	27	ALTURA			114,5
DATA	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%		HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%			HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%		
26/04/25	10:00	1,00		0,00		10:00	1,00		0,00			10:00	1,00	0,00	0,00		
30/04/25	09:00	1,51	0,51	0,45		09:00	1,15	0,15	0,13			09:00	1,03	0,03	0,03		



ENSAIO DE I.S.C NORMA DNIT 172/2016 - ME

MOLDE N° 22			K-PRENSA = 0,110			MOLDE N° 35				MOLDE N° 27			
PENETR. mm	TEMPO min	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %
0.63	0.5	58	6,40			89	9,80			36	4,00		
1.27	1.0	75	8,20			125	13,70			65	7,10		
1.90	1.5	110	12,10			165	18,10			95	10,40		
2.54	2.0	140	15,40	70	22,00	240	26,40	70	37,70	110	12,10	70	17,30
3.81	3.0	185	20,30			310	34,00			145	15,90		
5.08	4.0	210	23,10	105	22,00	370	40,60	105	38,70	185	20,30	105	19,30
6.35	5.0	260	28,50			450	49,40			210	23,10		
7.62	6.0	300	32,90			560	61,50			250	27,50		
8.89	7.0	365	40,10			610	67,00			320	35,10		
10.16	8.0	450	49,40			690	75,80			410	45,00		
12.70	10.0	520	57,10			730	80,20			485	53,30		

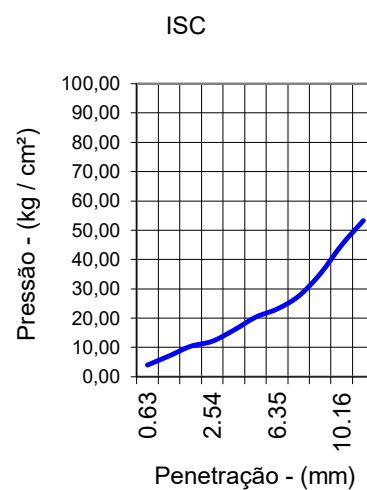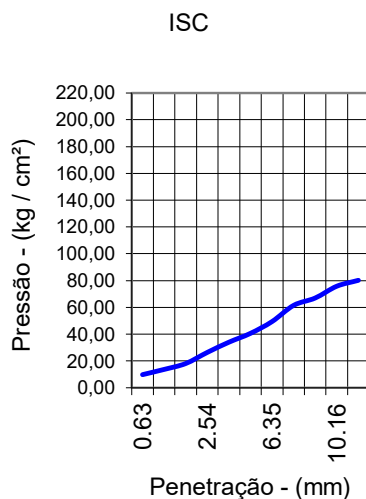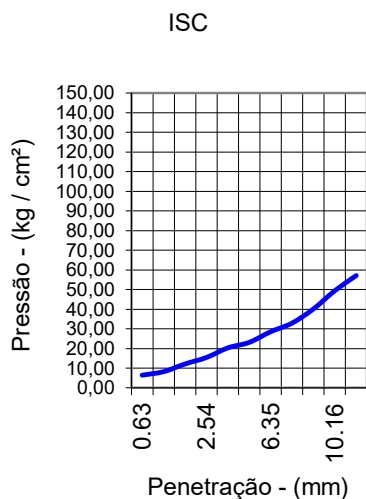

RESUMO


DENSIDADE MÁXIMA:	1974	g / cm³	ISC :	38,02	%
ÚMIDADE ÓTIMA:	9,28	%	EXPANSÃO :	0,09	%

Rodovia: BR : 174	Profundidade: 0,15 1,10
Trecho: VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA	Furo : 9
Procedência: ESTUDO DE JAZIDA	Estaca: KM 615
Camada: SUB-BASE	Data: 26/04/25
OPERADO GABRIEL	

UMIDADE HIDROSCÓPICA		DISCRIMINAÇÃO		AMOSTRA SECA	
				Total	Parcial
Cápsula (N°)	02	31	Cápsula (N°)	33	31
Peso Umido (g)	58,17	62,11	Peso Bruto Úmido (g)	2000,0	200,0
Peso Bruto Seco (g)	57,00	61,00	Peso Retido na # N° 10 (g)	1146,18	
Peso da Água (g)	1,17	1,11	Peso Úmido Pass. na # N° 10 (g)	853,82	
Peso da Cápsula (g)	19,11	20,59	Peso Seco Pass. na # N° 10 (g)	829,60	
Peso do Solo Seco (g)	37,89	40,41	Peso da água (g)	24,22	
Umidade (%)	3,09	2,75	Peso da amostra Seca (g)	2 1975,8	3 194,3
Umidade Média (%)	2,9				

Peneiramento



Amostra Total	Peneiras		Peso Retido Parcial (g)	Peso que Passa Acumulado (g)	% que Passa Am.Total	FAIXA AASTHO		CONSTANTES
	Pol	mm				Mínimo	Máximo	
	2"	50,8	0,00	1975,8	100,0			K ₁ =100 = 0,051 2
	1 1/2"	38,1	0,00	1975,8	100,0			
	1"	25,4	115,11	1860,7	95,0			K ₂ = 4 = 0,216 3
	3/8"	9,5	558,45	1302,3	66,0			
	4	4,8	305,68	996,6	51,0			
	10	2,0	166,94	829,7	42,0	4		
Amostra Parcial	40	0,42	51,43	142,9	31,0			
	200	0,074	78,88	64,0	14,0			

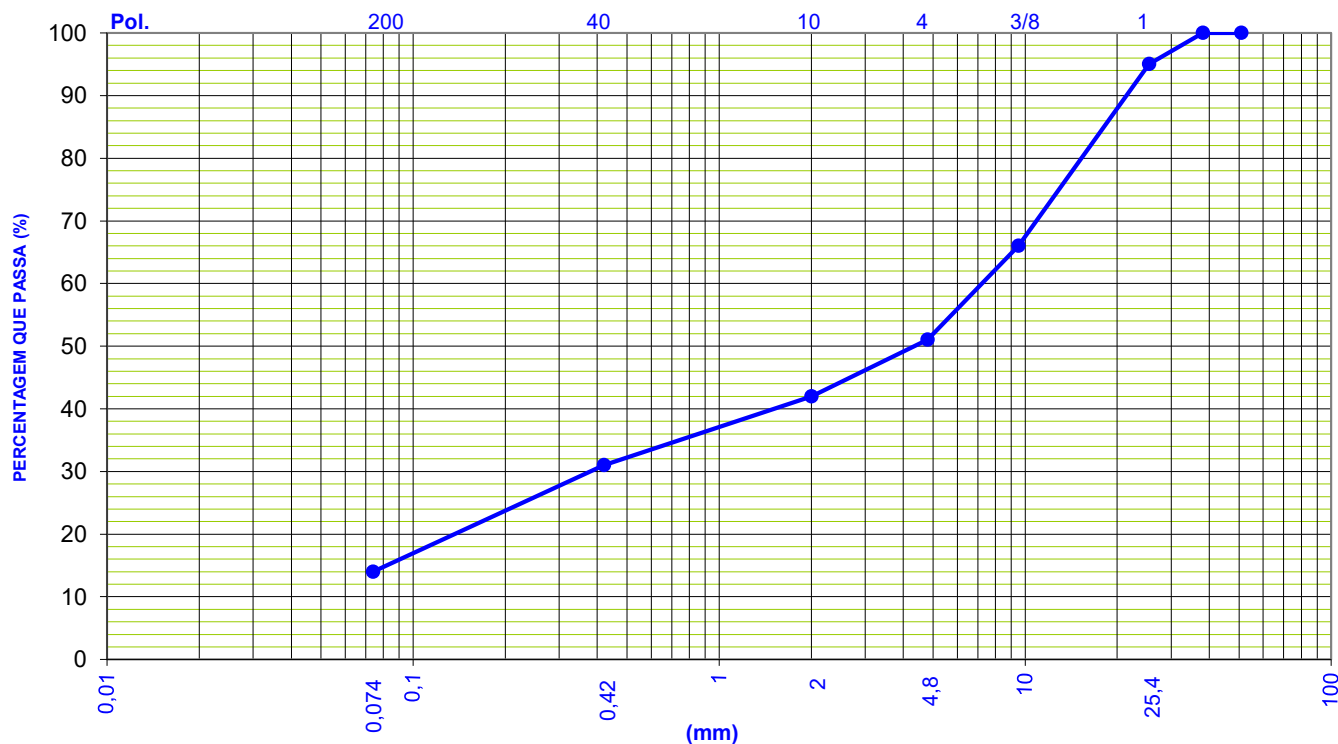

Resumo Granulometria (%)

Pedregulho (> 4,8 mm)	49,0
Areia Grossa (4,8 - 2,0 mm)	9,0
Areia Média (2,0 - 0,42 mm)	11,0
Areia Fina (0,42 - 0,074 mm)	17,0
Passando (0,074 mm)	14,0
Total	100,0

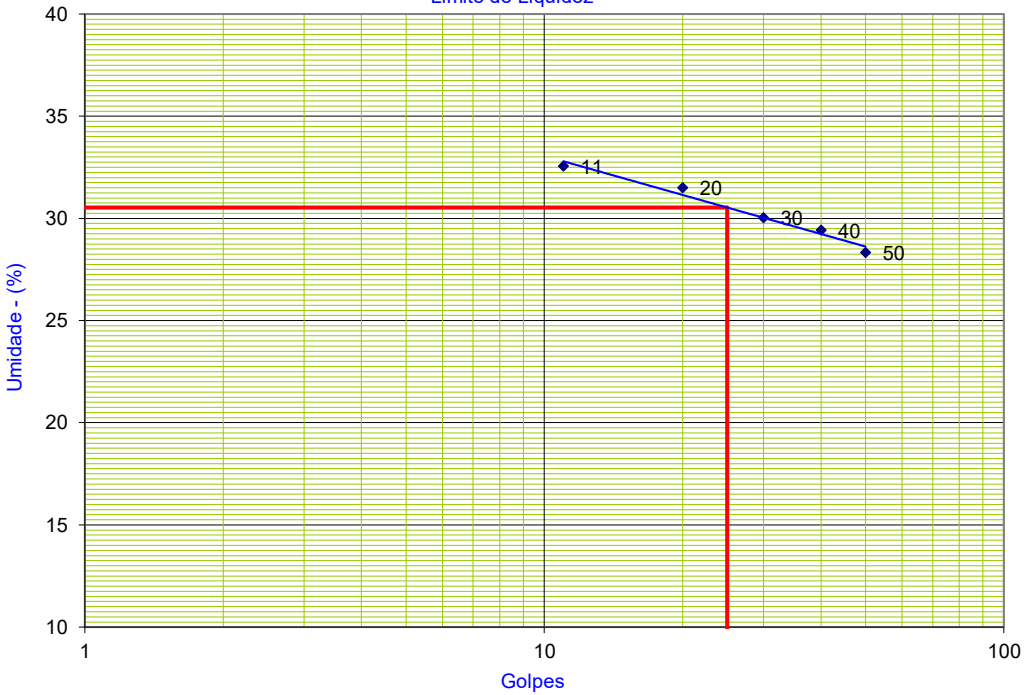

  MTEC CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda		LIMITES FÍSICOS  PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS					
Rodovia: RR 171		Profund.: 0,15 1,10		OPERADO GABRIEL			
Trecho: VICINAL 8 MARTIHIS PEREIRA		Furo : 9					
Procedência: ESTUDO DE JAZIDA		Estaca: KM 615					
Camada: SUB-BASE		Data: 27/04/2025		LADO L / E			
LIMITE DE LIQUIDEZ NORMA DNER ME - 122/94							
Cápsula	N.º	10	71	91	86	82	
Golpes	g	11	20	30	40	50	
Peso Bruto Úmido	g	14,23	14,72	11,98	14,67	10,65	
Peso Bruto Seco	g	12,29	12,71	10,49	12,79	9,52	
Peso da Cápsula	g	6,33	6,33	5,53	6,40	5,53	
Peso da Água	g	1,94	2,01	1,49	1,88	1,13	
Peso do Solo Seco	g	5,96	6,38	4,96	6,39	3,99	
Umidade	%	32,55	31,50	30,04	29,42	28,32	
LIMITE DE PLASTICIDADE NORMA DNER ME - 082/94							
Cápsula	N.º	04	15	07	18	21	
Peso Bruto Úmido	g	8,64	8,07	7,98	7,88	6,48	
Peso Bruto Seco	g	8,27	7,67	7,56	7,56	6,30	
Peso da Cápsula	g	6,43	5,68	5,54	5,81	5,33	
Peso da Água	g	0,37	0,40	0,42	0,32	0,18	
Peso do Solo Seco	g	1,84	1,99	2,02	1,75	0,97	
Umidade	%	20,11	20,10	20,79	18,29	18,56	
Índice de Plasticidade LL= 30,5% LP = 20,1% IP= 10,4%		Limite de Liquidez 					



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA. Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DNIT- 139/2010 - ES

E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

Folha:


Única

Data:


17/07/2025

Rodovia: BR : 174		Trecho: VICINAL 8 MARTIHIS PEREIRA			Sub-trecho: KM 20,900			Registro: ESTUDO DE JAZIDA				
Estaca:	Furo: 10		Profundidade: 0,15 1,10		Material: Solo Laterítico Argiloso Vermelho			SUB-BASE				
% Mat. Ret. # N° 4: 29,00%	Próctor: intermediario			Golpes: 26		Operador: ADRIANO		Lado L / E				
Item	Unid.	1	2	3	4	5	6	Umidade Higroscópica				
Cápsula N°	-							31	45			
Peso Bruto Úmido	g							58,07	62,00			
Peso Bruto Seco	g							57,00	61,00			
Peso da Água	g							1,07	1,00			
Peso da Cápsula	g							19,11	20,59			
Peso do Solo Seco	g							37,89	40,41			
Umidade	%							2,82%	2,47%			
Umidade calculada	%	4,6%	6,7%	8,7%	10,8%	12,8%		2,6%				
Água Total	g	316	456	596	736	876		Peso do Material				
Água Adicionada	g	135	275	415	555	695		7.000,00				
% Água Adicionada	%	1,93%	3,93%	5,93%	7,93%	9,93%		P. Mat. Seco	Peso Água			
Peso Bruto Úmido	g	7.820	8.050	8.486	8.540	8.920		6.819	181			
Peos do Solo Úmido	g	3.695	3.965	4.411	4.208	4.206		Moldes				
Dens. Solo Úmido	g / m³	1.767	1.977	2.130	2.098	2.013		N°	Peso	Volume		
Dens. Solo Seco	g / m³	1.689	1.853	1.959	1.893	1.784		20	4.125	2.091		
Resultados:				Observações:								
H. Ótima	Dens. Máx	ISC	Expansão									
9,0 %	1.960	34,2	0,12									


Análise Gráfica

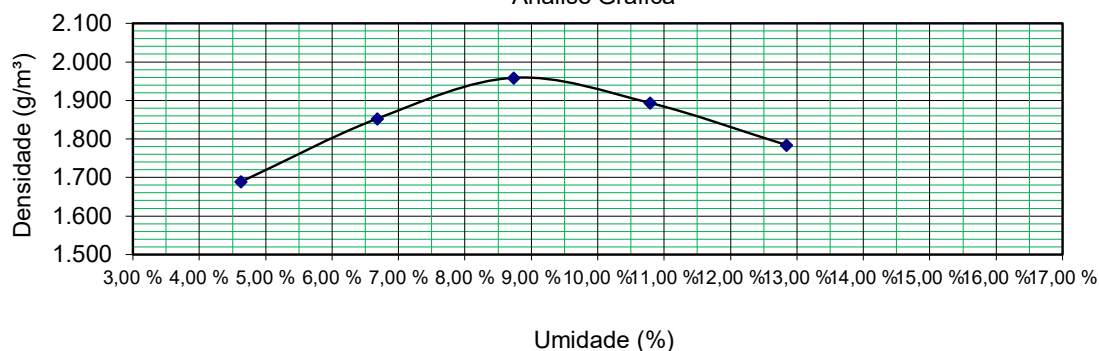

Índice de Suporte Califórnia

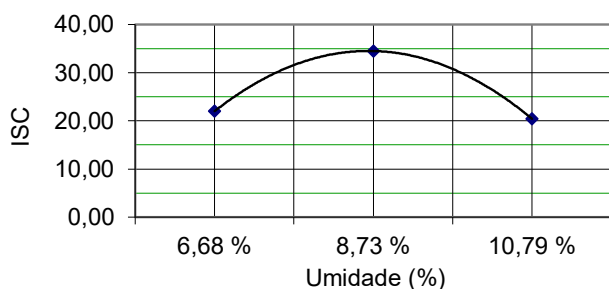

Expansão

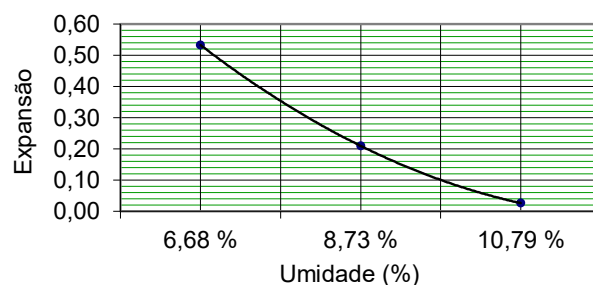



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE EXPANSÃO / I.S.C

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS


TRECHO						DATA:		
VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA						17/07/2025		
RODOVIA:			SUB-TRECHO				OPERADO	
BR : 174			KM 20,900				ADRIANO	
ESTACA:	LADO:	FURO:	PROFUNDIDADE:	GOLPES:	ESTUDO:			
0	L / E	10	0,15 1,10	26	SUB-BASE			
% MATERIAL RET. PEN. Nº 4		PROCTOR:			MATERIAL:			
29,00%		intermediario			Solo Laterítico Argiloso Vermelho			

ENSAIO DE EXPANSÃO NORMA DNER - ME 049/94


MOLDE Nº	66	ALTURA			114,5	MOLDE Nº	2	ALTURA			114,5	MOLDE Nº	27	ALTURA			114,5
DATA	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%		HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%			HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%		
17/07/25	10:00	1,00		0,00		10:00	1,00		0,00			10:00	1,00	0,00	0,00		
21/07/25	09:00	1,61	0,61	0,53		09:00	1,24	0,24	0,21			09:00	1,03	0,03	0,03		

ENSAIO DE I.S.C NORMA DNIT 172/2016 - ME


MOLDE Nº 66			K-PRENSA = 0,110			MOLDE Nº 2				MOLDE Nº 27			
PENETR. mm	TEMPO min	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %
0.63	0.5	45	4,90			75	8,20			30	3,30		
1.27	1.0	85	9,30			125	13,70			55	6,00		
1.90	1.5	110	12,10			160	17,60			95	10,40		
2.54	2.0	135	14,80	70	21,10	215	23,60	70	33,70	120	13,20	70	18,90
3.81	3.0	175	19,20			285	31,30			165	18,10		
5.08	4.0	210	23,10	105	22,00	330	36,20	105	34,50	195	21,40	105	20,40
6.35	5.0	240	26,40			395	43,40			230	25,30		
7.62	6.0	295	32,40			485	53,30			270	29,60		
8.89	7.0	350	38,40			560	61,50			320	35,10		
10.16	8.0	420	46,10			655	71,90			350	38,40		
12.70	10.0	498	54,70			785	86,20			385	42,30		

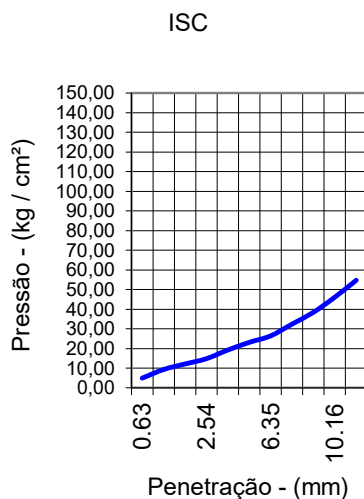

ISC = 22,00 %

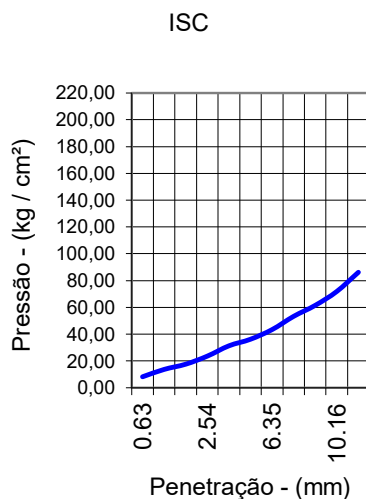

ISC = 34,50 %

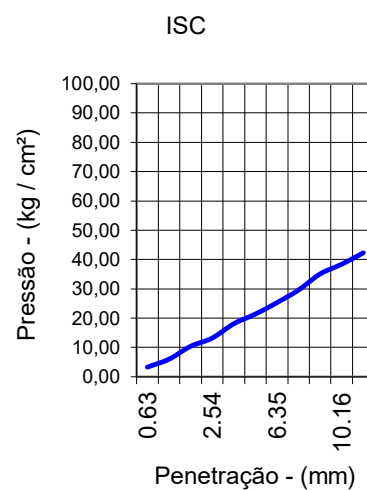

ISC = 20,40 %

RESUMO

DENSIDADE MÁXIMA:	1960	g / cm³	ISC :	34,22	%
ÚMIDADE ÓTIMA:	8,98	%	EXPANSÃO :	0,12	%



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda


**Análise Granulométrica NORMA DNER ME -080/94
(Simples)**

Rodovia:	BR : 174	Profundidade:	0,15 1,10
Trecho:	VICINAL 8 MARTIHIS PEREIRA	Furo :	10
Procedência:	ESTUDO DE JAZIDA	Estaca:	0
Camada:	SUB-BASE	OPERADO	ADRIANO
		Data:	17/07/25

UMIDADE HIDROSCÓPICA		DISCRIMINAÇÃO		AMOSTRA SECA	
				Total	Parcial
Cápsula (N°)	31	45	Cápsula (N°)	33	31
Peso Umido (g)	58,07	62,00	Peso Bruto Úmido (g)	2000,0	200,0
Peso Bruto Seco (g)	57,00	61,00	Peso Retido na # N° 10 (g)	771,18	
Peso da Água (g)	1,07	1,00	Peso Úmido Pass. na # N° 10 (g)	1228,82	
Peso da Cápsula (g)	19,11	20,59	Peso Seco Pass. na # N° 10 (g)	1197,20	
Peso do Solo Seco (g)	37,89	40,41	Peso da água (g)	31,62	
Umidade (%)	2,82	2,47	Peso da amostra Seca (g)	2 1968,4	3 194,8
Umidade Média (%)	2,6				


Peneiramento

Amostra Total	Peneiras		Peso Retido Parcial (g)	Peso que Passa Acumulado (g)	% que Passa Am.Total	FAIXA AASTHO		CONSTANTES
	Pol	mm				Mínimo	Máximo	
	2"	50,8	0,00	1968,4	100,0			K ₁ =100 = 0,051 2
	1 1/2"	38,1	0,00	1968,4	100,0			
	1"	25,4	135,11	1833,3	93,0			K ₂ = 4 = 0,313 3
	3/8"	9,5	288,45	1544,9	79,0			
	4	4,8	160,68	1384,2	71,0			
	10	2,0	186,94	1197,3	4 61,0			
Amostra Parcial	40	0,42	71,43	123,4	39,0			
	200	0,074	84,88	38,5	12,0			

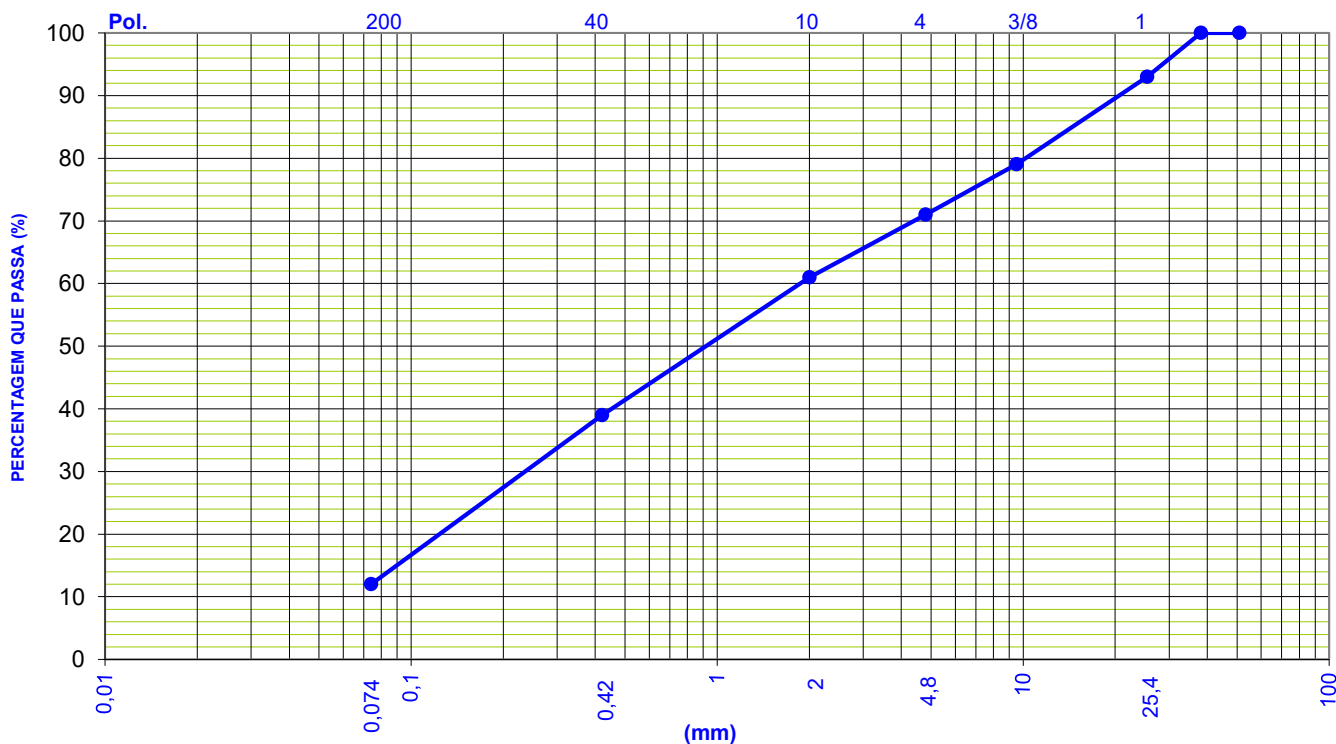**Resumo Granulometria (%)**

Pedregulho (> 4,8 mm)	29,0
Areia Grossa (4,8 - 2,0 mm)	10,0
Areia Média (2,0 - 0,42 mm)	22,0
Areia Fina (0,42 - 0,074 mm)	27,0
Passando (0,074 mm)	12,0
Total	100,0

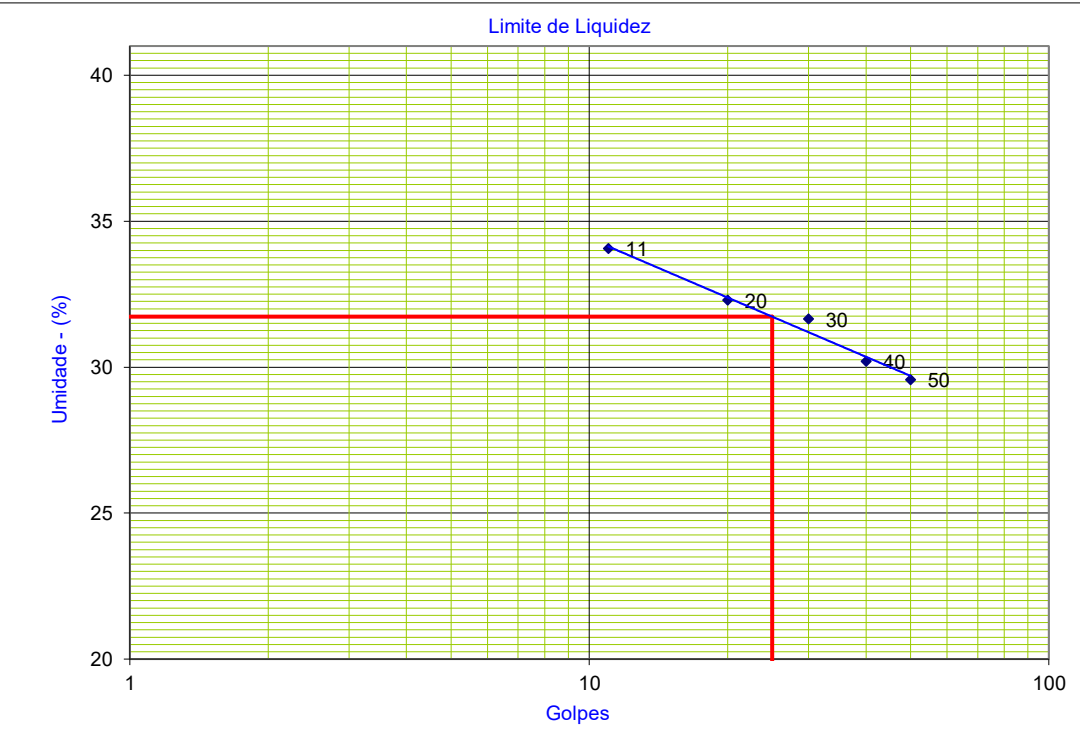

  MTEC CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA. Via Norte Construtora Ltda		LIMITES FÍSICOS  PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS					
Rodovia: RR 171		Profund.: 0,15 1,10		OPERADO ADRIANO			
Trecho: VICINAL 8 MARTIHIS PEREIRA		Furo : 10					
Procedência: ESTUDO DE JAZIDA		Estaca: 0					
Camada: SUB-BASE		Data: 18/07/2025		LADO L / E			
LIMITE DE LIQUIDEZ NORMA DNER ME - 122/94							
Cápsula	N.º	20	45	25	32	71	
Golpes	g	11	20	30	40	50	
Peso Bruto Úmido	g	14,32	14,77	12,06	14,72	10,70	
Peso Bruto Seco	g	12,29	12,71	10,49	12,79	9,52	
Peso da Cápsula	g	6,33	6,33	5,53	6,40	5,53	
Peso da Água	g	2,03	2,06	1,57	1,93	1,18	
Peso do Solo Seco	g	5,96	6,38	4,96	6,39	3,99	
Umidade	%	34,06	32,29	31,65	30,20	29,57	
LIMITE DE PLASTICIDADE NORMA DNER ME - 082/94							
Cápsula	N.º	23	61	60	55	08	
Peso Bruto Úmido	g	8,66	8,09	7,99	7,90	6,50	
Peso Bruto Seco	g	8,27	7,67	7,56	7,56	6,30	
Peso da Cápsula	g	6,43	5,68	5,54	5,81	5,33	
Peso da Água	g	0,39	0,42	0,43	0,34	0,20	
Peso do Solo Seco	g	1,84	1,99	2,02	1,75	0,97	
Umidade	%	21,20	21,11	21,29	19,43	20,62	
Índice de Plasticidade LL= 31,7% LP = 21,1% IP= 10,6%							

RELATÓRIO DE ENSAIO DE BASE COM 20% DE AREIA LAVADA RIO ANAÚA

PERIODO

JULHO 2025

**ALEX FABIAN
FERREIRA DA
SILVA**

Assinado de forma
digital por ALEX
FABIAN FERREIRA DA
SILVA
Dados: 2025.09.22
11:13:12 -04'00'



MTEC
CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA. Via Norte Construtora Ltda.



ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DNIT- 141/2022 - ES

E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS




Folha:

Única

Data:

15/07/2025

Rodovia: BR : 174		Trecho: VICINAL 8 MARTIHIS PEREIRA			Sub-trecho: KM 20,900			Registro: ESTUDO DE JAZIDA						
Estaca:		Furo: 1		Profundidade: 0,15 1,10		Material: Solo Laterítico Argiloso 20 % de Areia			BASE 20% DE AREIA LAVADA RIO ANAÚA					
% Mat. Ret. # N° 4: 71,00%		Próctor: MODIFICADO			Golpes: 55		Operador: GABRIEL		Lado L / E					
Item		Unid.	1	2	3	4	5	6	Umidade Higroscópica					
Cápsula N°		-							37	19				
Peso Bruto Úmido		g							82,69	77,68				
Peso Bruto Seco		g							81,53	76,52				
Peso da Água		g							1,16	1,16				
Peso da Cápsula		g							19,07	19,00				
Peso do Solo Seco		g							62,46	57,52				
Umidade		%							1,86%	2,02%				
Umidade calculada		%	3,5%	5,1%	6,6%	8,1%	9,7%		1,9%					
Água Total		g	243	348	453	558	663		Peso do Material					
Água Adicionada		g	110	215	320	425	530		7.000,00					
% Água Adicionada		%	1,57%	3,07%	4,57%	6,07%	7,57%		P. Mat. Seco	Peso Água				
Peso Bruto Úmido		g	8.300	8.350	8.795	8.820	9.010		6.867	133				
Peos do Solo Úmido		g	3.900	4.265	4.655	4.469	4.296		Moldes					
Dens. Solo Úmido		g / m³	1.867	2.126	2.272	2.228	2.056		N°	Peso	Volume			
Dens. Solo Seco		g / m³	1.803	2.024	2.131	2.060	1.875		34	4.400	2.089			
Resultados:				Observações:								31	4.085	2.006
												3	4.140	2.049
H. Ótima	Dens. Máx	ISC	Expansão	40	4.351	2.006								
6,8 %	2.132	82,2	0,10	42	4.714	2.089								

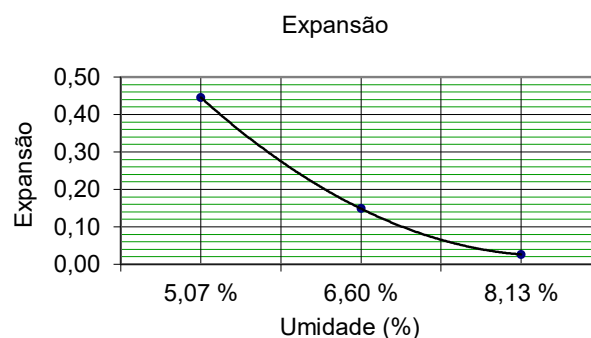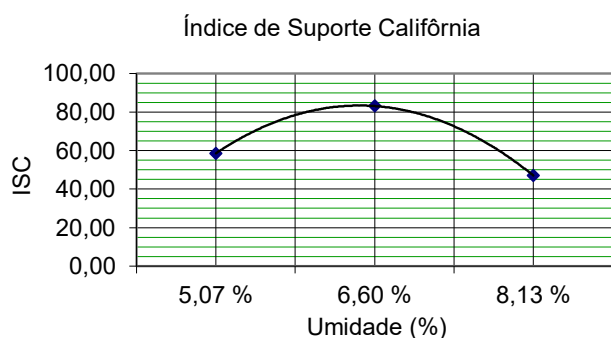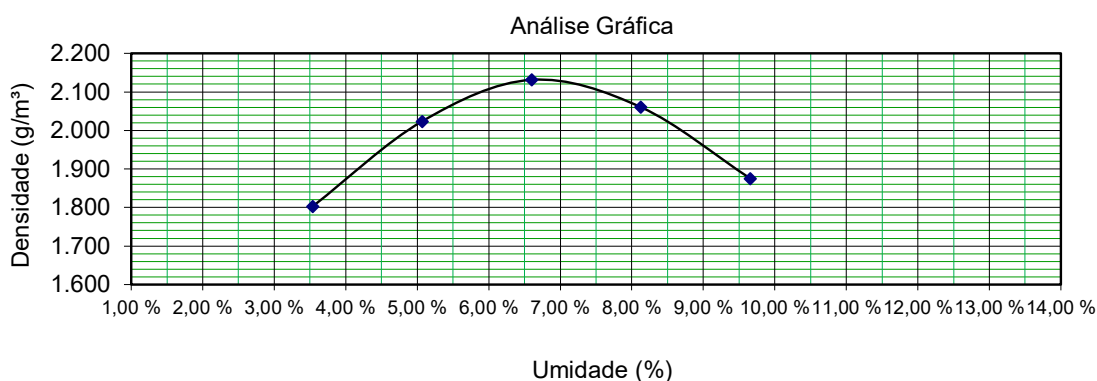



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE EXPANSÃO / I.S.C



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS

TRECHO:					DATA:	
VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA					15/07/2025	
RODOVIA:		SUB-TRECHO:			OPERADO	
BR : 174		KM 20,900			GABRIEL	
ESTACA:	LADO:	FURO:	PROFUNDIDADE:	GOLPES:	ESTUDO:	
0	L / E	1	0,15 1,10	55	BASE 20% DE AREIA	
% MATERIAL RET. PEN. Nº 4		PROCTOR:		MATERIAL:		
71,00%		MODIFICADO		Solo Laterítico Argiloso 20 % de Areia		

ENSAIO DE EXPANSÃO NORMA DNER - ME 049/94

MOLDE Nº	31	ALTURA			114,5	MOLDE Nº	3	ALTURA			114,5	MOLDE Nº	40	ALTURA			114,5
DATA	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%		HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%			HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%		
15/07/25	10:00	1,00		0,00		10:00	1,00		0,00			10:00	1,00	0,00	0,00		
19/07/25	09:00	1,51	0,51	0,45		09:00	1,17	0,17	0,15			09:00	1,03	0,03	0,03		




ENSAIO DE I.S.C NORMA DNIT 172/2016 - ME

MOLDE Nº 31			K-PRENSA = 0,110			MOLDE Nº 3				MOLDE Nº 40			
PENETR. mm	TEMPO min	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %
0.63	0.5	72	7,90			140	15,40			50	5,50		
1.27	1.0	140	15,40			250	27,50			110	12,10		
1.90	1.5	230	25,30			375	41,20			200	22,00		
2.54	2.0	310	34,00	70	48,60	530	58,20	70	83,10	280	30,70	70	43,90
3.81	3.0	420	46,10			635	69,70			370	40,60		
5.08	4.0	560	61,50	105	58,60	790	86,70	105	82,60	450	49,40	105	47,00
6.35	5.0	650	71,40			920	101,00			540	59,30		
7.62	6.0	740	81,30			1020	112,00			670	73,60		
8.89	7.0	880	96,60			1130	124,10			760	83,40		
10.16	8.0	950	104,30			1240	136,20			870	95,50		
12.70	10.0	1050	115,30			1350	148,20			960	105,40		




ISC

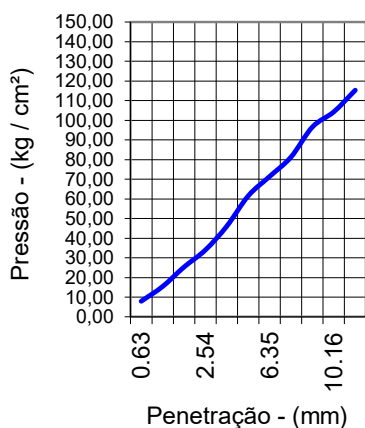


ISC = 58,60 %

ISC

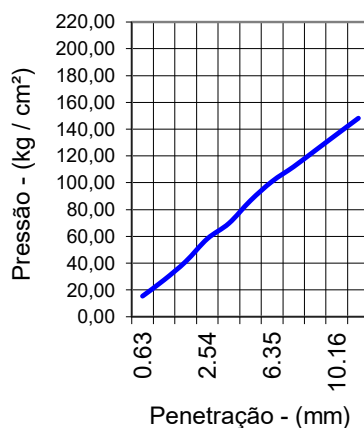

ISC = 83,10 %

ISC

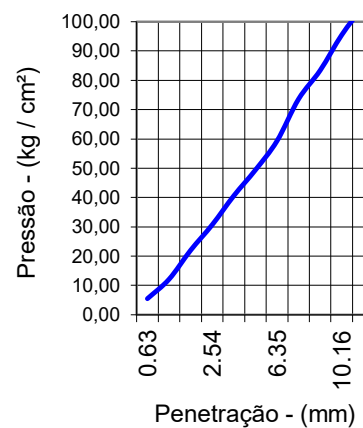

ISC = 47,00 %

RESUMO

DENSIDADE MÁXIMA: 2132 g / cm³	ISC : 82,18 %
ÚMIDADE ÓTIMA: 6,75 %	EXPANSÃO : 0,10 %



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA. Via Norte Construtora Ltda


**Análise Granulométrica NORMA DNER ME -080/94 (Simples)**PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS

Rodovia:	BR : 174	Profundidade:	0,15 1,10
Trecho:	VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA	Furo :	1
Procedência:	ESTUDO DE JAZIDA	Estaca:	0
Camada:	BASE 20% DE AREIA	OPERADO	Data: 15/07/25

UMIDADE HIDROSCÓPICA		DISCRIMINAÇÃO		AMOSTRA SECA	
				Total	Parcial
Cápsula (N°)	37	19	Cápsula (N°)	31	11
Peso Umido (g)	82,69	77,68	Peso Bruto Úmido (g)	2000,0	200,0
Peso Bruto Seco (g)	81,53	76,52	Peso Retido na # N° 10 (g)	1574,82	
Peso da Água (g)	1,16	1,16	Peso Úmido Pass. na # N° 10 (g)	425,18	
Peso da Cápsula (g)	19,07	19,00	Peso Seco Pass. na # N° 10 (g)	417,10	
Peso do Solo Seco (g)	62,46	57,52	Peso da água (g)	8,08	
Umidade (%)	1,86	2,02	Peso da amostra Seca (g)	2 1991,9	3 196,2
Umidade Média (%)	1,9				



Peneiramento

Amostra Total	Peneiras		Peso Retido Parcial (g)	Peso que Passa Acumulado (g)	% que Passa Am.Total	FAIXA AASTHO		CONSTANTES
	Pol	mm				Mínimo	Máximo	
	2"	50,8	0,00	1991,9	100,0			K ₁ =100 = <u>0,050</u> 2
	1 1/2"	38,1	0,00	1991,9	100,0			K ₂ = 4 = <u>0,107</u> 3 
	1"	25,4	120,45	1871,5	94,0			
	3/8"	9,5	754,52	1117,0	56,0			
	4	4,8	538,32	578,7	29,0			
	10	2,0	161,53	417,2	4 21,0			
Amostra Parcial	40	0,42	24,53	171,7	18,0			
	200	0,074	83,35	88,4	9,0			

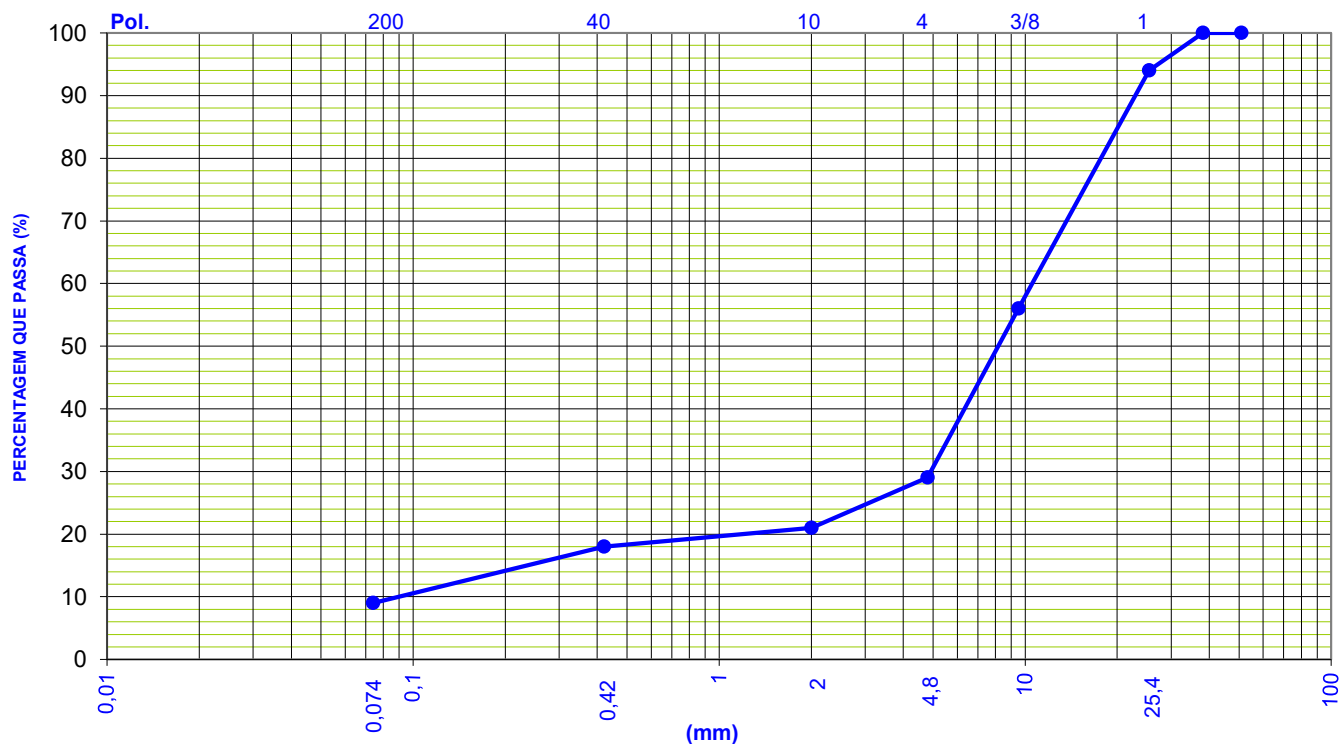**Resumo Granulometria (%)**

Pedregulho (> 4,8 mm)	71,0
Areia Grossa (4,8 - 2,0 mm)	8,0
Areia Média (2,0 - 0,42 mm)	3,0
Areia Fina (0,42 - 0,074 mm)	9,0
Passando (0,074 mm)	9,0
Total	100,0

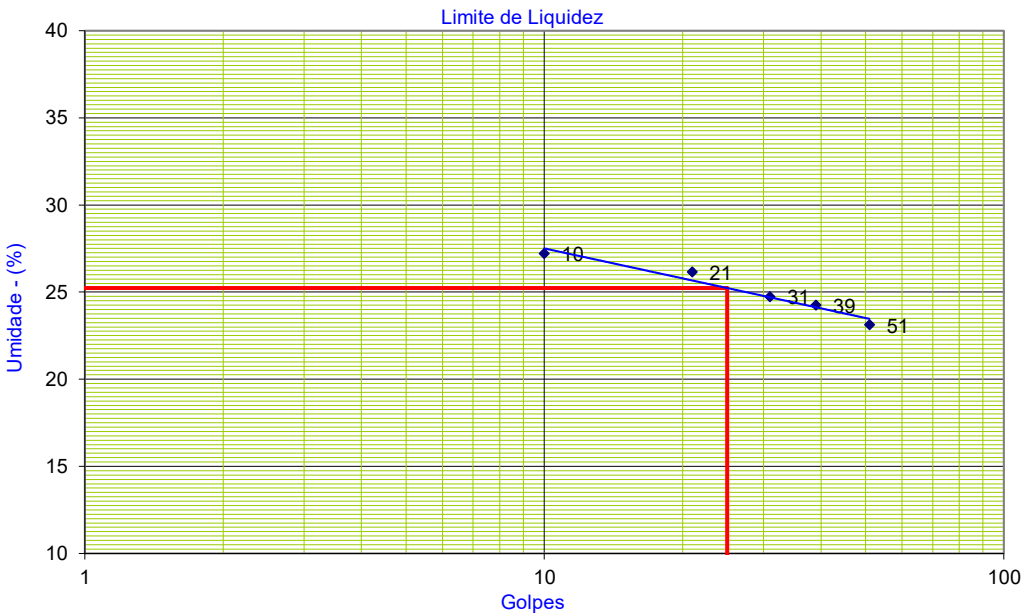

  MTEC CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda		LIMITES FÍSICOS  PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS					
Rodovia: BR : 174		Profund.: 0,15 1,10		OPERADO GABRIEL			
Trecho: VICINAL 8 MARTIHIS PEREIRA		Furo : 1					
Procedência: ESTUDO DE JAZIDA		Estaca: 0					
Camada: BASE 20% DE AREIA		Data: 16/07/2025		LADO L / E			
LIMITE DE LIQUIDEZ NORMA DNER ME - 122/94							
Cápsula	N.º	22	25	15	27	39	
Golpes	g	10	21	31	39	51	
Peso Bruto Úmido	g	25,00	26,48	26,27	25,65	26,40	
Peso Bruto Seco	g	20,91	22,26	22,53	21,82	22,78	
Peso da Cápsula	g	5,88	6,12	7,41	6,02	7,12	
Peso da Água	g	4,09	4,22	3,74	3,83	3,62	
Peso do Solo Seco	g	15,03	16,14	15,12	15,80	15,66	
Umidade	%	27,21	26,15	24,74	24,24	23,12	
LIMITE DE PLASTICIDADE NORMA DNER ME - 082/94							
Cápsula	N.º	24	73	20	08	21	
Peso Bruto Úmido	g	7,46	9,08	8,33	9,34	7,97	
Peso Bruto Seco	g	7,16	8,73	7,97	9,03	7,62	
Peso da Cápsula	g	5,66	7,02	6,16	7,44	5,91	
Peso da Água	g	0,30	0,35	0,36	0,31	0,35	
Peso do Solo Seco	g	1,50	1,71	1,81	1,59	1,71	
Umidade	%	20,00	20,47	19,89	19,50	20,47	
Índice de Plasticidade LL= 25,2% LP = 20,1% IP= 5,1%							



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA. Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DNIT- 141/2022 - ES

E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

Folha:


Única

Data:


15/07/2025

Rodovia: BR : 174		Trecho: VICINAL 8 MARTIHIS PEREIRA		Sub-trecho: KM 20,900			Registro: ESTUDO DE JAZIDA		
Estaca:	Furo: 2	Profundidade: 0,15 1,10		Material: Solo Laterítico Argiloso 20 % de Areia				BASE 20% DE AREIA LAVADA RIO ANAÚA	
% Mat. Ret. # Nº 4: 59,00%	Próctor: MODIFICADO		Golpes: 55		Operador: ADRIANO		Lado L / E		
Item	Unid.	1	2	3	4	5	6	Umidade Higroscópica	
Cápsula Nº	-							45	90
Peso Bruto Úmido	g							58,10	62,10
Peso Bruto Seco	g							57,00	61,00
Peso da Água	g							1,10	1,10
Peso da Cápsula	g							19,11	20,59
Peso do Solo Seco	g							37,89	40,41
Umidade	%							2,90%	2,72%
Umidade calculada	%	4,0%	5,5%	7,1%	8,6%	10,2%		2,8%	
Água Total	g	271	376	481	586	691		Peso do Material	
Água Adicionada	g	80	185	290	395	500		7.000,00	
% Água Adicionada	%	1,14%	2,64%	4,14%	5,64%	7,14%		P. Mat. Seco	Peso Água
Peso Bruto Úmido	g	8.150	8.470	8.946	8.840	9.230		6.809	191
Peos do Solo Úmido	g	4.025	4.385	4.906	4.642	4.516		Moldes	
Dens. Solo Úmido	g / m³	1.925	2.186	2.321	2.314	2.162		Nº	Peso
Dens. Solo Seco	g / m³	1.851	2.071	2.167	2.131	1.962		20	4.125
Resultados:		Observações:						Volume	
								31	4.085
								14	4.040
								3	4.198
H. Ótima	Dens. Máx	ISC	Expansão					42	4.714
7,4 %	2.171	83,7	0,11						


Análise Gráfica

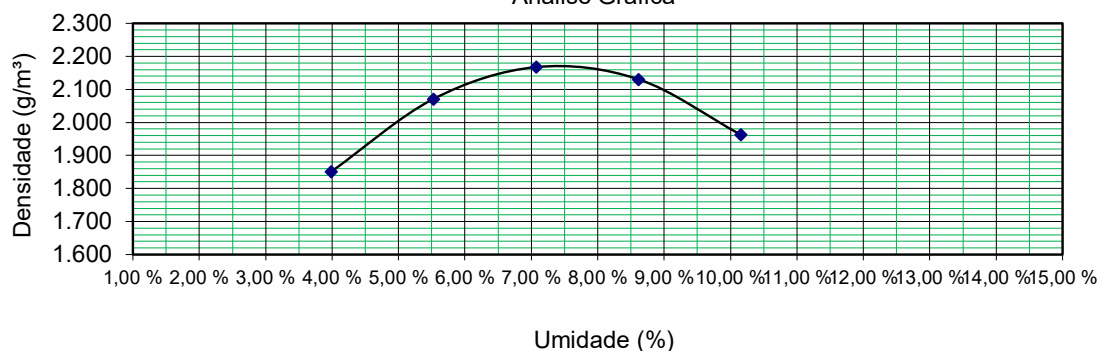

Índice de Suporte Califórnia

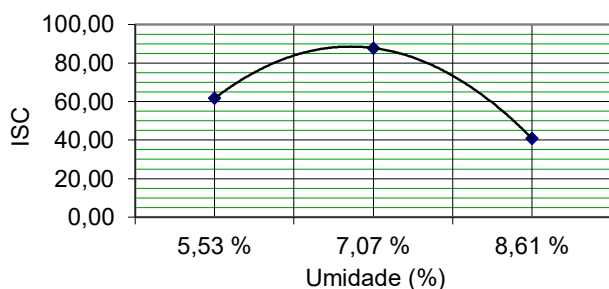

Expansão

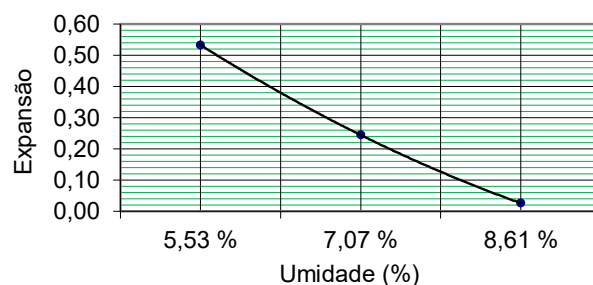



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE EXPANSÃO / I.S.C



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS




TRECHO:					DATA:	
VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA					15/07/2025	
RODOVIA:		SUB-TRECHO:			OPERADO	
BR : 174		KM 20,900			ADRIANO	
ESTACA:	LADO:	FURO:	PROFUNDIDADE:	GOLPES:	ESTUDO:	
0	L / E	2	0,15 1,10	55	BASE 20% DE AREIA	
% MATERIAL RET. PEN. Nº 4		PROCTOR:		MATERIAL:		
59,00%		MODIFICADO		Solo Laterítico Argiloso 20 % de Areia		

ENSAIO DE EXPANSÃO NORMA DNER - ME 049/94

MOLDE Nº 31		ALTURA 114,5			MOLDE Nº 14		ALTURA 114,5			MOLDE Nº 3		ALTURA 114,5	
DATA	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	
15/07/25	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00	0,00	0,00	
19/07/25	09:00	1,61	0,61	0,53	09:00	1,28	0,28	0,24	09:00	1,03	0,03	0,03	

ENSAIO DE I.S.C NORMA DNIT 172/2016 - ME

MOLDE Nº 31			K-PRENSA = 0,110				MOLDE Nº 14				MOLDE Nº 3			
PENETR. mm	TEMPO min	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	
0.63	0.5	75	8,20			155	17,00			50	5,50			
1.27	1.0	145	15,90			285	31,30			75	8,20			
1.90	1.5	240	26,40			410	45,00			125	13,70			
2.54	2.0	370	40,60	70	58,00	549	60,30	70	86,10	210	23,10	70	33,00	
3.81	3.0	485	53,30			720	79,10			285	31,30			
5.08	4.0	590	64,80	105	61,70	840	92,20	105	87,80	390	42,80	105	40,80	
6.35	5.0	675	74,10			980	107,60			486	53,40			
7.62	6.0	795	87,30			1075	118,00			570	62,60			
8.89	7.0	870	95,50			1150	126,30			685	75,20			
10.16	8.0	990	108,70			1250	137,30			790	86,70			
12.70	10.0	1075	118,00			1345	147,70			875	96,10			

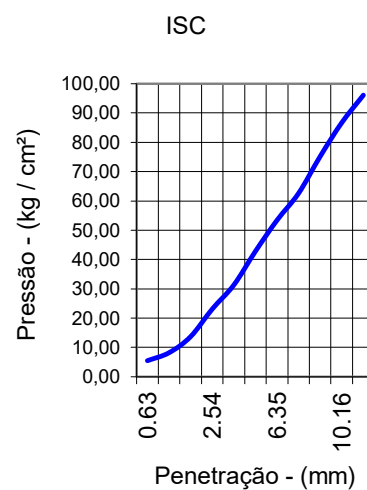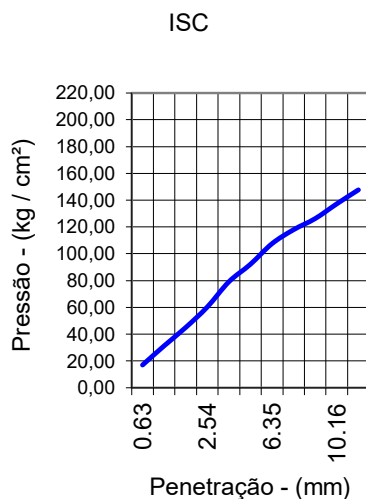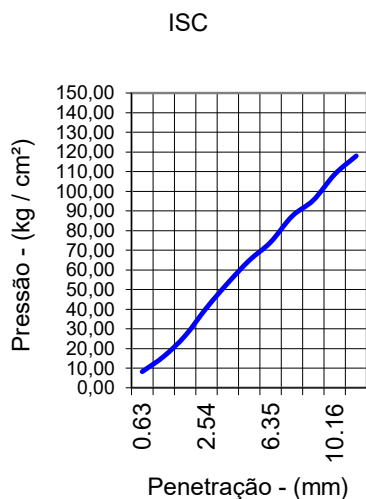

RESUMO


DENSIDADE MÁXIMA: 2171 g / cm³	ISC : 83,67 %
ÚMIDADE ÓTIMA: 7,41 %	EXPANSÃO : 0,11 %

Rodovia:	BR : 174	Profundidade:	0,15 1,10
Trecho:	VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA	Furo :	2
Procedência:	ESTUDO DE JAZIDA	Estaca:	0
Camada:	BASE 20% DE AREIA	OPERADO	ADRIANO
		Data:	15/07/25

UMIDADE HIDROSCÓPICA		DISCRIMINAÇÃO		AMOSTRA SECA	
				Total	Parcial
Cápsula (N°)	45	90	Cápsula (N°)	33	31
Peso Umido (g)	58,10	62,10	Peso Bruto Úmido (g)	2000,0	200,0
Peso Bruto Seco (g)	57,00	61,00	Peso Retido na # N° 10 (g)	1318,18	
Peso da Água (g)	1,10	1,10	Peso Úmido Pass. na # N° 10 (g)	681,82	
Peso da Cápsula (g)	19,11	20,59	Peso Seco Pass. na # N° 10 (g)	663,20	
Peso do Solo Seco (g)	37,89	40,41	Peso da água (g)	18,62	
Umidade (%)	2,90	2,72	Peso da amostra Seca (g)	2 1981,4	3 194,5
Umidade Média (%)	2,8				

Peneiramento



Amostra Total	Peneiras		Peso Retido Parcial (g)	Peso que Passa Acumulado (g)	% que Passa Am.Total	FAIXA AASTHO		CONSTANTES
	Pol	mm				Mínimo	Máximo	
	2"	50,8	0,00	1981,4	100,0			K ₁ =100 = 0,050 2
	1 1/2"	38,1	0,00	1981,4	100,0			
	1"	25,4	125,11	1856,3	93,0			K ₂ = 4 = 0,170 3
	3/8"	9,5	648,45	1207,9	60,0			
	4	4,8	397,68	810,2	41,0			
	10	2,0	146,94	663,3	33,0	4		
Amostra Parcial	40	0,42	51,43	143,1	24,0			
	200	0,074	85,88	57,2	10,0			

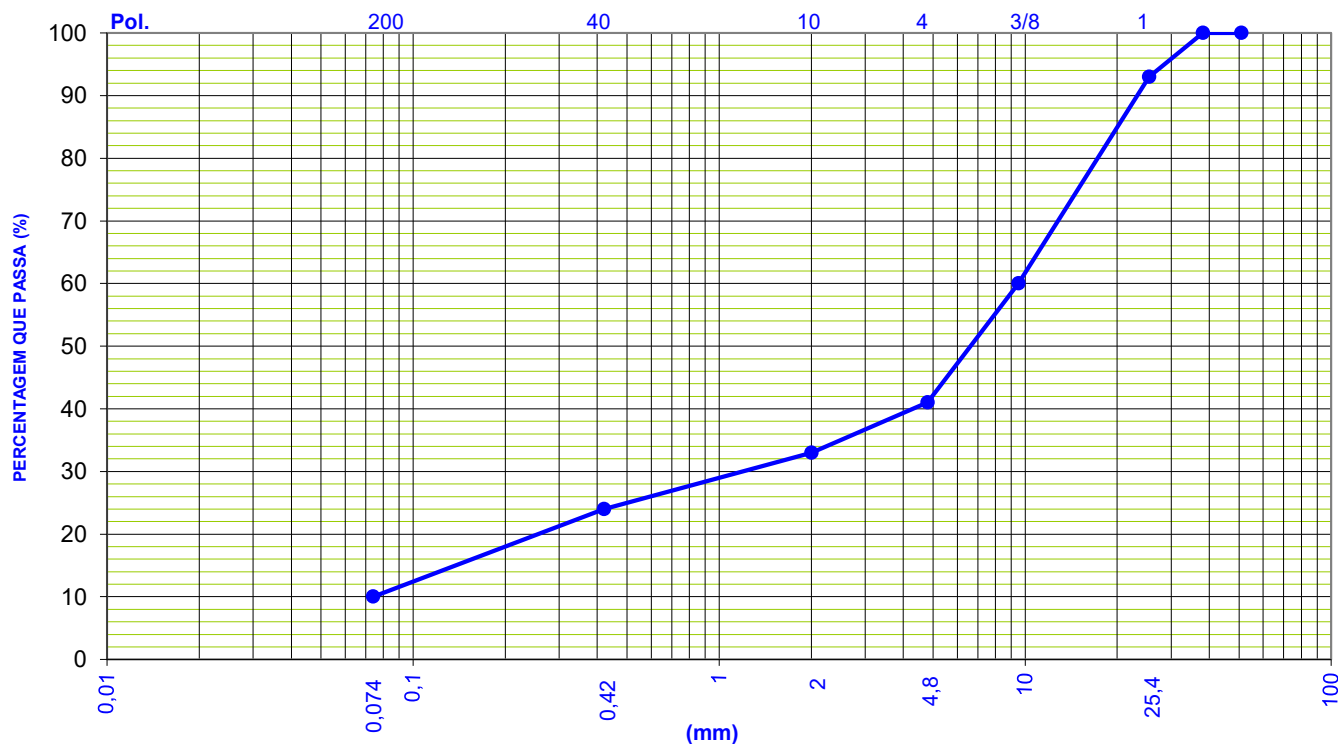

Resumo Granulometria (%)

Pedregulho (> 4,8 mm)	59,0
Areia Grossa (4,8 - 2,0 mm)	8,0
Areia Média (2,0 - 0,42 mm)	9,0
Areia Fina (0,42 - 0,074 mm)	14,0
Passando (0,074 mm)	10,0
Total	100,0

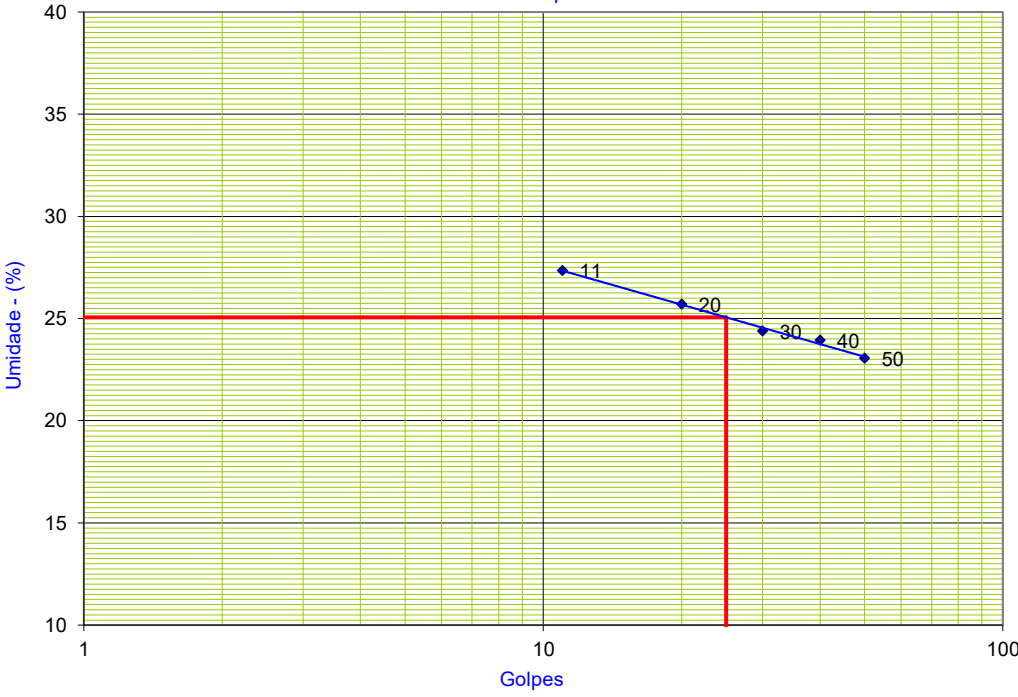

  MTEC CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA. Via Norte Construtora Ltda		LIMITES FÍSICOS  PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS					
Rodovia: BR : 174		Profund.: 0,15 1,10		OPERADO ADRIANO			
Trecho: VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA		Furo : 2					
Procedência: ESTUDO DE JAZIDA		Estaca: 0					
Camada: BASE 20% DE AREIA		Data: 16/07/2025		LADO L / E			
LIMITE DE LIQUIDEZ NORMA DNER ME - 122/94							
Cápsula	N.º	09	14	27	81	89	
Golpes	g	11	20	30	40	50	
Peso Bruto Úmido	g	13,92	14,35	11,70	14,32	10,44	
Peso Bruto Seco	g	12,29	12,71	10,49	12,79	9,52	
Peso da Cápsula	g	6,33	6,33	5,53	6,40	5,53	
Peso da Água	g	1,63	1,64	1,21	1,53	0,92	
Peso do Solo Seco	g	5,96	6,38	4,96	6,39	3,99	
Umidade	%	27,35	25,71	24,40	23,94	23,06	
LIMITE DE PLASTICIDADE NORMA DNER ME - 082/94							
Cápsula	N.º	01	36	60	64	65	
Peso Bruto Úmido	g	8,63	8,06	7,95	7,89	6,48	
Peso Bruto Seco	g	8,27	7,67	7,56	7,56	6,30	
Peso da Cápsula	g	6,43	5,68	5,54	5,81	5,33	
Peso da Água	g	0,36	0,39	0,39	0,33	0,18	
Peso do Solo Seco	g	1,84	1,99	2,02	1,75	0,97	
Umidade	%	19,57	19,60	19,31	18,86	18,56	
Índice de Plasticidade LL= 25,1% LP = 19,2% IP= 5,9%		Limite de Liquidez 					



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA. Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DNIT- 141/2025 - ES

E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS

Folha:


Única

Data:


15/07/2025

Rodovia: BR : 174		Trecho: VICINAL 8 MARTIHIS PEREIRA		Sub-trecho: KM 20,900			Registro: ESTUDO DE JAZIDA			
Estaca:	Furo: 3	Profundidade: 0,15 1,10		Material: Solo Laterítico Argiloso 20 % de Areia			BASE 20% DE AREIA LAVADA RIO ANAÚA			
% Mat. Ret. # Nº 4: 62,00%	Próctor: MODIFICADO		Golpes: 55		Operador: ADRIANO		Lado L / E			
Item	Unid.	1	2	3	4	5	6	Umidade Higroscópica		
Cápsula Nº	-							98	32	
Peso Bruto Úmido	g							55,31	67,27	
Peso Bruto Seco	g							54,00	66,03	
Peso da Água	g							1,31	1,24	
Peso da Cápsula	g							19,11	20,59	
Peso do Solo Seco	g							34,89	45,44	
Umidade	%							3,75%	2,73%	
Umidade calculada	%	4,4%	6,0%	7,5%	9,1%	10,6%		3,2%		
Água Total	g	300	405	510	615	720		Peso do Material		
Água Adicionada	g	80	185	290	395	500		7.000,00		
% Água Adicionada	%	1,14%	2,64%	4,14%	5,64%	7,14%		P. Mat. Seco	Peso Água	
Peso Bruto Úmido	g	8.380	8.520	9.710	8.720	9.150		6.780	220	
Peos do Solo Úmido	g	3.980	4.435	4.902	4.595	4.436		Moldes		
Dens. Solo Úmido	g / m³	1.905	2.211	2.332	2.291	2.124		Nº	Peso	Volume
Dens. Solo Seco	g / m³	1.825	2.086	2.169	2.100	1.920		34	4.400	2.089
Resultados:				Observações:						
H. Ótima	Dens. Máx	ISC	Expansão	23	4.085	2.006				
7,6 %	2.169	88,6	0,14	50	4.808	2.102				
				71	4.125	2.006				
				42	4.714	2.089				


Análise Gráfica

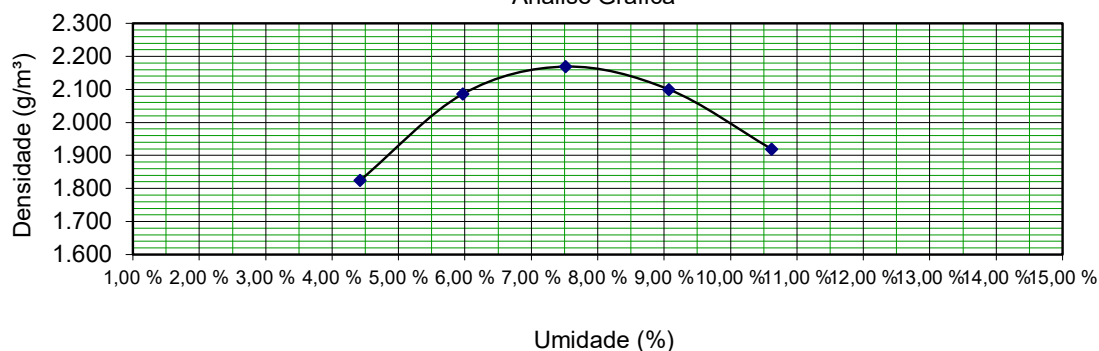

Índice de Suporte Califórnia

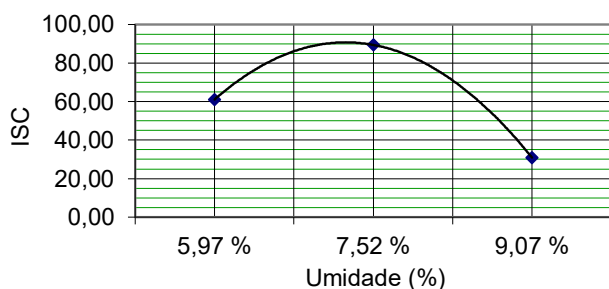

Expansão

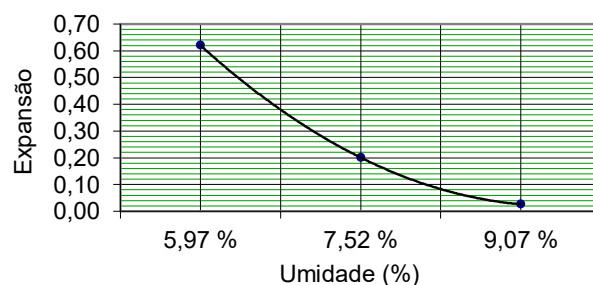



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE EXPANSÃO / I.S.C

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS

TRECHO:

VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA

DATA:

15/07/2025

RODOVIA:

BR : 174

SUB-TRECHO:

KM 20,900

OPERADO

ADRIANO

ESTACA:

0

LADO:

L / E

FURO:

3

PROFUNDIDADE:

0,15 1,10

GOLPES:

55

ESTUDO:

BASE 20% DE AREIA

% MATERIAL RET. PEN. Nº 4

62,00%

PROCTOR:

MODIFICADO

MATERIAL:

Solo Laterítico Argiloso 20 % de Areia

ENSAIO DE EXPANSÃO NORMA DNER - ME 049/94

MOLDE Nº 23		ALTURA 114,5			MOLDE Nº 50		ALTURA 114,5		MOLDE Nº 71		ALTURA 114,5	
DATA	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%
15/07/25	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00	0,00	0,00
												
19/07/25	09:00	1,71	0,71	0,62	09:00	1,23	0,23	0,20	09:00	1,03	0,03	0,03




ENSAIO DE I.S.C NORMA DNIT 172/2016 - ME

MOLDE Nº			23			K-PRESSA =			0,110	MOLDE Nº				50				MOLDE Nº				71			
PENETR.	TEMPO	LEITURA	PRESSÃO	PRES. Padr	ISC	LEITURA	PRESSÃO	PRES. Padr	ISC	LEITURA	PRESSÃO	PRES. Padr	ISC	LEITURA	PRESSÃO	PRES. Padr	ISC	LEITURA	PRESSÃO	PRES. Padr	ISC				
mm	min	EXTENSOM.	kg/Cm²	kg/Cm²	%	EXTENSOM.	kg/Cm²	kg/Cm²	%	EXTENSOM.	kg/Cm²	kg/Cm²	%	EXTENSOM.	kg/Cm²	kg/Cm²	%	EXTENSOM.	kg/Cm²	kg/Cm²	%				
0.63	0.5	80	8,80			155	17,00			50	5,50														
1.27	1.0	165	18,10			250	27,50			90	9,90														
1.90	1.5	230	25,30			360	39,50			155	17,00														
2.54	2.0	360	39,50	70	56,40	570	62,60	70	89,40	195	21,40	70	30,60												
3.81	3.0	485	53,30			675	74,10			240	26,40														
5.08	4.0	585	64,20	105	61,10	830	91,10	105	86,80	295	32,40	105	30,90												
6.35	5.0	690	75,80			890	97,70			360	39,50														
7.62	6.0	750	82,40			975	107,10			460	50,50														
8.89	7.0	860	94,40			1060	116,40			550	60,40														
10.16	8.0	940	103,20			1155	126,80			620	68,10														
12.70	10.0	1065	116,90			1230	135,10			730	80,20														






ISC

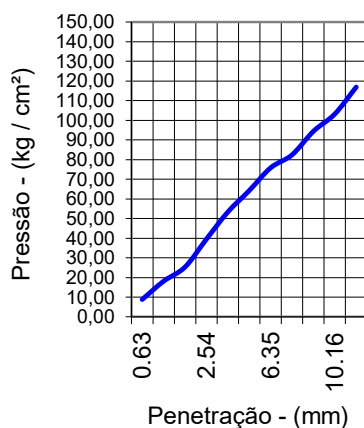


ISC = 61,10 %

ISC

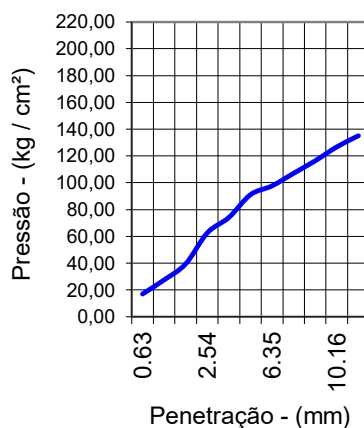

ISC = 89,40 %

ISC

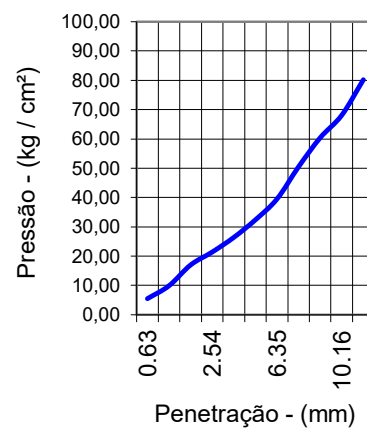

ISC = 30,90 %

RESUMO

DENSIDADE MÁXIMA: 2169 g / cm³

ISC : 88,62 %

ÚMIDADE ÓTIMA: 7,59 %

EXPANSÃO : 0,14 %



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



Análise Granulométrica NORMA DNER ME -080/94 (Simples)




PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

Rodovia:	BR : 174	Profundidade:	0,15 1,10
Trecho:	VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA	Furo :	3
Procedência:	ESTUDO DE JAZIDA	Estaca:	0
Camada:	BASE 20% DE AREIA	Operado	ADRIANO
		Data:	15/07/25

UMIDADE HIDROSCÓPICA		DISCRIMINAÇÃO		AMOSTRA SECA	
				Total	Parcial
Cápsula (N°)	98	32	Cápsula (N°)	31	11
Peso Umido (g)	55,31	67,27	Peso Bruto Úmido (g)	2000,0	200,0
Peso Bruto Seco (g)	54,00	66,03	Peso Retido na # N° 10 (g)	1334,53	
Peso da Água (g)	1,31	1,24	Peso Úmido Pass. na # N° 10 (g)	665,47	
Peso da Cápsula (g)	19,11	20,59	Peso Seco Pass. na # N° 10 (g)	644,60	
Peso do Solo Seco (g)	34,89	45,44	Peso da água (g)	20,87	
Umidade (%)	3,75	2,73	Peso da amostra Seca (g)	2	3
Umidade Média (%)	3,2			1979,1	193,7

Peneiramento

Amostra Total	Peneiras		Peso Retido Parcial (g)	Peso que Passa Acumulado (g)	% que Passa Am.Total	FAIXA AASTHO		CONSTANTES
	Pol	mm				Mínimo	Máximo	
	2"	50,8	0,00	1979,1	100,0			K ₁ =100 = 0,051 2
	1 1/2"	38,1	0,00	1979,1	100,0			
	1"	25,4	85,64	1893,5	97,0			K ₂ = 4 = 0,170 3
	3/8"	9,5	675,91	1217,6	62,0			
	4	4,8	465,23	752,4	38,0			
	10	2,0	107,75	644,7	33,0			
	40	0,42	68,91	124,8	21,0			
Amostra Parcial	200	0,074	78,85	46,0	8,0			

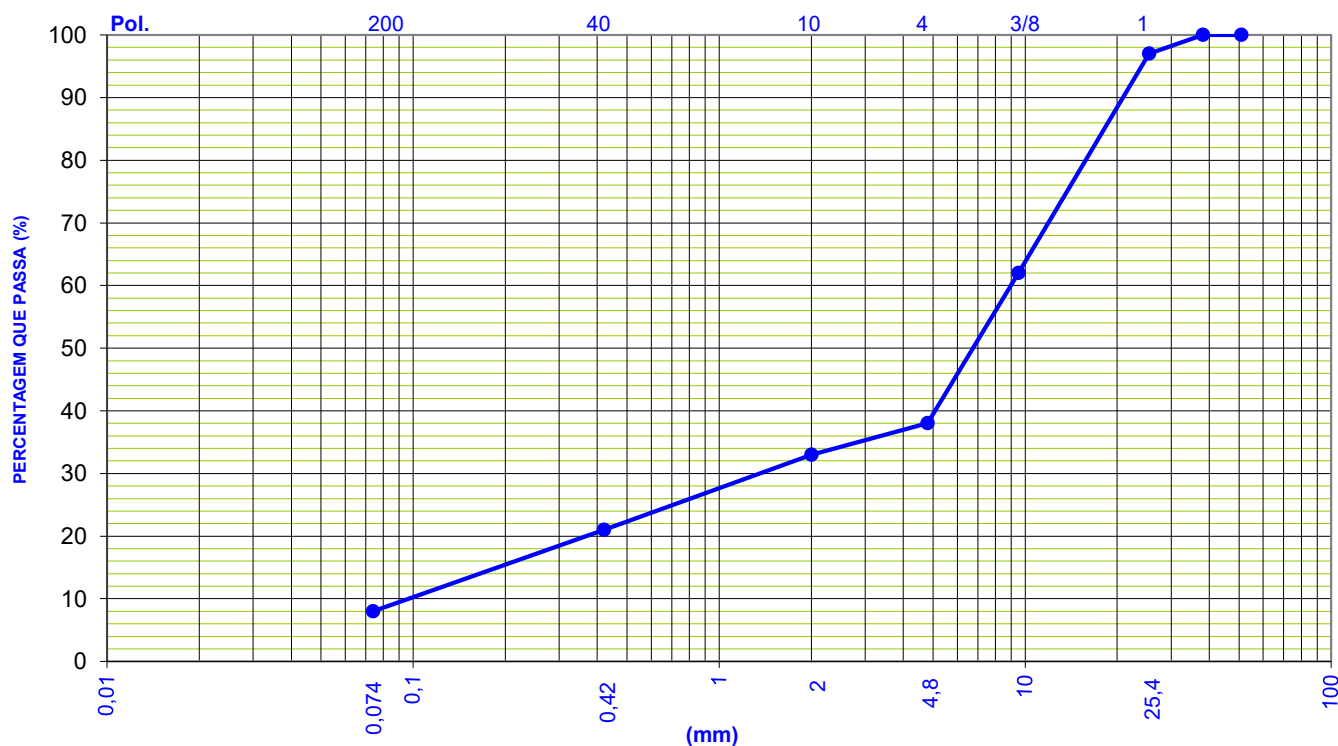

Resumo Granulometria (%)

Pedregulho (> 4,8 mm)	62,0
Areia Grossa (4,8 - 2,0 mm)	5,0
Areia Média (2,0 - 0,42 mm)	12,0
Areia Fina (0,42 - 0,074 mm)	13,0
Passando (0,074 mm)	8,0
Total	100,0





CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



LIMITES FÍSICOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

Rodovia: BR : 174

Profund.: 0,15 1,10

OPERADO ADRIANO

Trecho: VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA

Furo : 3

Procedência: ESTUDO DE JAZIDA

Estaca: 0

Camada: BASE 20% DE AREIA

Data: 16/07/2025

LADO L / E

LIMITE DE LIQUEDEZ NORMA DNER ME - 122/94

Cápsula	N.º	31	95	85	77	41
Golpes	g	10	20	29	40	50
Peso Bruto Úmido	g	24,45	34,00	20,35	23,68	24,75
Peso Bruto Seco	g	20,43	28,30	17,42	20,19	21,14
Peso da Cápsula	g	5,84	6,33	5,71	5,45	5,66
Peso da Água	g	4,02	5,70	2,93	3,49	3,61
Peso do Solo Seco	g	14,59	21,97	11,71	14,74	15,48
Umidade	%	27,55	25,94	25,02	23,68	23,32



LIMITE DE PLASTICIDADE NORMA DNER ME - 082/94

Cápsula	N.º	10	03	18	54	32
Peso Bruto Úmido	g	8,13	8,11	7,70	7,31	7,57
Peso Bruto Seco	g	7,80	7,75	7,34	7,01	7,28
Peso da Cápsula	g	6,15	5,96	5,61	5,52	5,80
Peso da Água	g	0,33	0,36	0,36	0,30	0,29
Peso do Solo Seco	g	1,65	1,79	1,73	1,49	1,48
Umidade	%	20,00	20,11	20,81	20,13	19,59




Índice de Plasticidade




LL= 25,2%

LP = 20,1%

IP= 5,1%

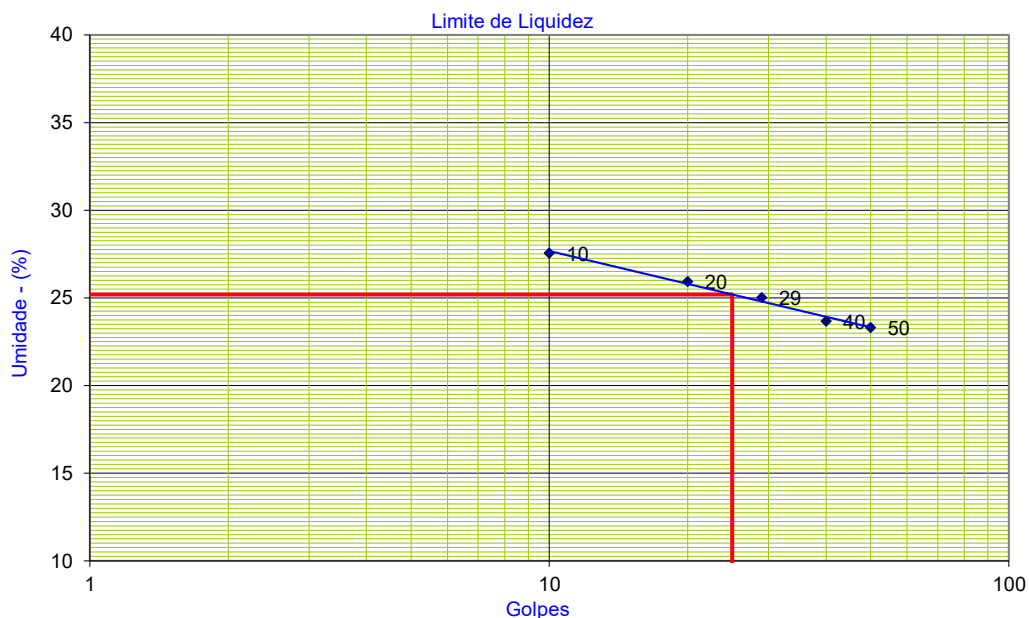

Rodovia:		BR : 174		Trecho:		VICINAL 8 MARTIHIS PEREIRA		Sub-trecho:		KM 20,900		Registro:		ESTUDO DE JAZIDA									
Estaca:		Furo:		4		Profundidade:		0,15 1,10		Material:		Solo Lateritico Argiloso 20 % de Areia		BASE 20% DE AREIA LAVADA RIO ANAÚA									
% Mat. Ret. # N° 4:		59,00%		Próctor:		modificado		Golpes:		55		Operador:		ADRIANO		Lado		L / E					
Item		Unid.		1		2		3		4		5		6		Umidade Higroscópica							
Cápsula N°		-														52		46					
Peso Bruto Úmido		g														58,07		62,00					
Peso Bruto Seco		g														57,00		61,00					
Peso da Água		g														1,07		1,00					
Peso da Cápsula		g														19,11		20,59					
Peso do Solo Seco		g														37,89		40,41					
Umidade		%														2,82%		2,47%					
Umidade calculada		%		4,1%		6,2%		8,2%		10,3%		12,3%				2,6%							
Água Total		g		281		421		561		701		841				Peso do Material							
Água Adicionada		g		100		240		380		520		660				7.000,00							
% Água Adicionada		%		1,43%		3,43%		5,43%		7,43%		9,43%				P. Mat. Seco		Peso Água					
Peso Bruto Úmido		g		8.180		8.520		9.106		8.890		9.250				6.819		181					
Peos do Solo Úmido		g		4.055		4.435		4.890		4.655		4.536				Moldes							
Dens. Solo Úmido		g / m³		1.939		2.211		2.344		2.321		2.171				Nº		Peso		Volume			
Dens. Solo Seco		g / m³		1.863		2.082		2.166		2.104		1.933				20		4.125		2.091			
Resultados:				Observações:																			
H. Ótima		Dens. Máx		ISC		Expansão						23								4.085		2.006	
8,4 %		2.167		87,3		0,15						37								4.216		2.086	
												61								4.235		2.006	
												42								4.714		2.089	

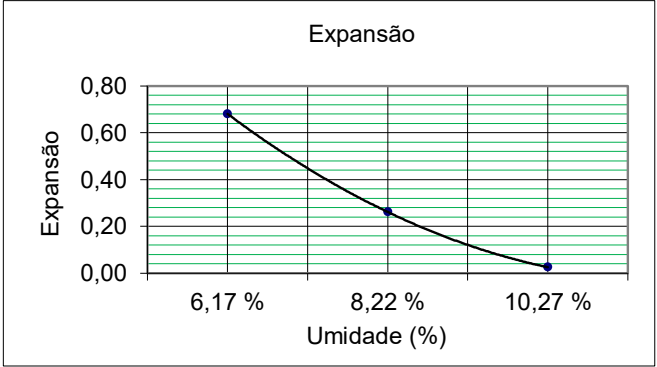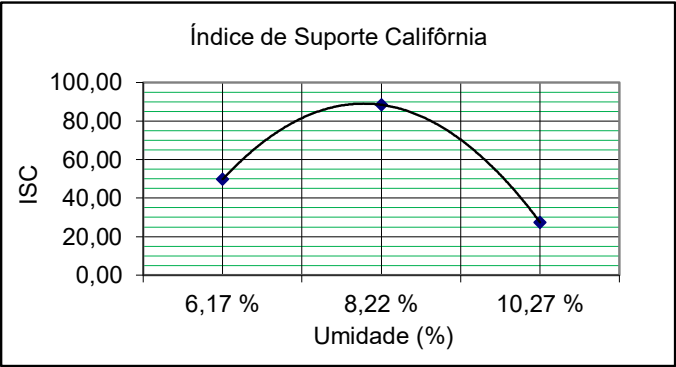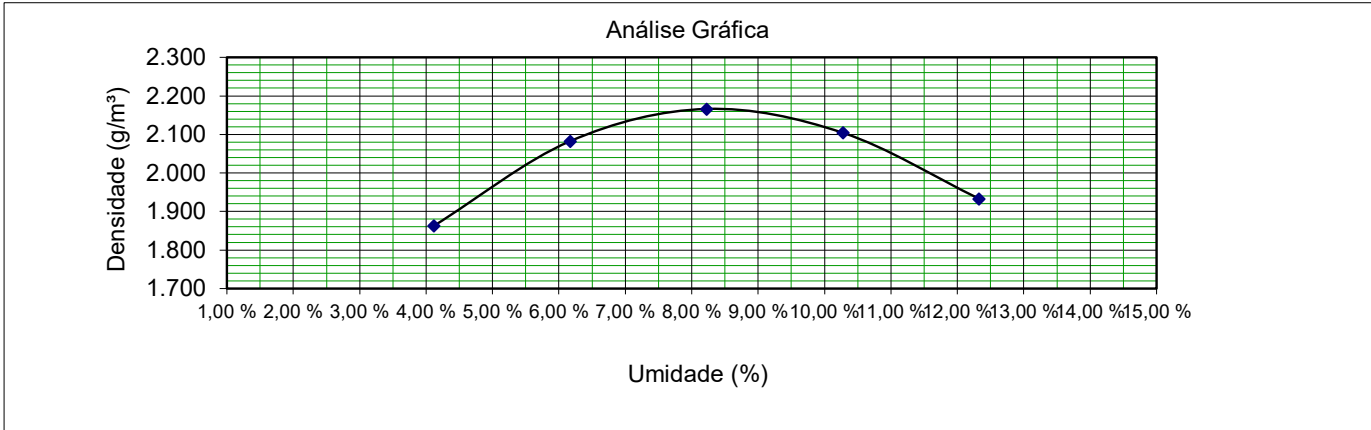



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE EXPANSÃO / I.S.C



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS




TRECHO: VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA					DATA: 15/07/2025	
RODOVIA: BR : 174			SUB-TRECHO: KM 20,900		OPERADO: ADRIANO	
ESTACA: 0	LADO: L / E	FURO: 4	PROFUNDIDADE: 0,15 1,10	GOLPES: 55	ESTUDO: BASE 20% DE AREIA	
% MATERIAL RET. PEN. Nº 4		PROCTOR:		MATERIAL:		
59,00%		modificado		Solo Laterítico Argiloso 20 % de Areia		

ENSAIO DE EXPANSÃO NORMA DNER - ME 049/94

MOLDE Nº	23	ALTURA			114,5	MOLDE Nº	37	ALTURA			114,5	MOLDE Nº	61	ALTURA			114,5
DATA	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%		HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%			HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%		
15/07/25	10:00	1,00		0,00		10:00	1,00		0,00			10:00	1,00	0,00	0,00		
19/07/25	09:00	1,78	0,78	0,68		09:00	1,30	0,30	0,26			09:00	1,03	0,03	0,03		

ENSAIO DE I.S.C NORMA DNIT 172/2016 - ME

MOLDE Nº 23			K-PRENSA =			0,110	MOLDE Nº 37				MOLDE Nº 61			
PENETR. mm	TEMPO min	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	
0.63	0.5	65	7,10			147	16,10			35	3,80			
1.27	1.0	170	18,70			268	29,40			75	8,20			
1.90	1.5	210	23,10			375	41,20			115	12,60			
2.54	2.0	285	31,30	70	44,70	560	61,50	70	87,90	175	19,20	70	27,40	
3.81	3.0	350	38,40			650	71,40			220	24,20			
5.08	4.0	475	52,20	105	49,70	845	92,80	105	88,40	260	28,50	105	27,10	
6.35	5.0	590	64,80			910	99,90			310	34,00			
7.62	6.0	670	73,60			985	108,20			400	43,90			
8.89	7.0	730	80,20			1075	118,00			485	53,30			
10.16	8.0	860	94,40			1155	126,80			585	64,20			
12.70	10.0	935	102,70			1250	137,30			630	69,20			

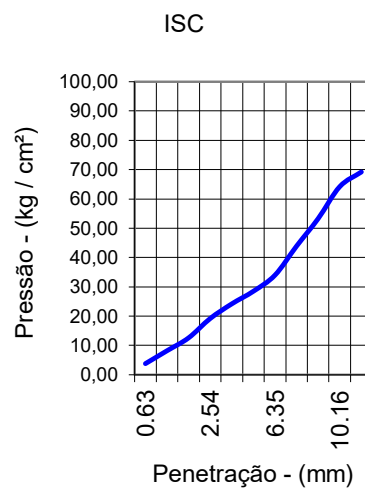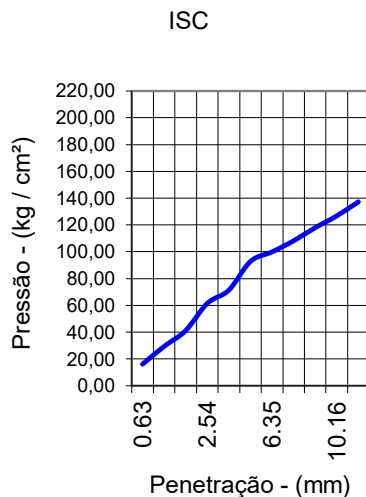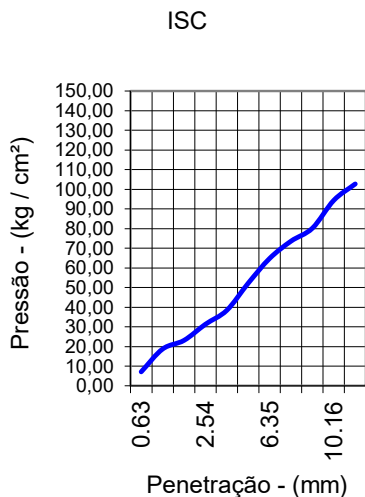

RESUMO


DENSIDADE MÁXIMA: 2167 g / cm³	ISC : 87,28 %
ÚMIDADE ÓTIMA: 8,38 %	EXPANSÃO : 0,15 %

Rodovia: BR : 174	Profundidade: 0,15 1,10
Trecho: VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA	Furo : 4
Procedência: ESTUDO DE JAZIDA	Estaca: 0
Camada: BASE 20% DE AREIA	Data: 15/07/25
OPERADO ADRIANO	

UMIDADE HIDROSCÓPICA		DISCRIMINAÇÃO		AMOSTRA SECA	
				Total	Parcial
Cápsula (N°)	52	46	Cápsula (N°)	33	31
Peso Umido (g)	58,07	62,00	Peso Bruto Úmido (g)	2000,0	200,0
Peso Bruto Seco (g)	57,00	61,00	Peso Retido na # N° 10 (g)	1313,28	
Peso da Água (g)	1,07	1,00	Peso Úmido Pass. na # N° 10 (g)	686,72	
Peso da Cápsula (g)	19,11	20,59	Peso Seco Pass. na # N° 10 (g)	669,00	
Peso do Solo Seco (g)	37,89	40,41	Peso da água (g)	17,72	
Umidade (%)	2,82	2,47	Peso da amostra Seca (g)	2	3
Umidade Média (%)	2,6			1982,3	194,8

Peneiramento

Amostra Total	Peneiras		Peso Retido Parcial (g)	Peso que Passa Acumulado (g)	% que Passa Am.Total	FAIXA AASTHO		CONSTANTES
	Pol	mm				Mínimo	Máximo	
	2"	50,8	0,00	1982,3	100,0			K ₁ =100 = 0,050
	1 1/2"	38,1	0,00	1982,3	100,0			
	1"	25,4	130,21	1852,1	93,0			K ₂ = 4 = 0,169
	3/8"	9,5	638,45	1213,7	61,0			
	4	4,8	395,68	818,0	41,0			
	10	2,0	148,94	669,1	33,0			
Amostra Parcial	40	0,42	68,43	126,4	21,0			
	200	0,074	75,88	50,5	9,0			

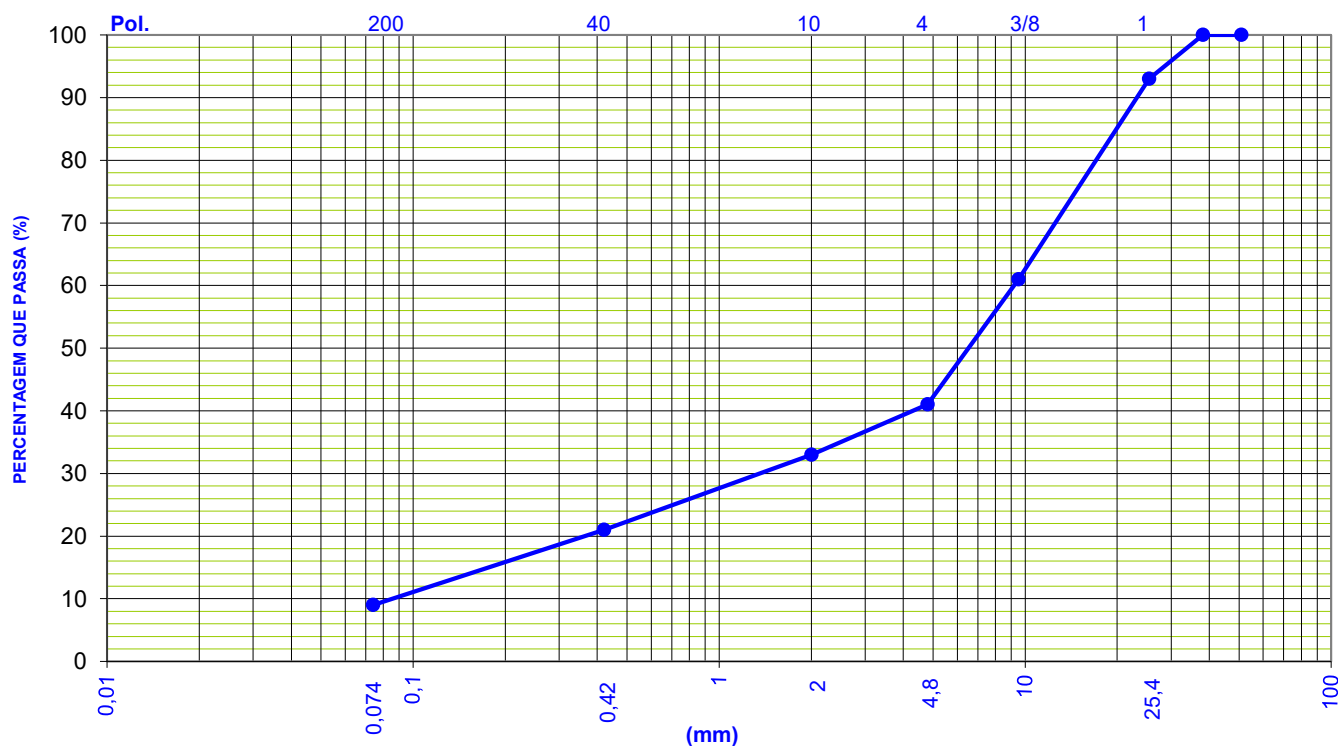

Resumo Granulometria (%)


Pedregulho (> 4,8 mm)	59,0
Areia Grossa (4,8 - 2,0 mm)	8,0
Areia Média (2,0 - 0,42 mm)	12,0
Areia Fina (0,42 - 0,074 mm)	12,0
Passando (0,074 mm)	9,0
Total	100,0



 		LIMITES FÍSICOS  RORAINÓPOLIS	
Rodovia: BR : 174		Profund.: 0,15 1,10	OPEADO
Trecho: VICINAL 8 MARTIHIS PEREIRA		Furo : 4	
Procedência: ESTUDO DE JAZIDA		Estaca: 0	
Camada: BASE 20% DE AREIA		Data: 16/07/2025	LADO

LIMITE DE LIQUIDEZ NORMA DNER ME - 122/94						
Cápsula	N.º	54	21	35	98	79
Golpes	g	11	20	30	40	50
Peso Bruto Úmido	g	13,95	14,45	11,75	14,35	10,45
Peso Bruto Seco	g	12,29	12,75	10,49	12,79	9,52
Peso da Cápsula	g	6,33	6,33	5,53	6,40	5,53
Peso da Água	g	1,66	1,70	1,26	1,56	0,93
Peso do Solo Seco	g	5,96	6,42	4,96	6,39	3,99
Umidade	%	27,85	26,48	25,40	24,41	23,31

LIMITE DE PLASTICIDADE NORMA DNER ME - 082/94						
Cápsula	N.º	85	20	03	05	06
Peso Bruto Úmido	g	8,64	8,05	7,95	7,92	6,50
Peso Bruto Seco	g	8,28	7,67	7,56	7,56	6,30
Peso da Cápsula	g	6,43	5,68	5,54	5,81	5,33
Peso da Água	g	0,36	0,38	0,39	0,36	0,20
Peso do Solo Seco	g	1,85	1,99	2,02	1,75	0,97
Umidade	%	19,46	19,10	19,31	20,57	20,62

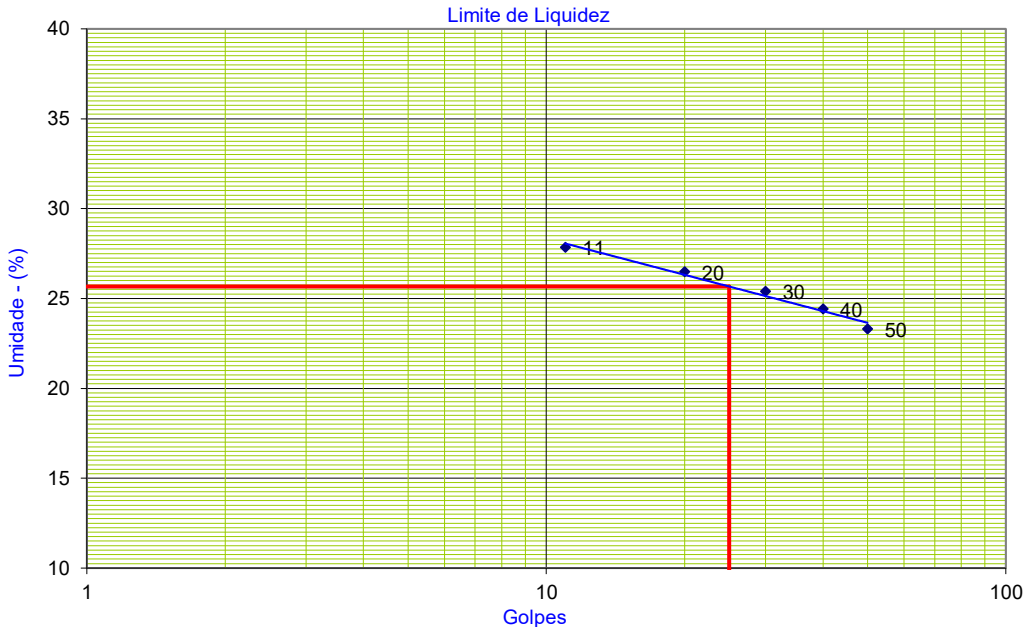Índice de Plasticidade LL= 25,7% LP = 19,8% IP= 5,9%		



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DNIT- 141/2022 - ES

E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS




Folha:

Única

Data:

15/07/2025

Rodovia: BR : 174		Trecho: VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA			Sub-trecho: KM 20,900			Registro: ESTUDO DE JAZIDA							
Estaca:		Furo: 5		Profundidade: 0,15 1,10		Material: Solo Laterítico Argiloso 20 % de Areia			BASE 20% DE AREIA LAVADA RIO ANAÚA						
% Mat. Ret. # N° 4: 42,00%		Próctor: MODIFICADO			Golpes: 55		Operador: ADRIANO		Lado L / E						
Item		Unid.	1	2	3	4	5	6	Umidade Higroscópica						
Cápsula N°		-							31	45					
Peso Bruto Úmido		g							58,05	62,10					
Peso Bruto Seco		g							57,00	61,00					
Peso da Água		g							1,05	1,10					
Peso da Cápsula		g							19,11	20,59					
Peso do Solo Seco		g							37,89	40,41					
Umidade		%							2,77%	2,72%					
Umidade calculada		%	3,6%	5,7%	7,7%	9,8%	11,8%		2,7%						
Água Total		g	247	387	527	667	807		Peso do Material						
Água Adicionada		g	60	200	340	480	620		7.000,00						
% Água Adicionada		%	0,86%	2,86%	4,86%	6,86%	8,86%		P. Mat. Seco	Peso Água					
Peso Bruto Úmido		g	8.250	8.490	8.986	8.780	9.350		6.813	187					
Peos do Solo Úmido		g	4.125	4.405	4.841	4.655	4.636		Moldes						
Dens. Solo Úmido		g / m³	1.973	2.196	2.330	2.321	2.219		N°	Peso	Volume				
Dens. Solo Seco		g / m³	1.904	2.078	2.162	2.114	1.984		20	4.125	2.091				
Resultados:				Observações:											
H. Ótima	Dens. Máx	ISC	Expansão												
8,0 %	2.164	88,6	0,10												

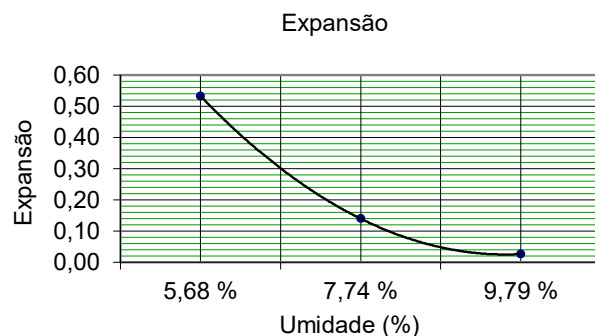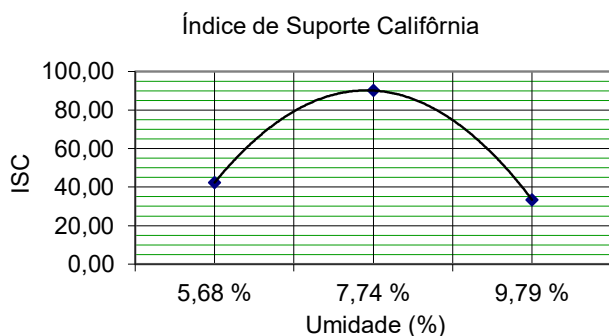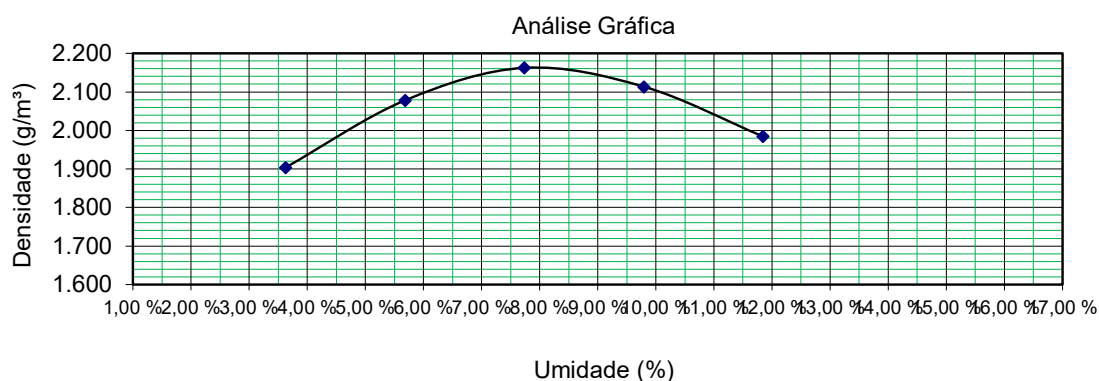



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE EXPANSÃO / I.S.C



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS


TRECHO:					DATA:										
VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA					15/07/2025										
RODOVIA:			SUB-TRECHO:			OPERADO									
BR : 174			KM 20,900												
ESTACA:		LADO:	FURO:		PROFUNDIDADE:					GOLPES:		ESTUDO:			
0		L / E	5		0,15 1,10					55		BASE 20% DE AREIA			
% MATERIAL RET. PEN. Nº 4			PROCTOR:							MATERIAL:					
42,00%			MODIFICADO							Solo Laterítico Argiloso 20 % de Areia					

ENSAIO DE EXPANSÃO NORMA DNER - ME 049/94


MOLDE Nº		ALTURA			MOLDE Nº		ALTURA		MOLDE Nº		ALTURA	
34		114,5			7		114,5		1		114,5	
DATA	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%
15/07/25	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00	0,00	0,00
												
19/07/25	09:00	1,61	0,61	0,53	09:00	1,16	0,16	0,14	09:00	1,03	0,03	0,03

ENSAIO DE I.S.C NORMA DNIT 172/2016 - ME


MOLDE Nº			K-PRENSA =				MOLDE Nº				MOLDE Nº			
34			0,110				7				1			
PENETR. mm	TEMPO min	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	
0.63	0.5	75	8,20			150	16,50			45	4,90			
1.27	1.0	105	11,50			220	24,20			95	10,40			
1.90	1.5	180	19,80			340	37,30			130	14,30			
2.54	2.0	250	27,50	70	39,30	575	63,10	70	90,10	185	20,30	70	29,00	
3.81	3.0	310	34,00			710	78,00			262	28,80			
5.08	4.0	405	44,50	105	42,40	855	93,90	105	89,40	320	35,10			
6.35	5.0	500	54,90			970	106,50			400	43,90			
7.62	6.0	595	65,30			1050	115,30			505	55,40			
8.89	7.0	685	75,20			1155	126,80			620	68,10			
10.16	8.0	760	83,40			1254	137,70			710	78,00			
12.70	10.0	890	97,70			1350	148,20			805	88,40			

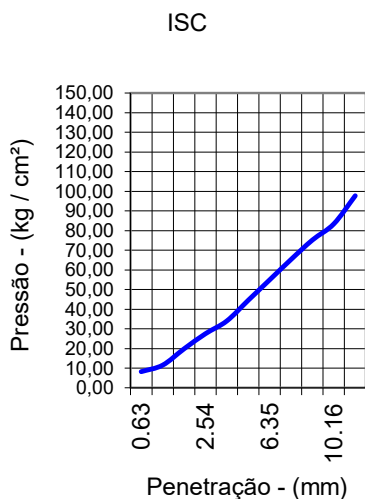

ISC = 42,40 %

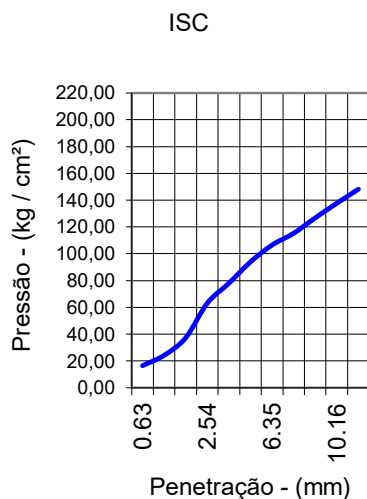

ISC = 90,10 %

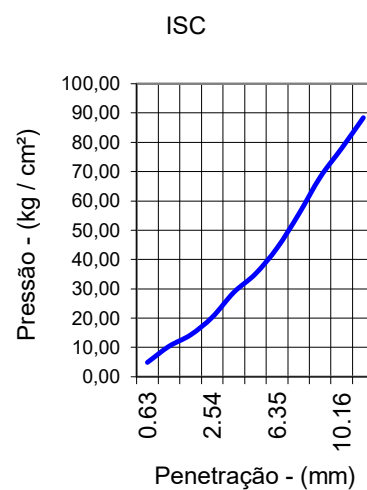

ISC = 33,40 %

RESUMO

DENSIDADE MÁXIMA:	2164 g / cm³	ISC :	88,56 %
ÚMIDADE ÓTIMA:	8,01 %	EXPANSÃO :	0,10 %



CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA Via Norte Construtora Ltda

**Análise Granulométrica NORMA DNER ME -080/94 (Simples)**


PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

Rodovia:	BR : 174	Profundidade:	0,15 1,10
Trecho:	VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA	Furo :	5
Procedência:	ESTUDO DE JAZIDA	Estaca:	0
Camada:	BASE 20% DE AREIA	OPERADO	Data: 15/07/25

UMIDADE HIDROSCÓPICA		DISCRIMINAÇÃO		AMOSTRA SECA	
				Total	Parcial
Cápsula (N°)	31	45	Cápsula (N°)	33	31
Peso Umido (g)	58,05	62,10	Peso Bruto Úmido (g)	2000,0	200,0
Peso Bruto Seco (g)	57,00	61,00	Peso Retido na # N° 10 (g)	1031,18	
Peso da Água (g)	1,05	1,10	Peso Úmido Pass. na # N° 10 (g)	968,82	
Peso da Cápsula (g)	19,11	20,59	Peso Seco Pass. na # N° 10 (g)	942,90	
Peso do Solo Seco (g)	37,89	40,41	Peso da água (g)	25,92	
Umidade (%)	2,77	2,72	Peso da amostra Seca (g)	2 1974,1	3 194,7
Umidade Média (%)	2,7				


Peneiramento

Amostra Total	Peneiras		Peso Retido Parcial (g)	Peso que Passa Acumulado (g)	% que Passa Am.Total	FAIXA AASTHO		CONSTANTES
	Pol	mm				Mínimo	Máximo	
	2"	50,8	0,00	1974,1	100,0			$K_1=100 = \frac{0,051}{\text{[2]}}$
	1 1/2"	38,1	0,00	1974,1	100,0			
	1"	25,4	125,11	1849,0	94,0			$K_2= \frac{\text{[4]}}{\text{[3]}} = \frac{0,247}{\text{[3]}}$
	3/8"	9,5	438,45	1410,6	72,0			
	4	4,8	280,68	1129,9	58,0			
	10	2,0	186,94	943,0	48,0			
Amostra Parcial	40	0,42	75,43	119,3	29,0			
	200	0,074	84,88	34,4	8,0			

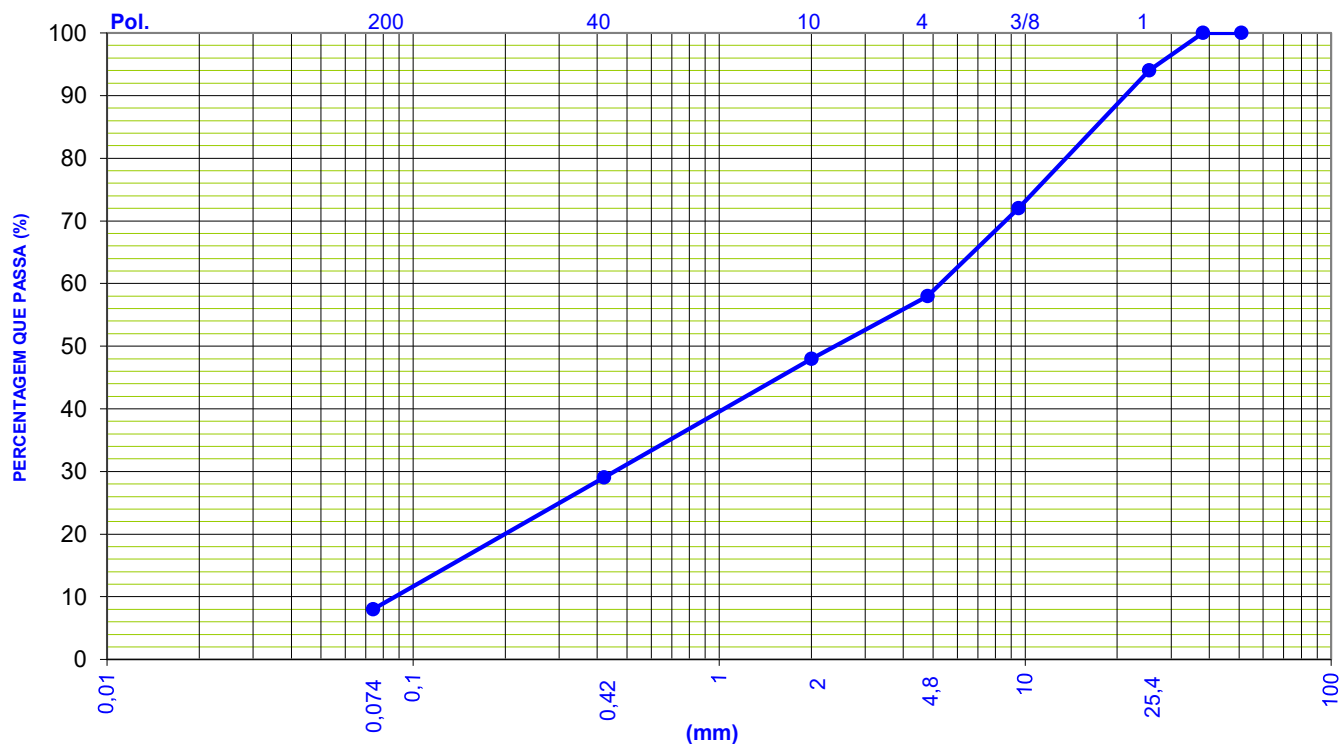**Resumo Granulometria (%)**

Pedregulho (> 4,8 mm)	42,0
Areia Grossa (4,8 - 2,0 mm)	10,0
Areia Média (2,0 - 0,42 mm)	19,0
Areia Fina (0,42 - 0,074 mm)	21,0
Passando (0,074 mm)	8,0
Total	100,0

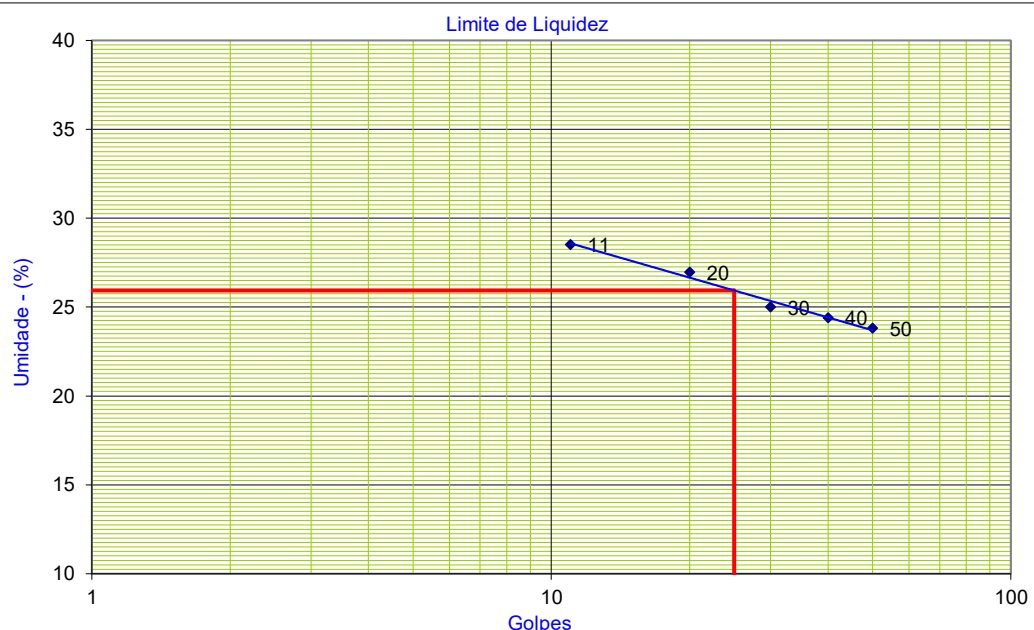

  MTEC CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA. Via Norte Construtora Ltda		LIMITES FÍSICOS  PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS					
Rodovia: RR 171		Profund.: 0,15 1,10		OPERADO ADRIANO			
Trecho: VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA		Furo : 5					
Procedência: ESTUDO DE JAZIDA		Estaca: 0					
Camada: BASE 20% DE AREIA		Data: 16/07/2025		LADO L / E			
LIMITE DE LIQUIDEZ NORMA DNER ME - 122/94							
Cápsula	N.º	64	54	32	97	78	
Golpes	g	11	20	30	40	50	
Peso Bruto Úmido	g	13,99	14,43	11,73	14,35	10,47	
Peso Bruto Seco	g	12,29	12,71	10,49	12,79	9,52	
Peso da Cápsula	g	6,33	6,33	5,53	6,40	5,53	
Peso da Água	g	1,70	1,72	1,24	1,56	0,95	
Peso do Solo Seco	g	5,96	6,38	4,96	6,39	3,99	
Umidade	%	28,52	26,96	25,00	24,41	23,81	
LIMITE DE PLASTICIDADE NORMA DNER ME - 082/94							
Cápsula	N.º	45	06	48	31	07	
Peso Bruto Úmido	g	8,65	8,08	7,98	7,92	6,49	
Peso Bruto Seco	g	8,27	7,67	7,56	7,56	6,30	
Peso da Cápsula	g	6,43	5,68	5,54	5,81	5,33	
Peso da Água	g	0,38	0,41	0,42	0,36	0,19	
Peso do Solo Seco	g	1,84	1,99	2,02	1,75	0,97	
Umidade	%	20,65	20,60	20,79	20,57	19,59	
Índice de Plasticidade LL= 25,9% LP = 20,4% IP= 5,5%		Limite de Liquidez 					



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DNIT- 141/2022 - ES

E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS




Folha:

Única

Data:

17/07/2025

Rodovia: BR : 174		Trecho: VICINAL 8 MARTIHIS PEREIRA		Sub-trecho: KM 20,900			Registro: ESTUDO DE JAZIDA			
Estaca:	Furo: 6	Profundidade: 0,15 1,10		Material: Solo Laterítico Argiloso 20 % de Areia			BASE 20% DE AREIA LAVADA RIO ANAÚA			
% Mat. Ret. # Nº 4: 69,00%	Próctor: MODIFICADO		Golpes: 55		Operador: ADRIANO		Lado L / E			
Item	Unid.	1	2	3	4	5	6	Umidade Higroscópica		
Cápsula Nº	-							45	78	
Peso Bruto Úmido	g							55,11	67,17	
Peso Bruto Seco	g							54,00	66,03	
Peso da Água	g							1,11	1,14	
Peso da Cápsula	g							19,11	20,59	
Peso do Solo Seco	g							34,89	45,44	
Umidade	%							3,18%	2,51%	
Umidade calculada	%	4,3%	5,9%	7,4%	8,9%	10,5%		2,8%		
Água Total	g	294	399	504	609	714		Peso do Material		
Água Adicionada	g	100	205	310	415	520		7.000,00		
% Água Adicionada	%	1,43%	2,93%	4,43%	5,93%	7,43%		P. Mat. Seco	Peso Água	
Peso Bruto Úmido	g	8.500	8.510	8.950	8.690	9.210		6.806	194	
Peos do Solo Úmido	g	4.100	4.425	4.825	4.565	4.496		Moldes		
Dens. Solo Úmido	g / m³	1.963	2.206	2.308	2.276	2.152		Nº	Peso	Volume
Dens. Solo Seco	g / m³	1.881	2.084	2.149	2.089	1.948		34	4.400	2.089
Resultados:		Observações:						33	4.085	2.006
								20	4.125	2.091
H. Ótima	Dens. Máx	ISC	Expansão							
7,4 %	2.149	98,7	0,17							

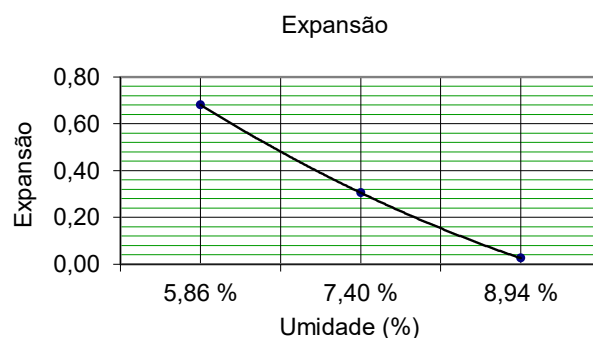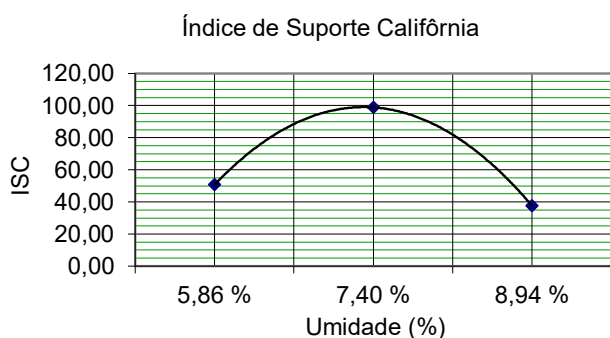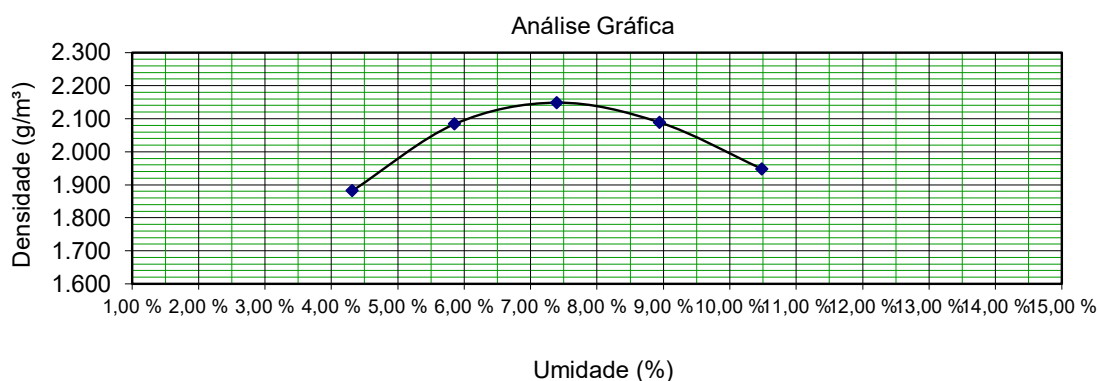



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE EXPANSÃO / I.S.C



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS

TRECHO:					DATA:	
VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA					17/07/2025	
RODOVIA:		SUB-TRECHO:			OPERADO	
BR : 174		KM 20,900			ADRIANO	
ESTACA:	LADO:	FURO:	PROFUNDIDADE:	GOLPES:	ESTUDO:	
0	L / E	6	0,15 1,10	55	BASE 20% DE AREIA	
% MATERIAL RET. PEN. Nº 4		PROCTOR:		MATERIAL:		
69,00%		MODIFICADO		Solo Laterítico Argiloso 20 % de Areia		




ENSAIO DE EXPANSÃO NORMA DNER - ME 049/94

MOLDE Nº	33	ALTURA			114,5	MOLDE Nº	20	ALTURA			114,5	MOLDE Nº	11	ALTURA			114,5
DATA	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%		HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%			HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%		
17/07/25	10:00	1,00		0,00		10:00	1,00		0,00			10:00	1,00		0,00		
21/07/25	09:00	1,78	0,78	0,68		09:00	1,35	0,35	0,31			09:00	1,03	0,03	0,03		



ENSAIO DE I.S.C NORMA DNIT 172/2016 - ME

MOLDE Nº 33			K-PRENSA = 0,110			MOLDE Nº 20				MOLDE Nº 11			
PENETR. mm	TEMPO min	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %
0.63	0.5	50	5,50			165	18,10			36	4,00		
1.27	1.0	145	15,90			275	30,20			85	9,30		
1.90	1.5	198	21,70			410	45,00			150	16,50		
2.54	2.0	250	27,50	70	39,30	580	63,70	70	91,00	200	22,00	70	31,40
3.81	3.0	370	40,60			710	78,00			275	30,20		
5.08	4.0	485	53,30	105	50,80	945	103,80	105	98,90	360	39,50	105	37,60
6.35	5.0	575	63,10			1075	118,00			475	52,20		
7.62	6.0	680	74,70			1150	126,30			550	60,40		
8.89	7.0	765	84,00			1230	135,10			670	73,60		
10.16	8.0	880	96,60			1345	147,70			740	81,30		
12.70	10.0	970	106,50			1465	160,90			830	91,10		

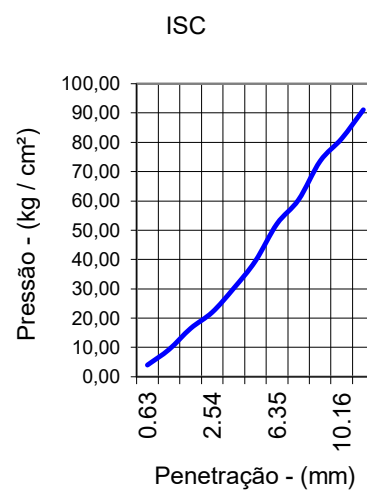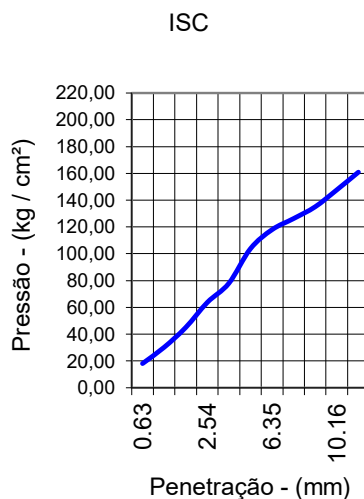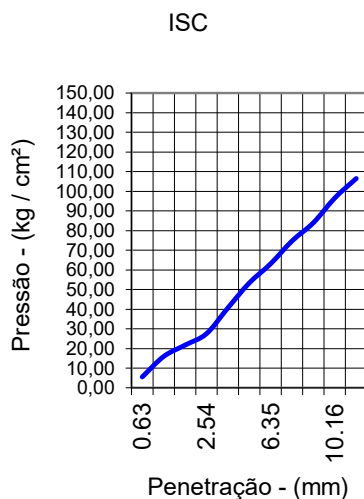

RESUMO


DENSIDADE MÁXIMA: 2149 g / cm³	ISC : 98,74 %
ÚMIDADE ÓTIMA: 7,43 %	EXPANSÃO : 0,17 %

Rodovia: BR : 174	Profundidade: 0,15 1,10
Trecho: VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA	Furo : 6
Procedência: ESTUDO DE JAZIDA	Estaca: 0
Camada: BASE 20% DE AREIA	Data: 17/07/25
OPERADO ADRIANO	

UMIDADE HIDROSCÓPICA		DISCRIMINAÇÃO		AMOSTRA SECA	
				Total	Parcial
Cápsula (N°)	45	78	Cápsula (N°)	31	11
Peso Umido (g)	55,11	67,17	Peso Bruto Úmido (g)	2000,0	200,0
Peso Bruto Seco (g)	54,00	66,03	Peso Retido na # N° 10 (g)	1479,22	
Peso da Água (g)	1,11	1,14	Peso Úmido Pass. na # N° 10 (g)	520,78	
Peso da Cápsula (g)	19,11	20,59	Peso Seco Pass. na # N° 10 (g)	506,40	
Peso do Solo Seco (g)	34,89	45,44	Peso da água (g)	14,38	
Umidade (%)	3,18	2,51	Peso da amostra Seca (g)	2 1985,6	3 194,5
Umidade Média (%)	2,8				

Peneiramento

Amostra Total	Peneiras		Peso Retido Parcial (g)	Peso que Passa Acumulado (g)	% que Passa Am.Total	FAIXA AASTHO		CONSTANTES
	Pol	mm				Mínimo	Máximo	
	2"	50,8	0,00	1985,6	100,0			K ₁ =100 = 0,050 2
	1 1/2"	38,1	0,00	1985,6	100,0			
	1"	25,4	145,64	1840,0	92,0			K ₂ = 4 = 0,129 3
	3/8"	9,5	730,14	1109,9	55,0			
	4	4,8	495,23	614,7	31,0			
	10	2,0	108,21	506,5	25,0	4		
Amostra Parcial	40	0,42	71,91	122,6	16,0			
	200	0,074	65,85	56,8	7,0			

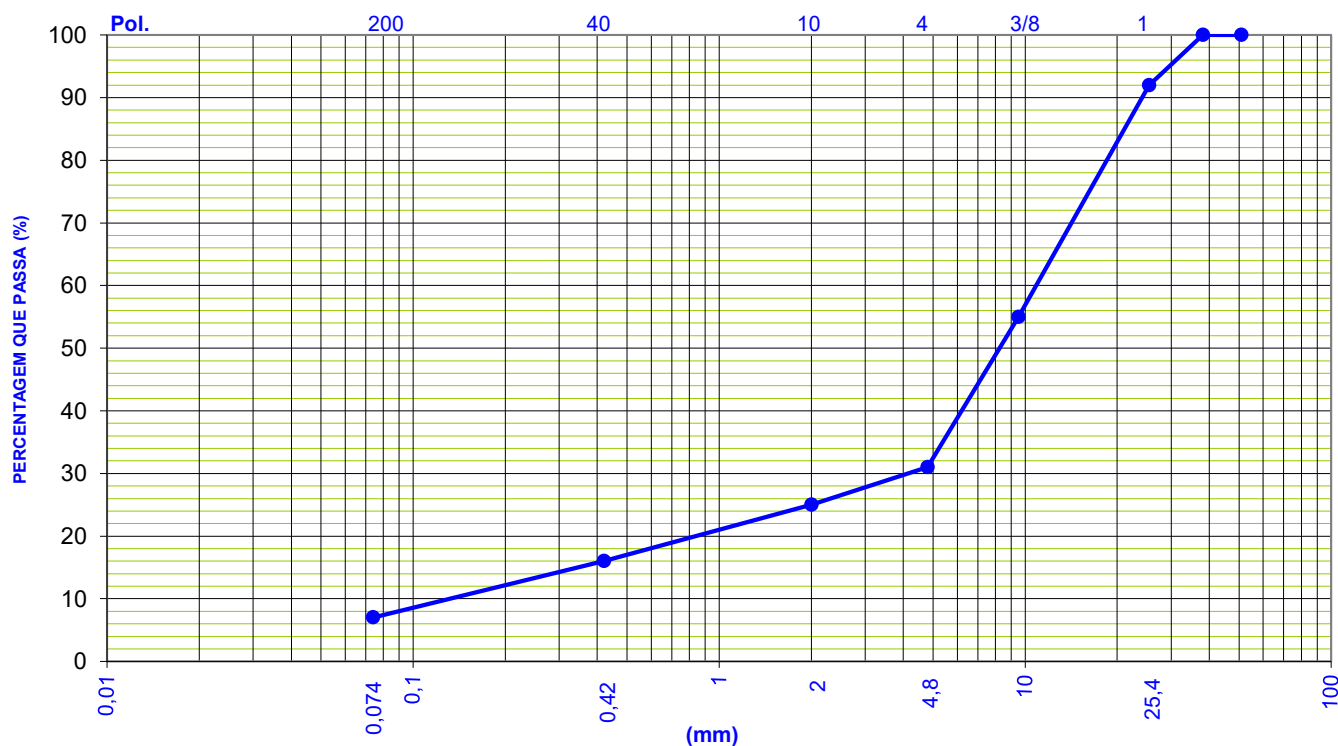

Resumo Granulometria (%)

Pedregulho (> 4,8 mm)	69,0
Areia Grossa (4,8 - 2,0 mm)	6,0
Areia Média (2,0 - 0,42 mm)	9,0
Areia Fina (0,42 - 0,074 mm)	9,0
Passando (0,074 mm)	7,0
Total	100,0





CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA. Via Norte Construtora Ltda



LIMITES FÍSICOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS

Rodovia: RR 171

Profund.: 0,15 1,10

OPERADO ADRIANO

Trecho: VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA

Furo : 6

Procedência: ESTUDO DE JAZIDA

Estaca: 0

Camada: BASE 20% DE AREIA

Data: 18/07/2025

LADO L / E

LIMITE DE LIQUIDEZ NORMA DNER ME - 122/94

Cápsula	N.º	03	12	61	75	91
Golpes	g	10	20	29	40	50
Peso Bruto Úmido	g	24,47	34,00	20,32	23,75	24,80
Peso Bruto Seco	g	20,47	28,30	17,42	20,19	21,14
Peso da Cápsula	g	5,84	6,33	5,71	5,45	5,66
Peso da Água	g	4,00	5,70	2,90	3,56	3,66
Peso do Solo Seco	g	14,63	21,97	11,71	14,74	15,48
Umidade	%	27,34	25,94	24,77	24,15	23,64



LIMITE DE PLASTICIDADE NORMA DNER ME - 082/94

Cápsula	N.º	20	15	30	24	33
Peso Bruto Úmido	g	8,13	8,11	7,69	7,32	7,60
Peso Bruto Seco	g	7,80	7,75	7,34	7,01	7,28
Peso da Cápsula	g	6,15	5,96	5,61	5,52	5,80
Peso da Água	g	0,33	0,36	0,35	0,31	0,32
Peso do Solo Seco	g	1,65	1,79	1,73	1,49	1,48
Umidade	%	20,00	20,11	20,23	20,81	21,62




Índice de
Plasticidade

LL= 25,2%

LP = 20,3%

IP = 4,9%

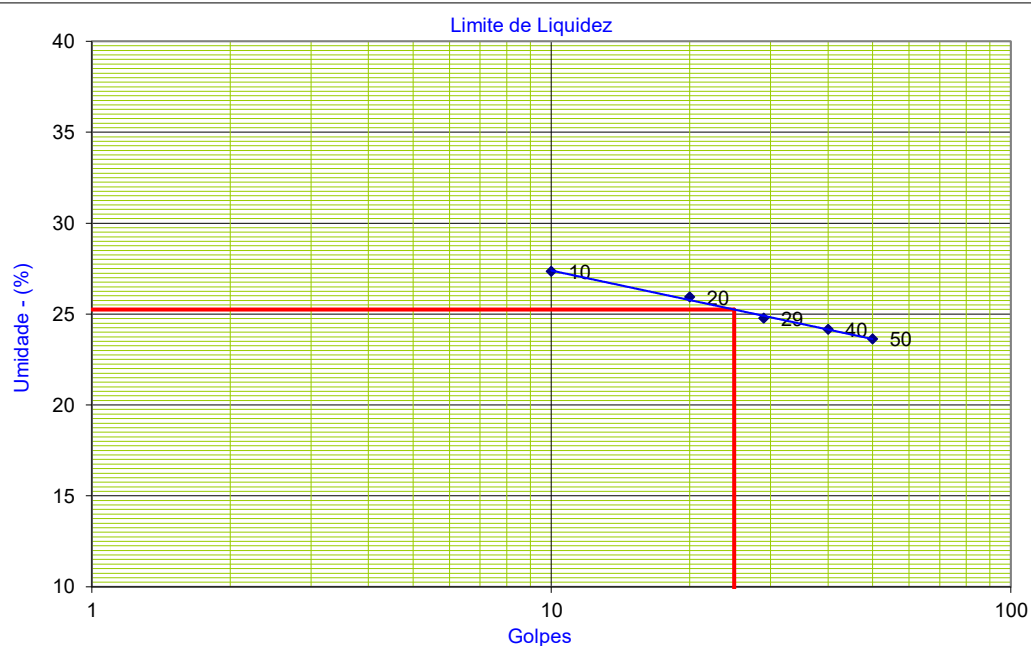



CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DNIT- 141/2022 - ES

E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS

Folha:


Única

Data:


16/07/2025

Rodovia: BR : 174		Trecho: VICINAL 8 MARTIHIS PEREIRA		Sub-trecho: KM 20,900			Registro: ESTUDO DE JAZIDA							
Estaca:	Furo: 7	Profundidade: 0,15 1,10		Material: Solo Laterítico Argiloso 20 % de Areia			BASE 20% DE AREIA LAVADA RIO ANAÚA							
% Mat. Ret. # N° 4: 61,00%	Próctor: MODIFICADO		Golpes: 55		Operador: GABRIEL		Lado L / E							
Item	Unid.	1	2	3	4	5	6	Umidade Higroscópica						
Cápsula N°	-							11	21					
Peso Bruto Úmido	g							55,11	67,17					
Peso Bruto Seco	g							54,00	66,03					
Peso da Água	g							1,11	1,14					
Peso da Cápsula	g							19,11	20,59					
Peso do Solo Seco	g							34,89	45,44					
Umidade	%							3,18%	2,51%					
Umidade calculada	%	4,3%	5,9%	7,4%	8,9%	10,5%		2,8%						
Água Total	g	294	399	504	609	714		Peso do Material						
Água Adicionada	g	100	205	310	415	520		7.000,00						
% Água Adicionada	%	1,43%	2,93%	4,43%	5,93%	7,43%		P. Mat. Seco	Peso Água					
Peso Bruto Úmido	g	8.500	8.430	8.970	8.710	9.220		6.806	194					
Peos do Solo Úmido	g	4.100	4.345	4.735	4.565	4.506		Moldes						
Dens. Solo Úmido	g / m³	1.963	2.166	2.300	2.276	2.157		N°	Peso	Volume				
Dens. Solo Seco	g / m³	1.881	2.046	2.141	2.089	1.952		34	4.400	2.089				
Resultados:		Observações:												
H. Ótima	Dens. Máx	ISC	Expansão											
7,6 %	2.143	91,3	0,10											


Análise Gráfica

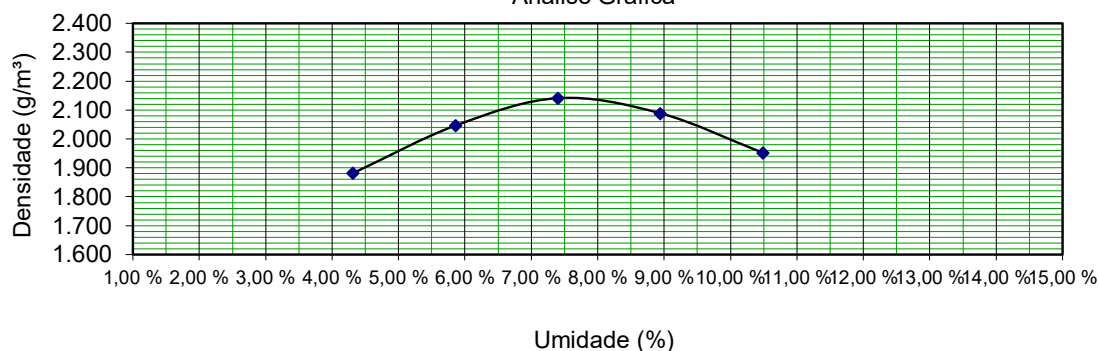

Índice de Suporte Califórnia

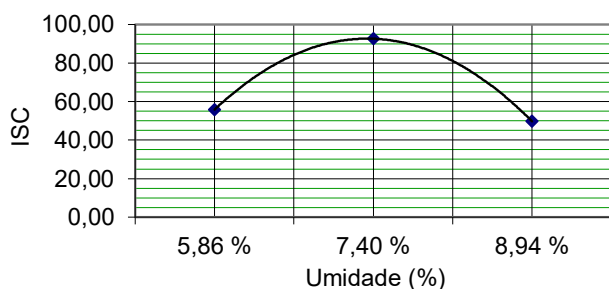

Expansão

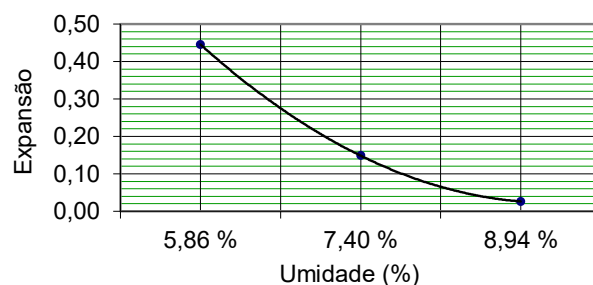



CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA Via Norte Construtora Ltda

ENSAIO DE EXPANSÃO / I.S.C



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS




TRECHO:					DATA:	
VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA					16/07/2025	
RODOVIA:		SUB-TRECHO:			OPERADO	
BR : 174		KM 20,900			GABRIEL	
ESTACA:	LADO:	FURO:	PROFUNDIDADE:	GOLPES:	ESTUDO:	
0	L / E	7	0,15 1,10	55	BASE 20% DE AREIA	
% MATERIAL RET. PEN. Nº 4		PROCTOR:		MATERIAL:		
61,00%		MODIFICADO		Solo Laterítico Argiloso 20 % de Areia		

ENSAIO DE EXPANSÃO NORMA DNER - ME 049/94

MOLDE Nº 81		ALTURA 114,5			MOLDE Nº 22		ALTURA 114,5			MOLDE Nº 10		ALTURA 114,5	
DATA	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	
16/07/25	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00	0,00	0,00	
20/07/25	09:00	1,51	0,51	0,45	09:00	1,17	0,17	0,15	09:00	1,03	0,03	0,03	

ENSAIO DE I.S.C NORMA DNIT 172/2016 - ME

MOLDE Nº 81			K-PRESSA = 0,110				MOLDE Nº 22				MOLDE Nº 10			
PENETR. mm	TEMPO min	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %		LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %
0.63	0.5	60	6,60				175	19,20			45	4,90		
1.27	1.0	168	18,40				268	29,40			105	11,50		
1.90	1.5	230	25,30				395	43,40			185	20,30		
2.54	2.0	310	34,00	70	48,60		590	64,80	70	92,60	275	30,20	70	43,10
3.81	3.0	495	54,40				695	76,30			345	37,90		
5.08	4.0	535	58,70	105	55,90		840	92,20	105	87,80	475	52,20	105	49,70
6.35	5.0	655	71,90				910	99,90			560	61,50		
7.62	6.0	770	84,50				970	106,50			635	69,70		
8.89	7.0	840	92,20				1050	115,30			745	81,80		
10.16	8.0	985	108,20				1145	125,70			865	95,00		
12.70	10.0	1040	114,20				1265	138,90			947	104,00		

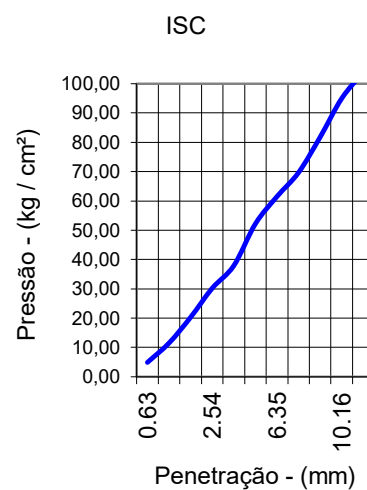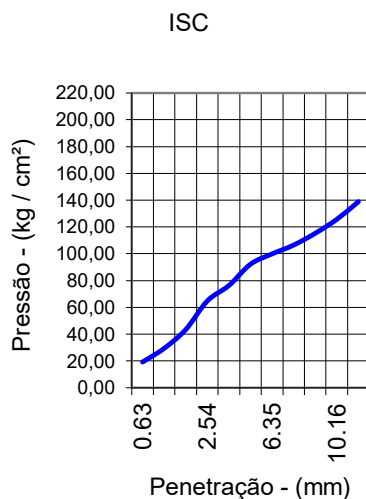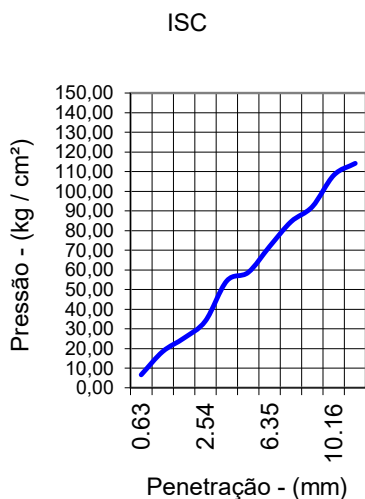

RESUMO

DENSIDADE MÁXIMA: 2143 g / cm³	ISC : 91,31 %
ÚMIDADE ÓTIMA: 7,62 %	EXPANSÃO : 0,10 %



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda

**Análise Granulométrica NORMA DNER ME -080/94 (Simples)**


PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

Rodovia:	BR : 174	Profundidade:	0,15 1,10
Trecho:	VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA	Furo :	7
Procedência:	ESTUDO DE JAZIDA	Estaca:	0
Camada:	BASE 20% DE AREIA	Operado	GABRIEL
		Data:	16/07/25

UMIDADE HIDROSCÓPICA		DISCRIMINAÇÃO		AMOSTRA SECA	
				Total	Parcial
Cápsula (N°)	11	21	Cápsula (N°)	31	11
Peso Umido (g)	55,11	67,17	Peso Bruto Úmido (g)	2000,0	200,0
Peso Bruto Seco (g)	54,00	66,03	Peso Retido na # N° 10 (g)	1348,30	
Peso da Água (g)	1,11	1,14	Peso Úmido Pass. na # N° 10 (g)	651,70	
Peso da Cápsula (g)	19,11	20,59	Peso Seco Pass. na # N° 10 (g)	633,70	
Peso do Solo Seco (g)	34,89	45,44	Peso da água (g)	18,00	
Umidade (%)	3,18	2,51	Peso da amostra Seca (g)	2 1982,0	3 194,5
Umidade Média (%)	2,8				

Peneiramento


Amostra Total	Peneiras		Peso Retido Parcial (g)	Peso que Passa Acumulado (g)	% que Passa Am.Total	FAIXA AASTHO		CONSTANTES
	Pol	mm				Mínimo	Máximo	
	2"	50,8	0,00	1982,0	100,0			
	1 1/2"	38,1	0,00	1982,0	100,0			K ₁ =100 = 0,050 2
	1"	25,4	110,23	1871,8	94,0			
	3/8"	9,5	682,32	1189,5	59,0			K ₂ = 4 = 0,165 3
	4	4,8	410,52	779,0	39,0			
	10	2,0	145,23	633,8	4 32,0			
Amostra Parcial	40	0,42	61,91	132,6	22,0			
	200	0,074	72,85	59,8	10,0			

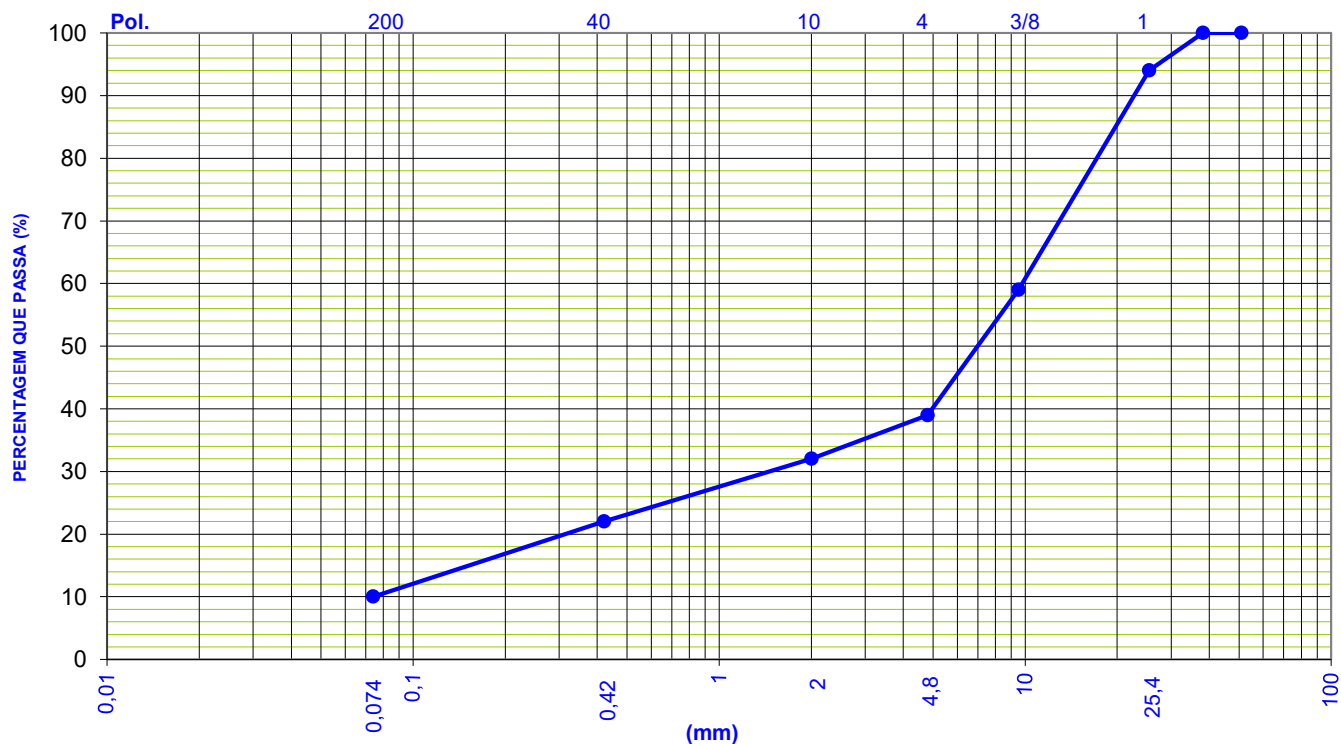**Resumo Granulometria (%)**


Pedregulho (> 4,8 mm)	61,0
Areia Grossa (4,8 - 2,0 mm)	7,0
Areia Média (2,0 - 0,42 mm)	10,0
Areia Fina (0,42 - 0,074 mm)	12,0
Passando (0,074 mm)	10,0
Total	100,0



 		LIMITES FÍSICOS  PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	
Rodovia: RR 171		Profund.: 0,15 1,10	OPERADO GABRIEL
Trecho: VICINAL 8 MARTIHIS PEREIRA		Furo : 7	
Procedência: ESTUDO DE JAZIDA		Estaca: 0	
Camada: BASE 20% DE AREIA		Data: 17/07/2025	LADO L / E

LIMITE DE LIQUIDEZ NORMA DNER ME - 122/94							
Cápsula	N.º	85	75	95	32	45	
Golpes	g	10	20	30	40	50	
Peso Bruto Úmido	g	24,38	33,88	20,32	23,78	24,80	
Peso Bruto Seco	g	20,43	28,30	17,42	20,19	21,14	
Peso da Cápsula	g	5,84	6,33	5,71	5,45	5,66	
Peso da Água	g	3,95	5,58	2,90	3,59	3,66	
Peso do Solo Seco	g	14,59	21,97	11,71	14,74	15,48	
Umidade	%	27,07	25,40	24,77	24,36	23,64	

LIMITE DE PLASTICIDADE NORMA DNER ME - 082/94							
Cápsula	N.º	41	65	14	44	99	
Peso Bruto Úmido	g	8,14	8,12	7,70	7,31	7,58	
Peso Bruto Seco	g	7,80	7,75	7,34	7,01	7,28	
Peso da Cápsula	g	6,15	5,96	5,61	5,52	5,80	
Peso da Água	g	0,34	0,37	0,36	0,30	0,30	
Peso do Solo Seco	g	1,65	1,79	1,73	1,49	1,48	
Umidade	%	20,61	20,67	20,81	20,13	20,27	

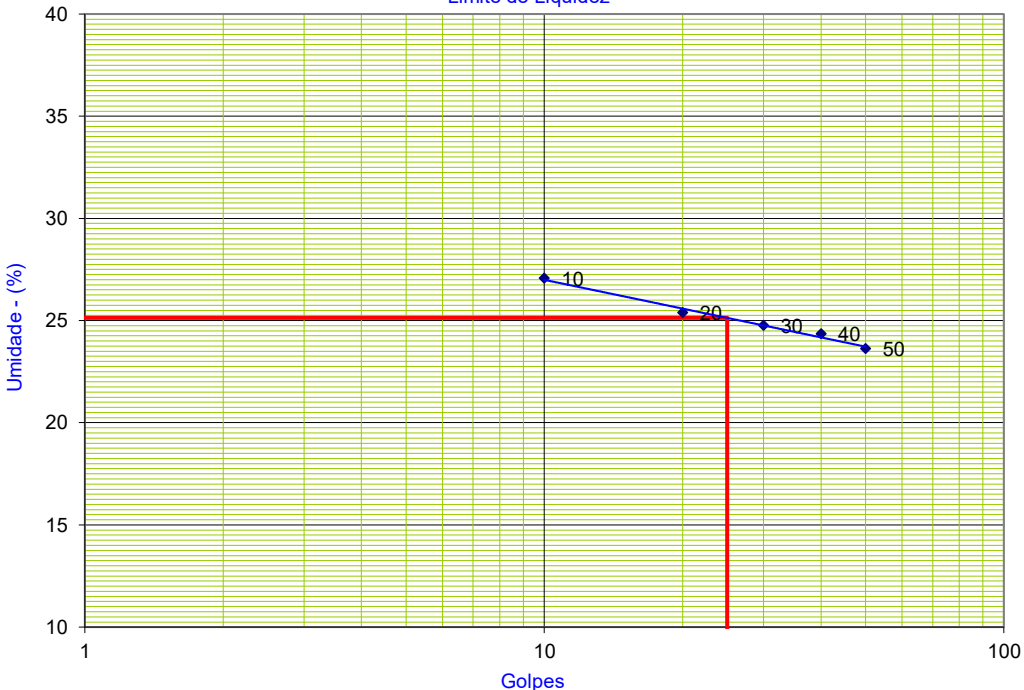Índice de Plasticidade LL= 25,1% LP = 20,5% IP= 4,6%	Limite de Liquidez 	



MTEC
CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DNIT- 141/2022 - ES

E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA



Folha:


Única

Data:


16/07/2025

Rodovia: BR : 174		Trecho: VICINAL 8 MARTIHIS PEREIRA		Sub-trecho: KM 20,900			Registro: ESTUDO DE JAZIDA		
Estaca:	Furo: 8	Profundidade: 0,15 1,10		Material: Solo Laterítico Argiloso 20 % de Areia			BASE 20% DE AREIA LAVADA RIO ANAÚA		
% Mat. Ret. # N° 4: 59,00%	Próctor: MODIFICADO		Golpes: 55		Operador: Marjone		Lado L / E		
Item	Unid.	1	2	3	4	5	6	Umidade Higroscópica	
Cápsula N°	-							2	31
Peso Bruto Úmido	g							58,17	62,19
Peso Bruto Seco	g							57,00	61,00
Peso da Água	g							1,17	1,19
Peso da Cápsula	g							19,11	20,59
Peso do Solo Seco	g							37,89	40,41
Umidade	%							3,09%	2,94%
Umidade calculada	%	4,3%	5,9%	7,4%	9,0%	10,5%		3,0%	
Água Total	g	295	400	505	610	715		Peso do Material	
Água Adicionada	g	90	195	300	405	510		7.000,00	
% Água Adicionada	%	1,29%	2,79%	4,29%	5,79%	7,29%		P. Mat. Seco	Peso Água
Peso Bruto Úmido	g	8.180	8.490	8.970	8.840	9.290		6.795	205
Peos do Solo Úmido	g	4.055	4.405	4.863	4.636	4.576		Moldes	
Dens. Solo Úmido	g / m³	1.939	2.196	2.330	2.311	2.191		N°	Peso
Dens. Solo Seco	g / m³	1.859	2.074	2.169	2.121	1.982		20	4.125
Resultados:		Observações:						Volume	
								2.091	
								2.006	
								67	
								4.107	
								2.087	
								71	
								4.204	
								2.006	
								42	
								4.714	
								2.089	


Análise Gráfica

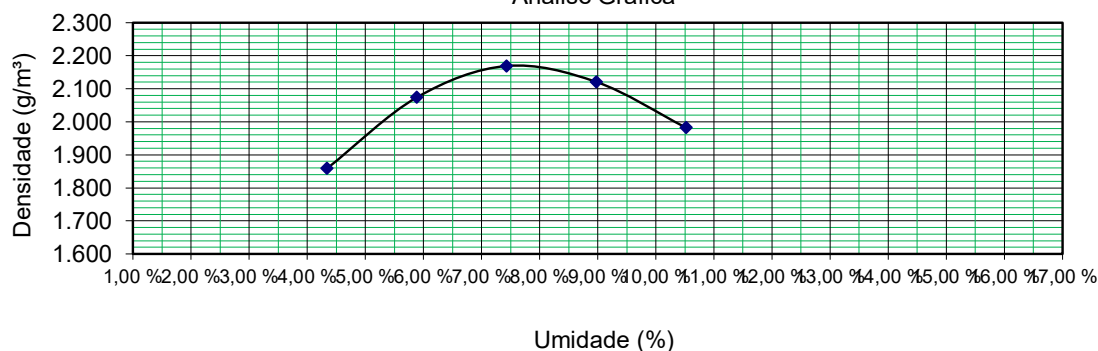

Índice de Suporte Califórnia

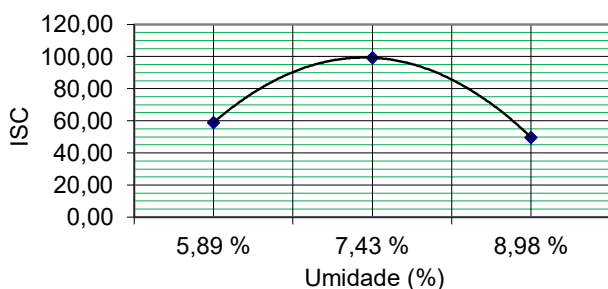

Expansão

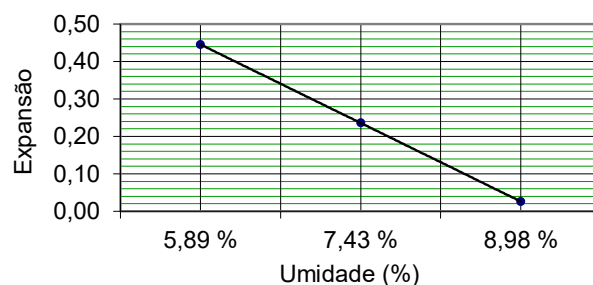



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE EXPANSÃO / I.S.C



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

TRECHO: VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA						DATA: 16/07/2025	
RODOVIA: BR : 174			SUB-TRECHO: KM 20,900			OPERADO: Marjone	
ESTACA: 0		LADO: L / E	FURO: 8	PROFUNDIDADE: 0,15 1,10	GOLPES: 55	ESTUDO: BASE 20% DE AREIA	
% MATERIAL RET. PEN. Nº 4: 59,00%			PROCTOR: MODIFICADO			MATERIAL: Solo Laterítico Argiloso 20 % de Areia	


ENSAIO DE EXPANSÃO NORMA DNER - ME 049/94

MOLDE Nº 62		ALTURA 114,5			MOLDE Nº 67		ALTURA 114,5			MOLDE Nº 71		ALTURA 114,5	
DATA	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	
16/07/25	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00	0,00	0,00	
20/07/25	09:00	1,51	0,51	0,45	09:00	1,27	0,27	0,24	09:00	1,03	0,03	0,03	




ENSAIO DE I.S.C NORMA DNIT 172/2016 - ME


MOLDE Nº 62			K-PRENSA = 0,110				MOLDE Nº 67				MOLDE Nº 71			
PENETR. mm	TEMPO min	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %		LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %
0.63	0.5	65	7,10				185	20,30			45	4,90		
1.27	1.0	175	19,20				295	32,40			100	11,00		
1.90	1.5	235	25,80				430	47,20			185	20,30		
2.54	2.0	375	41,20	70	58,90		625	68,60	70	98,00	240	26,40	70	37,70
3.81	3.0	455	50,00				795	87,30			320	35,10		
5.08	4.0	510	56,00	105	53,30		950	104,30	105	99,30	475	52,20	105	49,70
6.35	5.0	610	67,00				1056	115,90			525	57,60		
7.62	6.0	730	80,20				1123	123,30			620	68,10		
8.89	7.0	860	94,40				1245	136,70			730	80,20		
10.16	8.0	950	104,30				1374	150,90			845	92,80		
12.70	10.0	1050	115,30				1485	163,10			930	102,10		

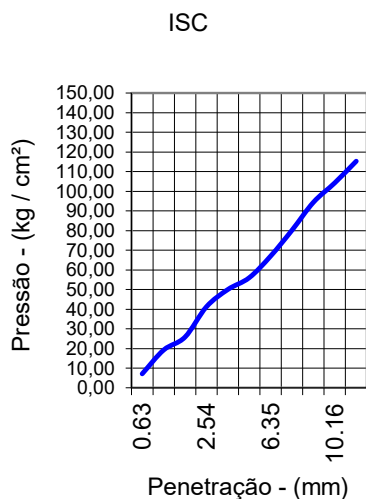

ISC = 58,90 %

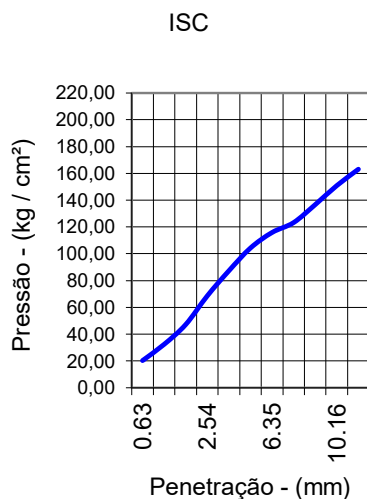

ISC = 99,30 %

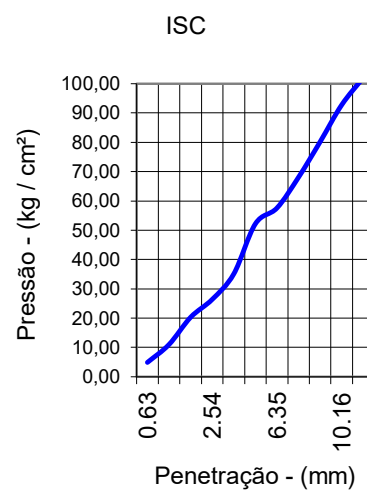

ISC = 49,70 %

RESUMO

DENSIDADE MÁXIMA: 2171 g / cm³	ISC : 97,35 %
ÚMIDADE ÓTIMA: 7,68 %	EXPANSÃO : 0,11 %



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda

**Análise Granulométrica NORMA DNER ME -080/94 (Simples)**


PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

Rodovia:	BR : 174	Profundidade:	0,15 1,10
Trecho:	VICINAL 8 MARTIHIS PEREIRA	Furo :	2
Procedência:	ESTUDO DE JAZIDA	Estaca:	0
Camada:	BASE 20% DE AREIA	OPERADO	Marjone
		Data:	16/07/25

UMIDADE HIDROSCÓPICA			DISCRIMINAÇÃO		AMOSTRA SECA	
					Total	Parcial
Cápsula (N°)	02	31	Cápsula (N°)		33	31
Peso Umido (g)	58,17	62,19	Peso Bruto Úmido (g)		2000,0	200,0
Peso Bruto Seco (g)	57,00	61,00	Peso Retido na # N° 10 (g)		1224,51	
Peso da Água (g)	1,17	1,19	Peso Úmido Pass. na # N° 10 (g)		775,49	
Peso da Cápsula (g)	19,11	20,59	Peso Seco Pass. na # N° 10 (g)		752,80	
Peso do Solo Seco (g)	37,89	40,41	Peso da água (g)		22,69	
Umidade (%)	3,09	2,94	Peso da amostra Seca (g)		2	3
Umidade Média (%)	3,0				1977,3	194,1


Peneiramento

Amostra Total	Peneiras		Peso Retido Parcial (g)	Peso que Passa Acumulado (g)	% que Passa Am.Total	FAIXA AASTHO		CONSTANTES
	Pol	mm				Mínimo	Máximo	
	2"	50,8	0,00	1977,3	100,0			K ₁ =100 = 0,051
	1 1/2"	38,1	0,00	1977,3	100,0			2
	1"	25,4	124,12	1853,2	95,0			K ₂ = 4 = 0,196
	3/8"	9,5	648,45	1204,8	61,0			3
	4	4,8	405,00	799,8	41,0			
	10	2,0	46,94	752,9	38,0			
Amostra Parcial	40	0,42	59,43	134,7	26,0			
	200	0,074	78,88	55,8	11,0			

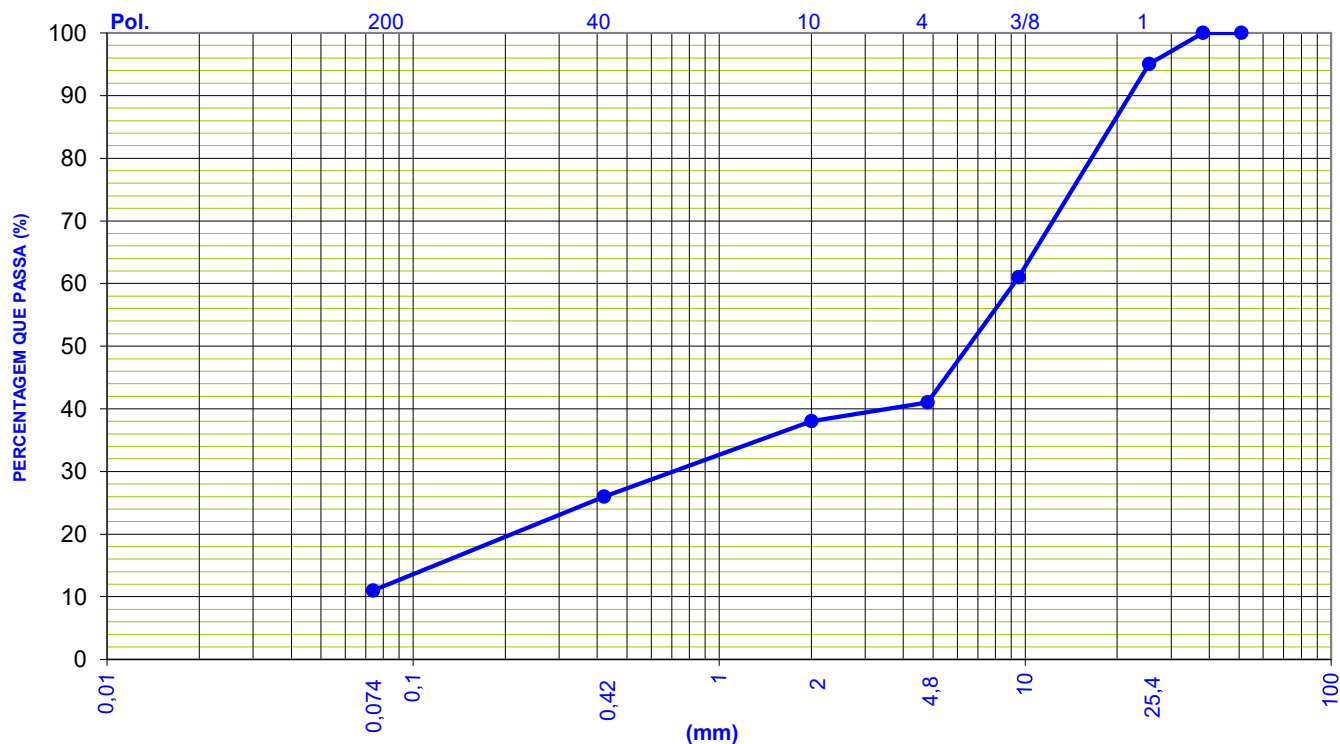**Resumo Granulometria (%)**

Pedregulho (> 4,8 mm)	59,0
Areia Grossa (4,8 - 2,0 mm)	3,0
Areia Média (2,0 - 0,42 mm)	12,0
Areia Fina (0,42 - 0,074 mm)	15,0
Passando (0,074 mm)	11,0
Total	100,0

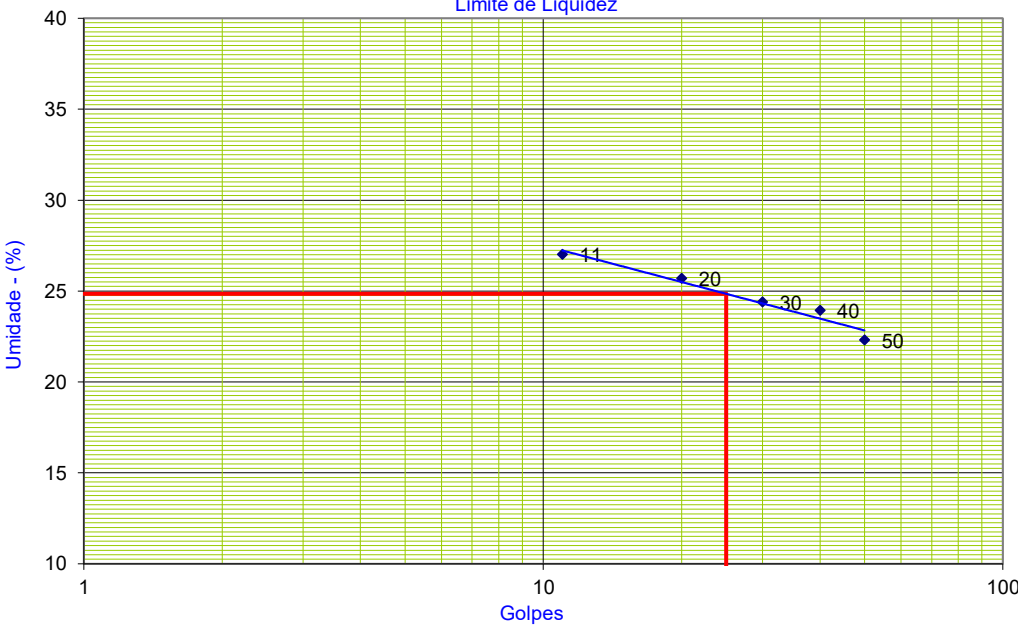

  MTEC CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda		LIMITES FÍSICOS  PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS					
Rodovia: RR 171		Profund.: 0,15 1,10		OPERADO Marjone			
Trecho: VICINAL 8 MARTIHIS PEREIRA		Furo : 8					
Procedência: ESTUDO DE JAZIDA		Estaca: 0					
Camada: BASE 20% DE AREIA		Data: 17/07/2025		LADO L / E			
LIMITE DE LIQUIDEZ NORMA DNER ME - 122/94							
Cápsula	N.º	10	65	23	40	74	
Golpes	g	11	20	30	40	50	
Peso Bruto Úmido	g	13,90	14,35	11,70	14,32	10,41	
Peso Bruto Seco	g	12,29	12,71	10,49	12,79	9,52	
Peso da Cápsula	g	6,33	6,33	5,53	6,40	5,53	
Peso da Água	g	1,61	1,64	1,21	1,53	0,89	
Peso do Solo Seco	g	5,96	6,38	4,96	6,39	3,99	
Umidade	%	27,01	25,71	24,40	23,94	22,31	
LIMITE DE PLASTICIDADE NORMA DNER ME - 082/94							
Cápsula	N.º	22	55	32	46	85	
Peso Bruto Úmido	g	8,64	8,08	7,98	7,91	6,49	
Peso Bruto Seco	g	8,27	7,67	7,56	7,56	6,30	
Peso da Cápsula	g	6,43	5,68	5,54	5,81	5,33	
Peso da Água	g	0,37	0,41	0,42	0,35	0,19	
Peso do Solo Seco	g	1,84	1,99	2,02	1,75	0,97	
Umidade	%	20,11	20,60	20,79	20,00	19,59	
Índice de Plasticidade LL= 24,8% LP = 20,2% IP= 4,6%		Límite de Liquidez 					



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DNIT- 141/2022 - ES

E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA



Folha:

Única


Data:

16/07/2025


Rodovia: BR : 174		Trecho: VICINAL 8 MARTIHIS PEREIRA			Sub-trecho: KM 20,900			Registro: ESTUDO DE JAZIDA			
Estaca:		Furo: 9		Profundidade: 0,15 1,10		Material: Solo Laterítico Argiloso 20 % de Areia			BASE 20% DE AREIA LAVADA RIO ANAÚA		
% Mat. Ret. # Nº 4: 53,00%		Próctor: MODIFICADO			Golpes: 55		Operador: GABRIEL		Lado L / E		
Item		Unid.	1	2	3	4	5	6	Umidade Higroscópica		
Cápsula Nº		-							25	97	
Peso Bruto Úmido		g							58,17	62,11	
Peso Bruto Seco		g							57,00	61,00	
Peso da Água		g							1,17	1,11	
Peso da Cápsula		g							19,11	20,59	
Peso do Solo Seco		g							37,89	40,41	
Umidade		%							3,09%	2,75%	
Umidade calculada		%	4,1%	5,6%	7,2%	8,7%	10,3%		2,9%		
Água Total		g	278	383	488	593	698		Peso do Material		
Água Adicionada		g	80	185	290	395	500		7.000,00		
% Água Adicionada		%	1,14%	2,64%	4,14%	5,64%	7,14%		P. Mat. Seco	Peso Água	
Peso Bruto Úmido		g	8.150	8.490	9.130	8.950	9.150		6.802	198	
Peos do Solo Úmido		g	4.025	4.405	4.886	4.618	4.436		Moldes		
Dens. Solo Úmido		g / m³	1.925	2.196	2.327	2.302	2.124		Nº	Peso	Volume
Dens. Solo Seco		g / m³	1.849	2.079	2.171	2.117	1.926		20	4.125	2.091
Resultados:				Observações:							
H. Ótima	Dens. Máx	ISC	Expansão	22	4.085	2.006					
7,4 %	2.172	93,2	0,12	35	4.244	2.100					
				27	4.332	2.006					
				42	4.714	2.089					




Análise Gráfica

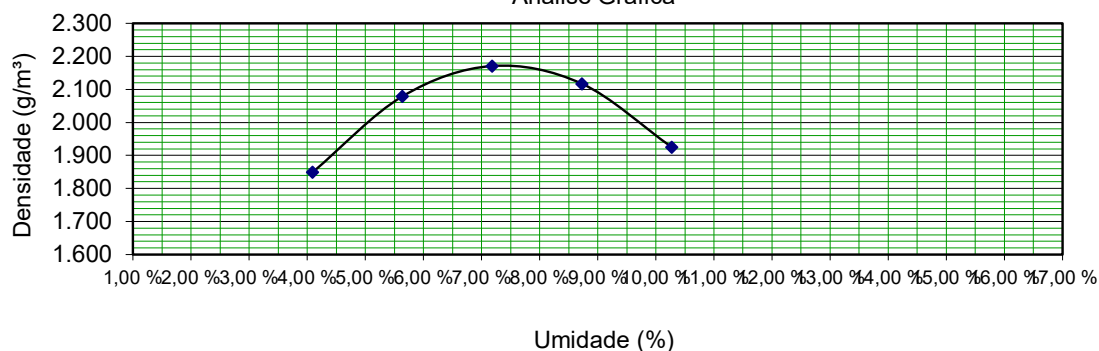

Índice de Suporte Califórnia

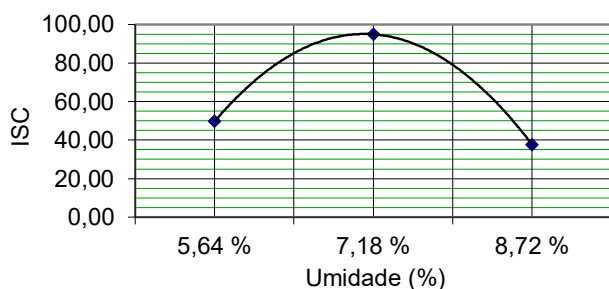

Expansão

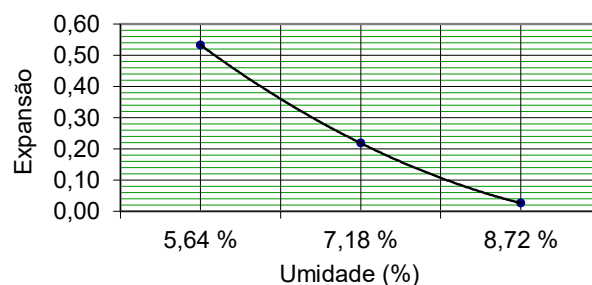



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE EXPANSÃO / I.S.C



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS




TRECHO: [REDACTED]					DATA:	
VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA					16/07/2025	
RODOVIA:		SUB-TRECHO:			OPERADO	
BR : 174		KM 20,900			GABRIEL	
ESTACA:	LADO:	FURO:	PROFUNDIDADE:	GOLPES:	ESTUDO:	
0	L / E	9	0,15 1,10	55	BASE 20% DE AREIA	
% MATERIAL RET. PEN. Nº 4		PROCTOR:		MATERIAL:		
53,00%		MODIFICADO		Solo Laterítico Argiloso 20 % de Areia		

ENSAIO DE EXPANSÃO NORMA DNER - ME 049/94

MOLDE Nº 22		ALTURA 114,5			MOLDE Nº 35		ALTURA 114,5			MOLDE Nº 27		ALTURA 114,5	
DATA	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	
16/07/25	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00	0,00	0,00	
20/07/25	09:00	1,61	0,61	0,53	09:00	1,25	0,25	0,22	09:00	1,03	0,03	0,03	

ENSAIO DE I.S.C NORMA DNIT 172/2016 - ME

MOLDE Nº 22			K-PRENSA = 0,110				MOLDE Nº 35				MOLDE Nº 27			
PENETR. mm	TEMPO min	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %		LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %
0.63	0.5	100	11,00				185	20,30			75	8,20		
1.27	1.0	158	17,30				275	30,20			115	12,60		
1.90	1.5	200	22,00				435	47,80			165	18,10		
2.54	2.0	260	28,50	70	40,70		605	66,40	70	94,90	240	26,40	70	37,70
3.81	3.0	345	37,90				780	85,60			295	32,40		
5.08	4.0	475	52,20	105	49,70		900	98,80	105	94,10	335	36,80	105	35,00
6.35	5.0	560	61,50				1050	115,30			400	43,90		
7.62	6.0	670	73,60				1123	123,30			485	53,30		
8.89	7.0	755	82,90				1245	136,70			555	60,90		
10.16	8.0	845	92,80				1358	149,10			645	70,80		
12.70	10.0	950	104,30				1430	157,00			730	80,20		

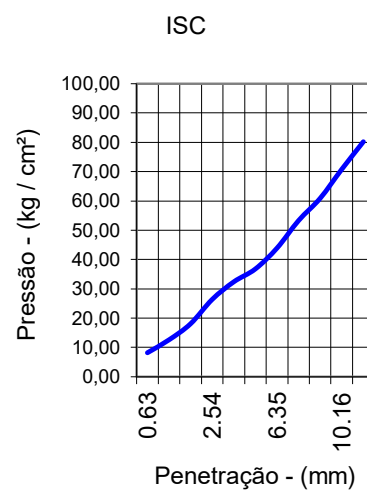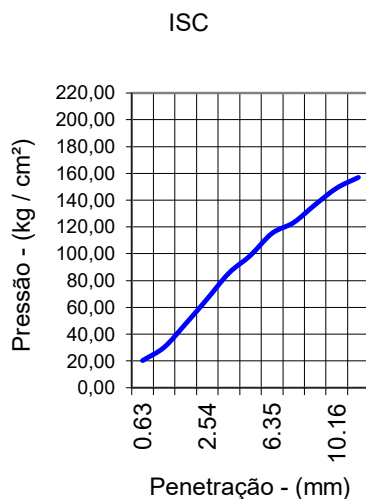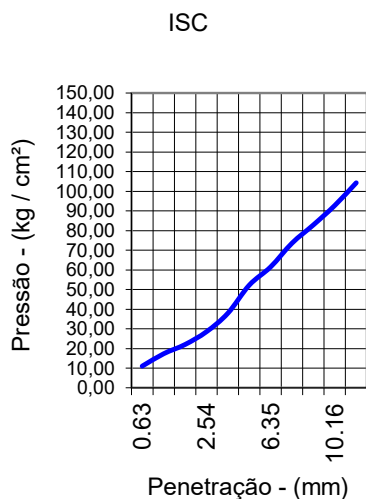

RESUMO

DENSIDADE MÁXIMA: 2172 g / cm³	ISC : 93,20 %
ÚMIDADE ÓTIMA: 7,39 %	EXPANSÃO : 0,12 %



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda


**Análise Granulométrica NORMA DNER ME -080/94 (Simples)**

Rodovia:	BR : 174	Profundidade:	0,15 1,10
Trecho:	VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA	Furo :	9
Procedência:	ESTUDO DE JAZIDA	Estaca:	0
Camada:	BASE 20% DE AREIA	OPERADO	GABRIEL
		Data:	16/07/25

UMIDADE HIDROSCÓPICA			DISCRIMINAÇÃO		AMOSTRA SECA	
					Total	Parcial
Cápsula (N°)	25	97	Cápsula (N°)		33	31
Peso Umido (g)	58,17	62,11	Peso Bruto Úmido (g)		2000,0	200,0
Peso Bruto Seco (g)	57,00	61,00	Peso Retido na # N° 10 (g)		1126,18	
Peso da Água (g)	1,17	1,11	Peso Úmido Pass. na # N° 10 (g)		873,82	
Peso da Cápsula (g)	19,11	20,59	Peso Seco Pass. na # N° 10 (g)		849,00	
Peso do Solo Seco (g)	37,89	40,41	Peso da água (g)		24,82	
Umidade (%)	3,09	2,75	Peso da amostra Seca (g)		2	3
Umidade Média (%)	2,9				1975,2	194,3

Peneiramento

Amostra Total	Peneiras		Peso Retido Parcial (g)	Peso que Passa Acumulado (g)	% que Passa Am.Total	FAIXA AASTHO		CONSTANTES
	Pol	mm				Mínimo	Máximo	
	2"	50,8	0,00	1975,2	100,0			K ₁ =100 = 0,051
	1 1/2"	38,1	0,00	1975,2	100,0			
	1"	25,4	95,11	1880,1	96,0			K ₂ = 4 = 0,221
	3/8"	9,5	558,45	1321,7	67,0			
	4	4,8	405,68	916,0	47,0			
	10	2,0	66,94	849,1	43,0			
Amostra Parcial	40	0,42	81,43	112,9	25,0			
	200	0,074	78,88	34,0	8,0			

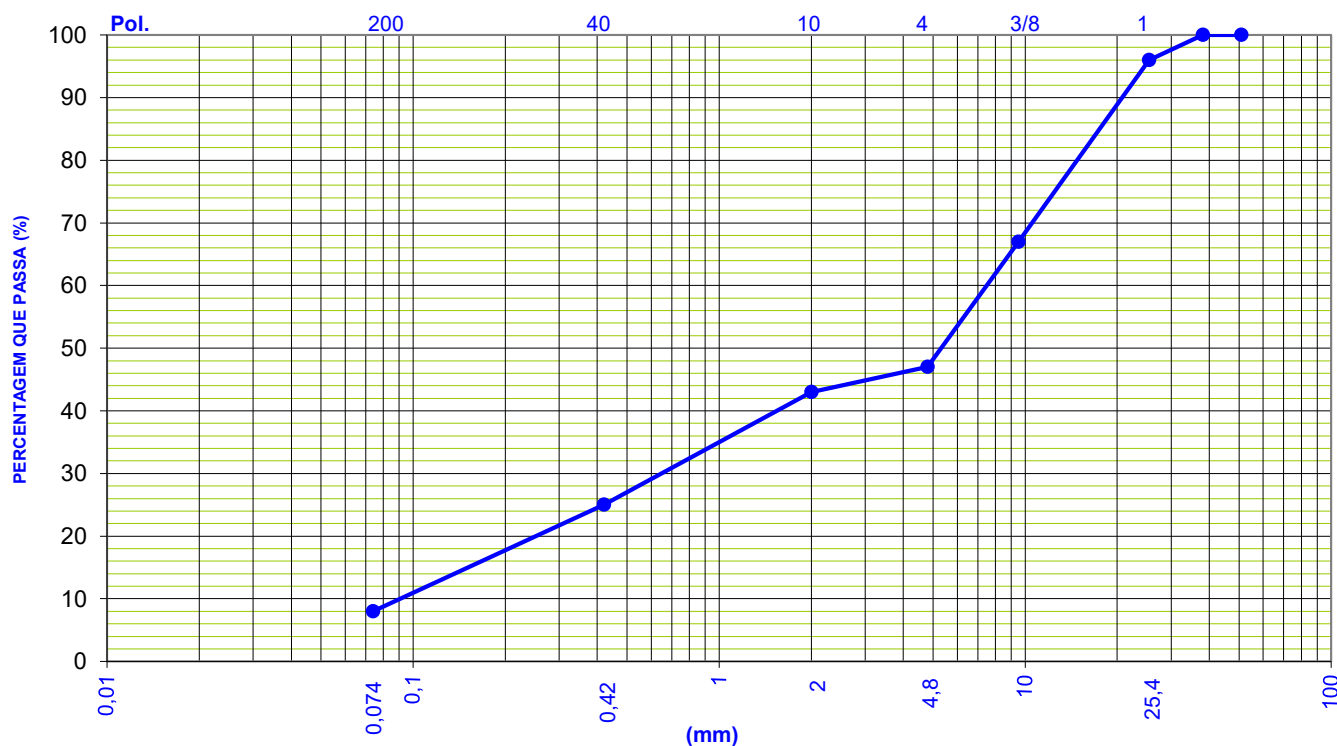**Resumo Granulometria (%)**


Pedregulho (> 4,8 mm)	53,0
Areia Grossa (4,8 - 2,0 mm)	4,0
Areia Média (2,0 - 0,42 mm)	18,0
Areia Fina (0,42 - 0,074 mm)	17,0
Passando (0,074 mm)	8,0
Total	100,0



  MTEC CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda		LIMITES FÍSICOS  PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	
Rodovia: BR : 174		Profund.: 0,15 1,10	OPERADO GABRIEL
Trecho: VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA		Furo : 9	
Procedência: ESTUDO DE JAZIDA		Estaca: 0	
Camada: BASE 20% DE AREIA		Data: 17/07/2025	LADO L / E

LIMITE DE LIQUIDEZ NORMA DNER ME - 122/94						
Cápsula	N.º	10	71	91	86	82
Golpes	g	11	20	30	40	50
Peso Bruto Úmido	g	13,95	14,42	11,70	14,30	10,42
Peso Bruto Seco	g	12,29	12,71	10,49	12,79	9,52
Peso da Cápsula	g	6,33	6,33	5,53	6,40	5,53
Peso da Água	g	1,66	1,71	1,21	1,51	0,90
Peso do Solo Seco	g	5,96	6,38	4,96	6,39	3,99
Umidade	%	27,85	26,80	24,40	23,63	22,56

LIMITE DE PLASTICIDADE NORMA DNER ME - 082/94						
Cápsula	N.º	04	15	07	18	21
Peso Bruto Úmido	g	8,65	8,08	7,99	7,91	6,50
Peso Bruto Seco	g	8,27	7,67	7,56	7,56	6,30
Peso da Cápsula	g	6,43	5,68	5,54	5,81	5,33
Peso da Água	g	0,38	0,41	0,43	0,35	0,20
Peso do Solo Seco	g	1,84	1,99	2,02	1,75	0,97
Umidade	%	20,65	20,60	21,29	20,00	20,62

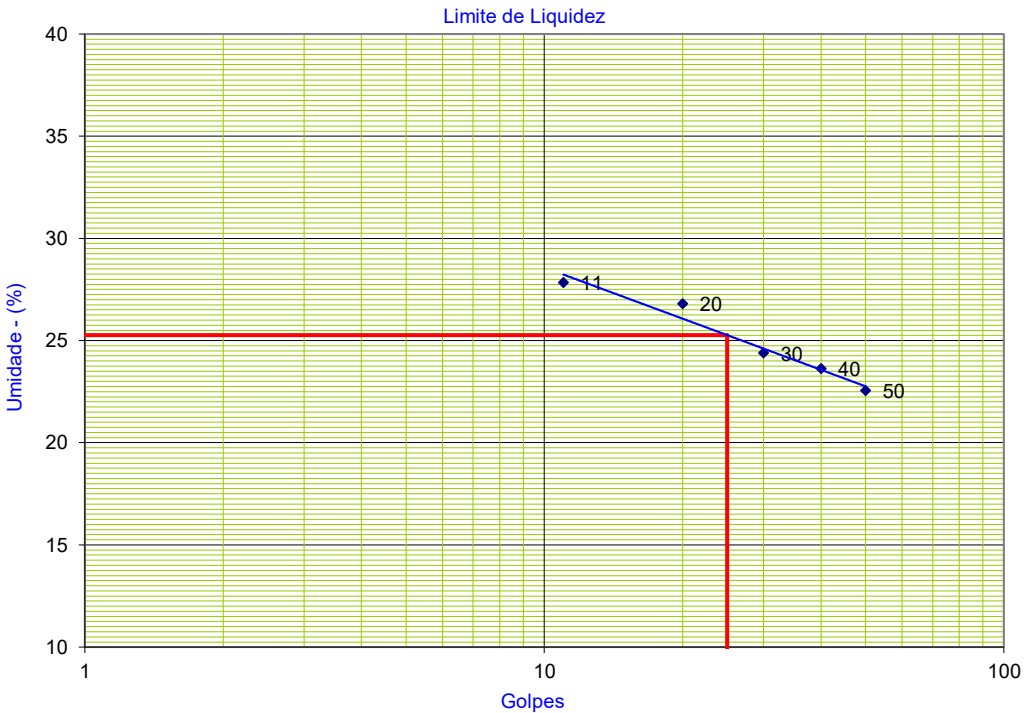Índice de Plasticidade LL= 25,3% LP = 20,6% IP= 4,7%		
---	--	--



MTEC
CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DNIT- 141/2022 - ES

E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS

Folha:


Única

Data:


16/07/2025

Rodovia: BR : 174		Trecho: VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA		Sub-trecho: KM 20,900			Registro: ESTUDO DE JAZIDA		
Estaca:	Furo: 10	Profundidade: 0,15 1,10		Material: Solo Laterítico Argiloso 20 % de Areia			BASE 20% DE AREIA LAVADA RIO ANAÚA		
% Mat. Ret. # N° 4: 54,00%	Próctor: MODIFICADO		Golpes: 55		Operador: ADRIANO		Lado L / E		
Item	Unid.	1	2	3	4	5	6	Umidade Higroscópica	
Cápsula N°	-							31	45
Peso Bruto Úmido	g							58,07	62,00
Peso Bruto Seco	g							57,00	61,00
Peso da Água	g							1,07	1,00
Peso da Cápsula	g							19,11	20,59
Peso do Solo Seco	g							37,89	40,41
Umidade	%							2,82%	2,47%
Umidade calculada	%	4,0%	5,5%	7,0%	8,6%	10,1%		2,6%	
Água Total	g	271	376	481	586	691		Peso do Material	
Água Adicionada	g	90	195	300	405	510		7.000,00	
% Água Adicionada	%	1,29%	2,79%	4,29%	5,79%	7,29%		P. Mat. Seco	Peso Água
Peso Bruto Úmido	g	7.980	8.380	8.856	8.880	9.150		6.819	181
Peos do Solo Úmido	g	3.855	4.295	4.781	4.548	4.436		Moldes	
Dens. Solo Úmido	g / m³	1.844	2.141	2.309	2.267	2.124		N°	Peso
Dens. Solo Seco	g / m³	1.773	2.029	2.157	2.088	1.928		20	4.125
Resultados:		Observações:						2.091	
								66	4.085
								2	4.075
								27	4.332
H. Ótima 7,3 %	Dens. Máx 2.159	ISC 92,0	Expansão 0,13					42	4.714
									2.089


Análise Gráfica

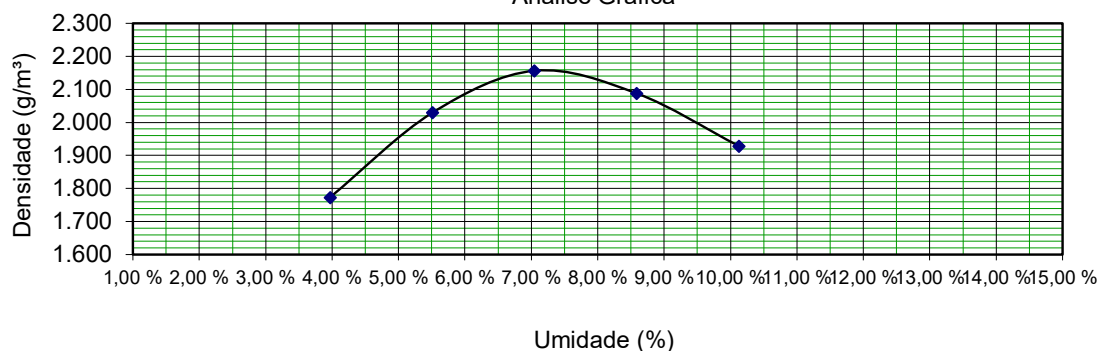

Índice de Suporte Califórnia

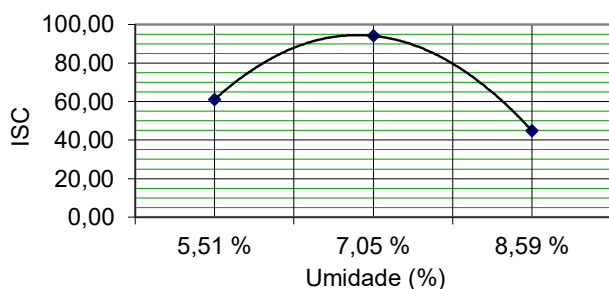

Expansão

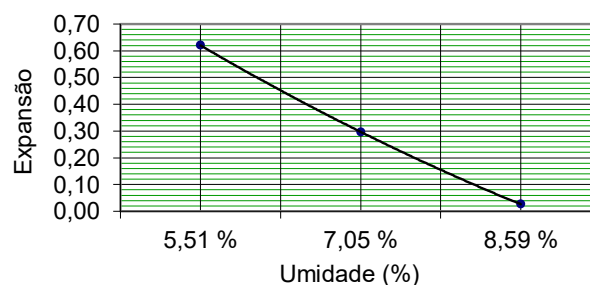



CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda



ENSAIO DE EXPANSÃO / I.S.C



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS

TRECHO:					DATA:	
VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA					16/07/2025	
RODOVIA:		SUB-TRECHO:			OPERADO	
BR : 174		KM 20,900			ADRIANO	
ESTACA:	LADO:	FURO:	PROFUNDIDADE:	GOLPES:	ESTUDO:	
0	L / E	10	0,15 1,10	55	BASE 20% DE AREIA	
% MATERIAL RET. PEN. Nº 4		PROCTOR:		MATERIAL:		
54,00%		MODIFICADO		Solo Laterítico Argiloso 20 % de Areia		




ENSAIO DE EXPANSÃO NORMA DNER - ME 049/94

MOLDE Nº 66		ALTURA 114,5			MOLDE Nº 2		ALTURA 114,5		MOLDE Nº 27		ALTURA 114,5	
DATA	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%	HORA	LEITURA	DIFERENÇA	%
16/07/25	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00		0,00	10:00	1,00	0,00	0,00
												
20/07/25	09:00	1,71	0,71	0,62	09:00	1,34	0,34	0,30	09:00	1,03	0,03	0,03



ENSAIO DE I.S.C NORMA DNIT 172/2016 - ME

MOLDE Nº 66			K-PRENSA = 0,110				MOLDE Nº 2				MOLDE Nº 27			
PENETR. mm	TEMPO min	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %		LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %	LEITURA EXTENSOM.	PRESSÃO kg/Cm²	PRES. Padr kg/Cm²	ISC %
0.63	0.5	100	11,00				175	19,20			75	8,20		
1.27	1.0	190	20,90				300	32,90			135	14,80		
1.90	1.5	275	30,20				450	49,40			210	23,10		
2.54	2.0	385	42,30	70	60,40		600	65,90	70	94,10	285	31,30	70	44,70
3.81	3.0	495	54,40				720	79,10			340	37,30		
5.08	4.0	585	64,20	105	61,10		865	95,00	105	90,50	410	45,00	105	42,90
6.35	5.0	685	75,20				985	108,20			498	54,70		
7.62	6.0	790	86,70				1065	116,90			560	61,50		
8.89	7.0	890	97,70				1145	125,70			670	73,60		
10.16	8.0	950	104,30				1235	135,60			765	84,00		
12.70	10.0	1040	114,20				1348	148,00			855	93,90		

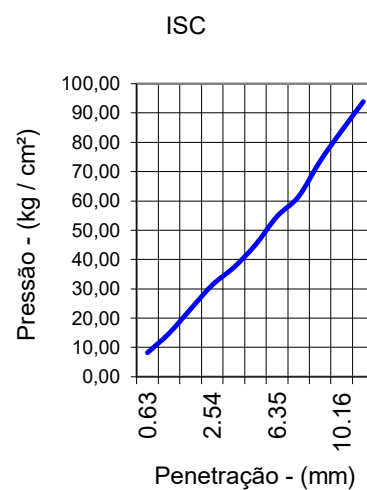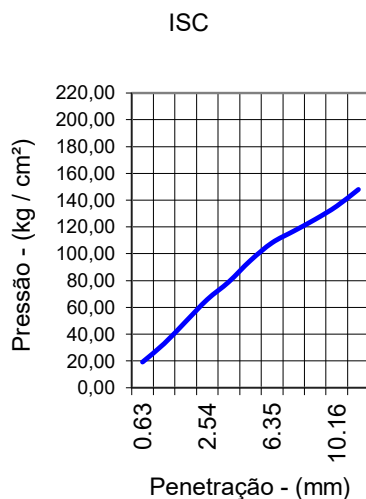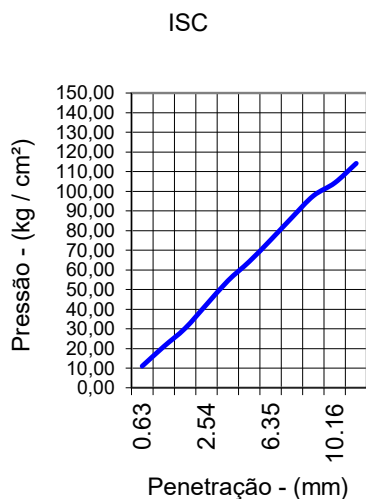

RESUMO


DENSIDADE MÁXIMA: 2159 g / cm³	ISC : 91,95 %
ÚMIDADE ÓTIMA: 7,28 %	EXPANSÃO : 0,13 %

Rodovia:	BR : 174	Profundidade:	0,15 1,10
Trecho:	VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA	Furo :	10
Procedência:	ESTUDO DE JAZIDA	Estaca:	0
Camada:	BASE 20% DE AREIA	Operado	ADRIANO
		Data:	16/07/25

UMIDADE HIDROSCÓPICA		DISCRIMINAÇÃO		AMOSTRA SECA	
				Total	Parcial
Cápsula (N°)	31	45	Cápsula (N°)	33	31
Peso Umido (g)	58,07	62,00	Peso Bruto Úmido (g)	2000,0	200,0
Peso Bruto Seco (g)	57,00	61,00	Peso Retido na # N° 10 (g)	1251,18	
Peso da Água (g)	1,07	1,00	Peso Úmido Pass. na # N° 10 (g)	748,82	
Peso da Cápsula (g)	19,11	20,59	Peso Seco Pass. na # N° 10 (g)	729,50	
Peso do Solo Seco (g)	37,89	40,41	Peso da água (g)	19,32	
Umidade (%)	2,82	2,47	Peso da amostra Seca (g)	2	3
Umidade Média (%)	2,6			1980,7	194,8

Peneiramento



Amostra Total	Peneiras		Peso Retido Parcial (g)	Peso que Passa Acumulado (g)	% que Passa Am.Total	FAIXA AASTHO		CONSTANTES
	Pol	mm				Mínimo	Máximo	
	2"	50,8	0,00	1980,7	100,0			K ₁ =100 = 0,050
	1 1/2"	38,1	0,00	1980,7	100,0			
	1"	25,4	105,11	1875,6	94,0			K ₂ = 4 = 0,185
	3/8"	9,5	538,45	1337,2	67,0			
	4	4,8	420,68	916,5	46,0			
	10	2,0	186,94	729,6	36,0			
Amostra Parcial	40	0,42	58,43	136,4	25,0			
	200	0,074	84,88	51,5	10,0			

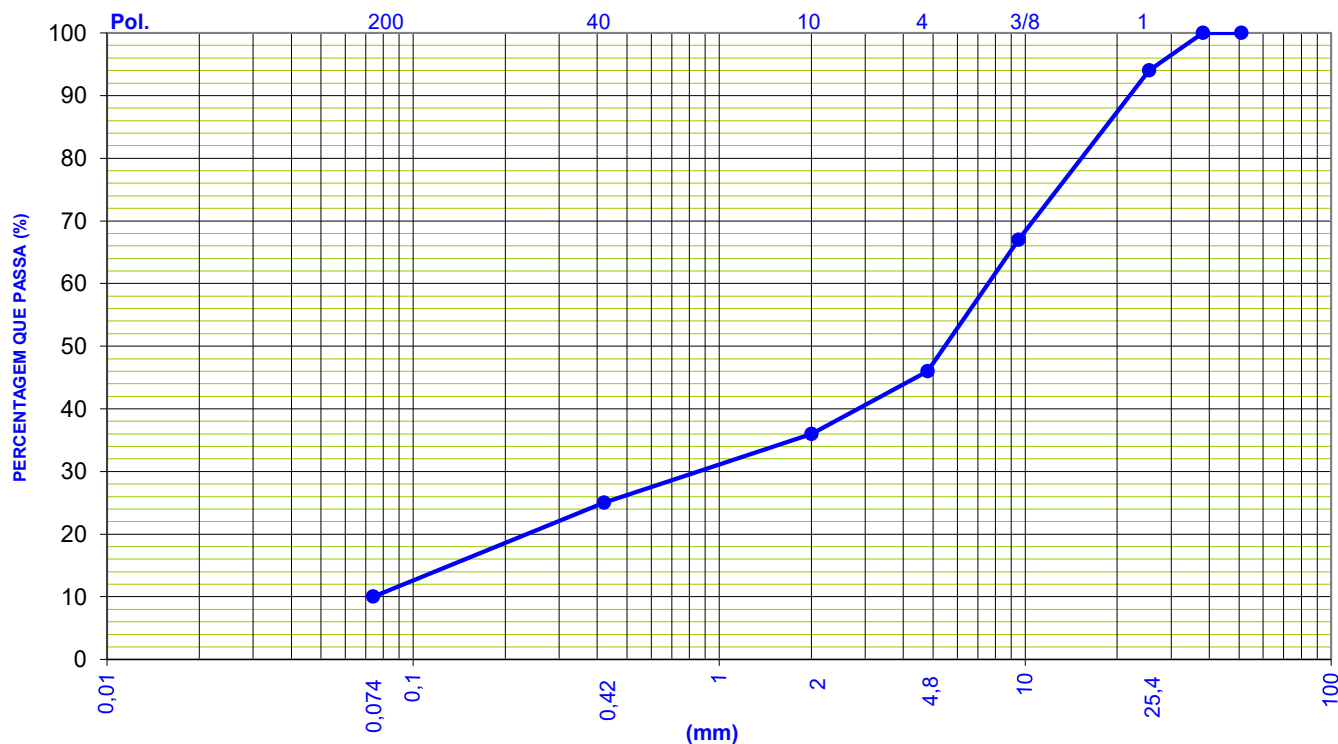

Resumo Granulometria (%)

Pedregulho (> 4,8 mm)	54,0
Areia Grossa (4,8 - 2,0 mm)	10,0
Areia Média (2,0 - 0,42 mm)	11,0
Areia Fina (0,42 - 0,074 mm)	15,0
Passando (0,074 mm)	10,0
Total	100,0

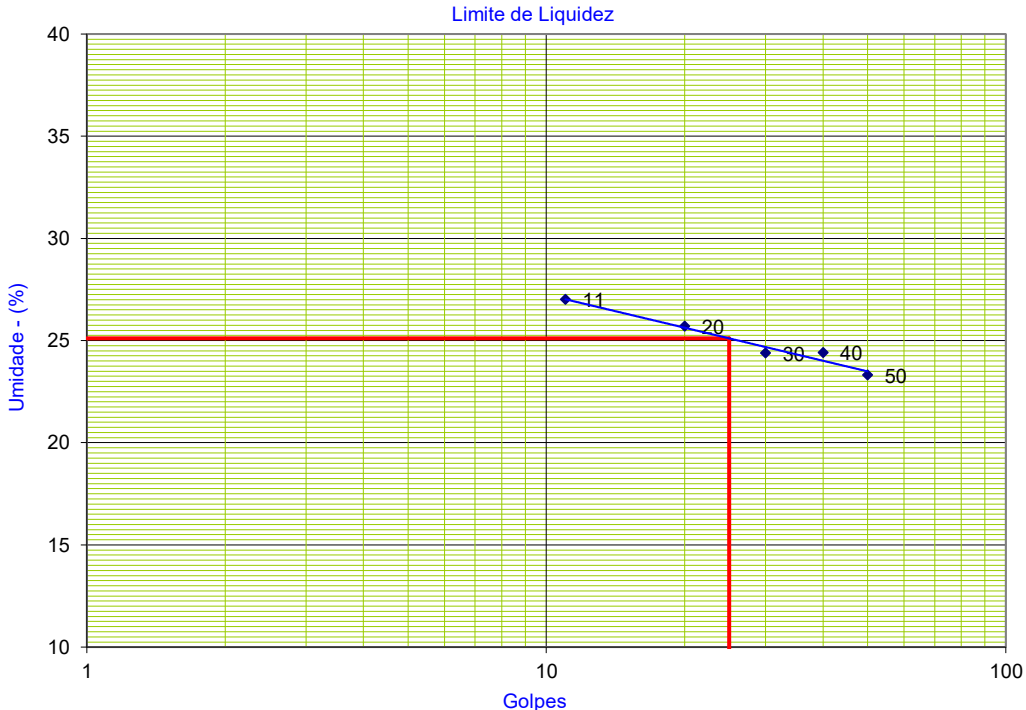

  MTEC CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA Via Norte Construtora Ltda		LIMITES FÍSICOS  PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS					
Rodovia: RR 171		Profund.: 0,15 1,10		OPERADO ADRIANO			
Trecho: VICINAL 8 MARTIHS PEREIRA		Furo : 10					
Procedência: ESTUDO DE JAZIDA		Estaca: 0					
Camada: BASE 20% DE AREIA		Data: 17/07/2025		LADO L / E			
LIMITE DE LIQUEDEZ NORMA DNER ME - 122/94							
Cápsula	N.º	20	45	25	32	71	
Golpes	g	11	20	30	40	50	
Peso Bruto Úmido	g	13,90	14,35	11,70	14,35	10,45	
Peso Bruto Seco	g	12,29	12,71	10,49	12,79	9,52	
Peso da Cápsula	g	6,33	6,33	5,53	6,40	5,53	
Peso da Água	g	1,61	1,64	1,21	1,56	0,93	
Peso do Solo Seco	g	5,96	6,38	4,96	6,39	3,99	
Umidade	%	27,01	25,71	24,40	24,41	23,31	
LIMITE DE PLASTICIDADE NORMA DNER ME - 082/94							
Cápsula	N.º	23	61	60	55	08	
Peso Bruto Úmido	g	8,63	8,06	7,96	7,91	6,51	
Peso Bruto Seco	g	8,27	7,67	7,56	7,56	6,30	
Peso da Cápsula	g	6,43	5,68	5,54	5,81	5,33	
Peso da Água	g	0,36	0,39	0,40	0,35	0,21	
Peso do Solo Seco	g	1,84	1,99	2,02	1,75	0,97	
Umidade	%	19,57	19,60	19,80	20,00	21,65	
Índice de Plasticidade LL= 25,1% LP = 19,7% IP= 5,4%		 Limite de Liqueidez					

CROQUIS DE ESTUDO E LOCALIZAÇÃO DE JAZIA

PERIODO

JULHO 2025

**ALEX FABIAN
FERREIRA DA
SILVA**

Assinado de forma
digital por ALEX
FABIAN FERREIRA DA
SILVA
Dados: 2025.09.22
11:12:20 -04'00'

RODOVIA: BR - 174 / RR

TRECHO: SEDE DE RORAINÓPOLIS / RR

SUB TRECHO BAIRRO VITÓRIA

DMT: 20,900

INDICAÇÕES GERAIS

PROPRIETARIO: **D . JESUS**

MATERIAL: **SOLO LATERITICO ARGILOSO VERMELHA** LOCALIZAÇÃO: **L / E**

BENFEITORIAS: CAPIM NATURAL ÁREA (M²): **44,100**


VOLUME UTILIZÁVEL(M²): **52,920**

UTILIZAÇÃO: **SUB-BASE E BASE**

MALHAS: **30 X 30**

ESPESURA MÈDIA (M²) **1,20 mc**

ESPESURA DO ESPURGO **0,20 cm**

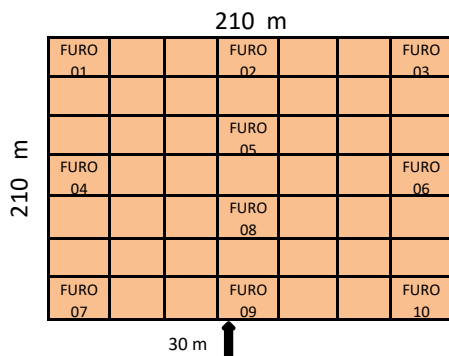


CORDENADAS DA JAZIDA

1º03'08"N 60º25'11"W

VICINA 8

MARTIHS PEREIRA

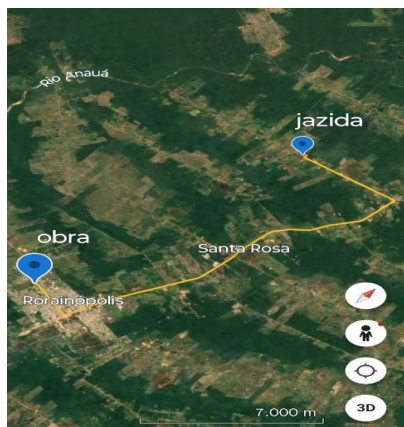

CORDENADAS DA OBRA

0º56'33"N 60º26'40"W

NOVO PARAISO

BR-174

SEDE RORAINÓPOLIS

MANAUS



CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA



Via Norte Construtora Ltda

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA

Cliente: PREFEITURA DE RORAINÓPOLIS

ANO : 2025

Obra: PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA CIDADE DE RORAINÓPOLIS

Data: JULHO

Local: MUNICIPIO DE RORAINÓPOLIS



FOTO 1:



FOTO 2:



FOTO 3:

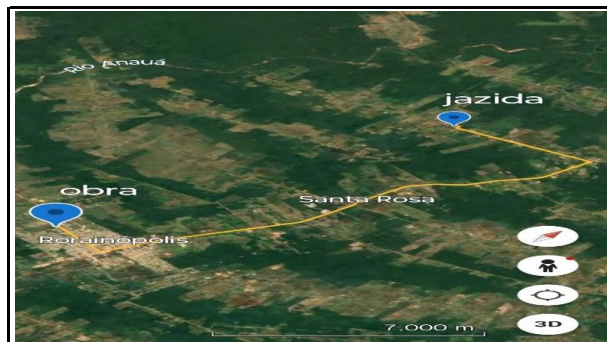


FOTO 4:

MAURO.D.E.S.R
RG DE LABORATORISTA
Nº 3011-10.T.A.F.Q.M
EMPRESA.MTEC CONSULTORIA & SERVIÇOS

TÉCNICO DA MTEC

ALEX FABIAN
FERREIRA DA SILVA

ENGº RESPONSÁVEL PELO PROJETO

Assinado de forma digital por
ALEX FABIAN FERREIRA DA
SILVA
Dados: 2025.09.22 11:11:17
-04'00'
